СТО МИ пользователя «Управление инвестиционными проектами в строительстве. Работа с сайтами проектов MS Project»

Описание

Инструкция содержит описание регламента работы с сайтами проектов MS Project.

Глоссарий

MS Project – Microsoft Project,

ПУД – первичный учетный документ.

Главная страница сайта investproj.com

После ввода в адресной строке браузера адреса сайта http://investproj.com пользователю отображается главная страница (рисунок 1).

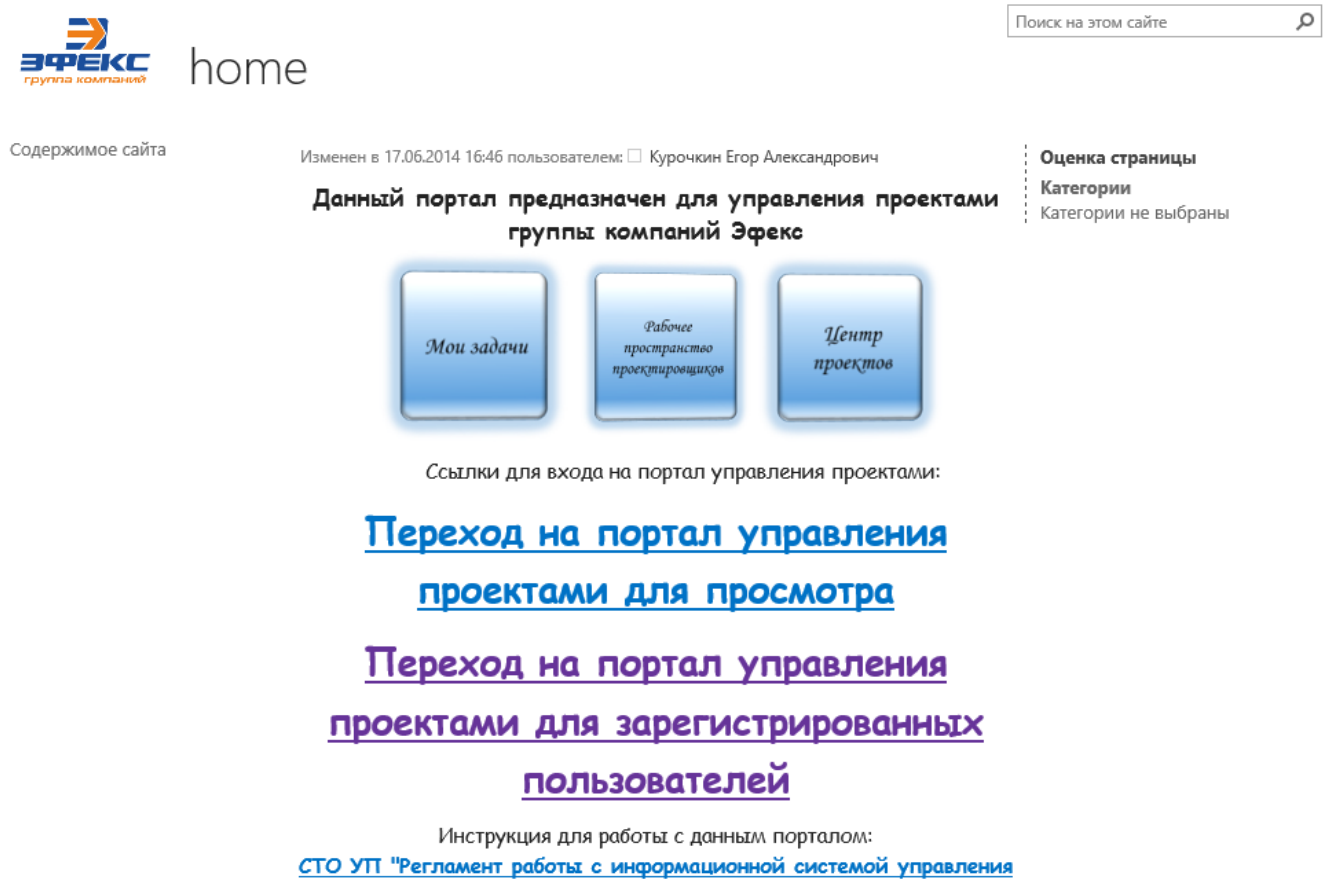

Для просмотра данных достаточно пройти по ссылке «Переход на портал управления проектами для просмотра», а зарегистрированные пользователи могут зайти только после авторизации (рисунок 2).

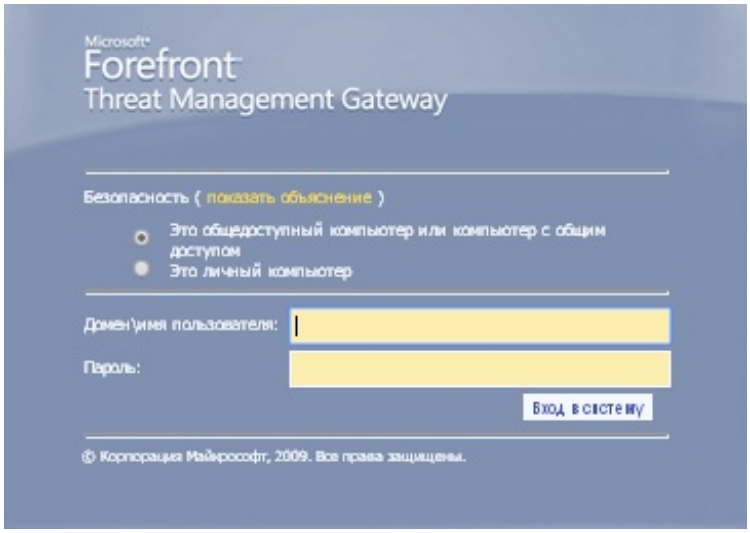

Навигация по сайту осуществляется при помощи вертикального меню, расположенного в левой части сайта (рисунок 3).



Проекты

Раздел «Проекты» содержит список инвестиционных проектов с подробной информацией по каждому (рисунок 4).

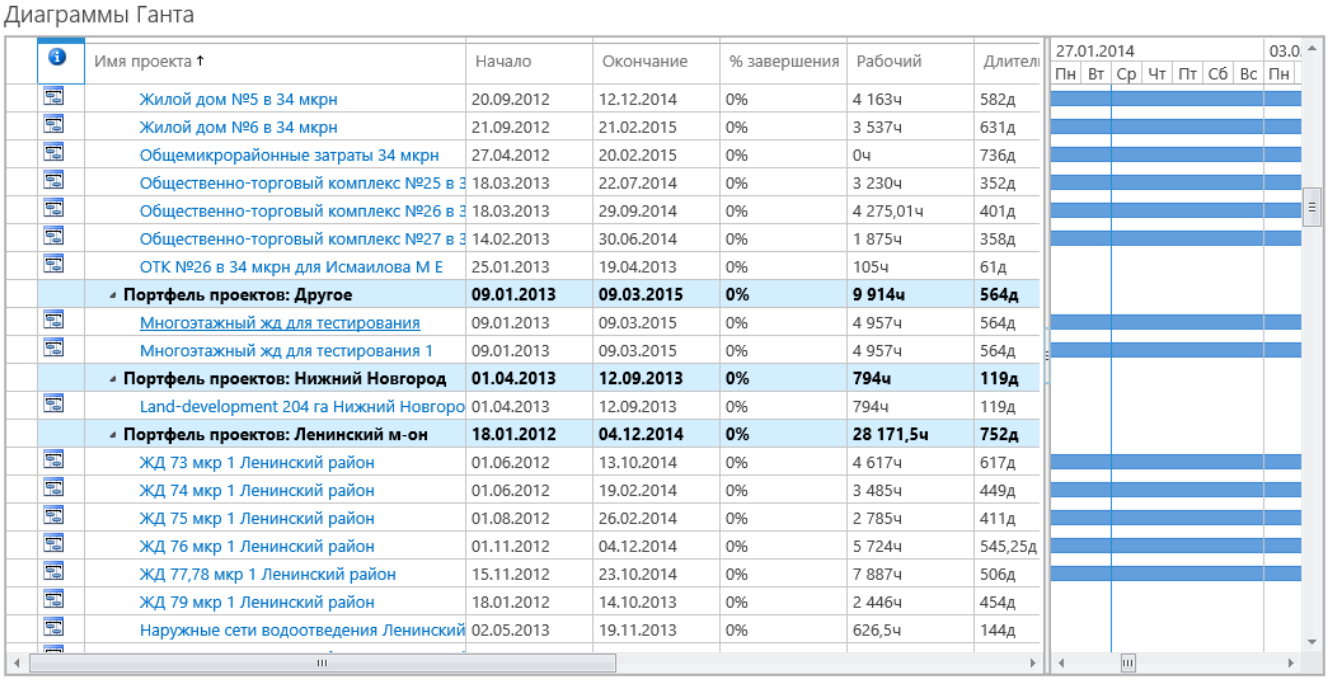

Имя проекта	Начало	Окончание	% завершения	Рабочий	Длитель
Жилой дом №5 в 34 мкрн	20.09.2012	12.12.2014	0%	4 163ч	582д
Жилой дом №6 в 34 мкрн	21.09.2012	21.02.2015	0%	3 537ч	631д
Общемикрорайонные затраты 34 мкрн	27.04.2012	20.02.2015	0%	0ч	736д
Общественно-торговый комплекс №25 в 3	18.03.2013	22.07.2014	0%	3 230ч	352д
Общественно-торговый комплекс №26 в 3	18.03.2013	29.09.2014	0%	4 275,01ч	401д
Общественно-торговый комплекс №27 в 3	14.02.2013	30.06.2014	0%	1 875ч	358д
ОТК №26 в 34 мкрн для Исмаилова М Е	25.01.2013	19.04.2013	0%	105ч	61д
Портфель проектов: Другое	**09.01.2013**	**09.03.2015**	**0%**	**9 914ч**	**564д**
Многоэтажный жд для тестирования	09.01.2013	09.03.2015	0%	4 957ч	564д
Многоэтажный жд для тестирования 1	09.01.2013	09.03.2015	0%	4 957ч	564д
Портфель проектов: Нижний Новгород	**01.04.2013**	**12.09.2013**	**0%**	**794ч**	**119д**
Land-development 204 га Нижний Новгоро	01.04.2013	12.09.2013	0%	794ч	119д
Портфель проектов: Ленинский м-он	**18.01.2012**	**04.12.2014**	**0%**	**28 171,5ч**	**752д**
ЖД 73 мкр 1 Ленинский район	01.06.2012	13.10.2014	0%	4 617ч	617д
ЖД 74 мкр 1 Ленинский район	01.06.2012	19.02.2014	0%	3 485ч	449д
ЖД 75 мкр 1 Ленинский район	01.08.2012	26.02.2014	0%	2 785ч	411д
ЖД 76 мкр 1 Ленинский район	01.11.2012	04.12.2014	0%	5 724ч	545,25д
ЖД 77,78 мкр 1 Ленинский район	15.11.2012	23.10.2014	0%	7 887ч	506д
ЖД 79 мкр 1 Ленинский район	18.01.2012	14.10.2013	0%	2 446ч	454д
Наружные сети водоотведения Ленинский	02.05.2013	19.11.2013	0%	626,5ч	144д

По щелчку по проекту осуществляется переход на страницу «Основные сведения» (рисунок 5).

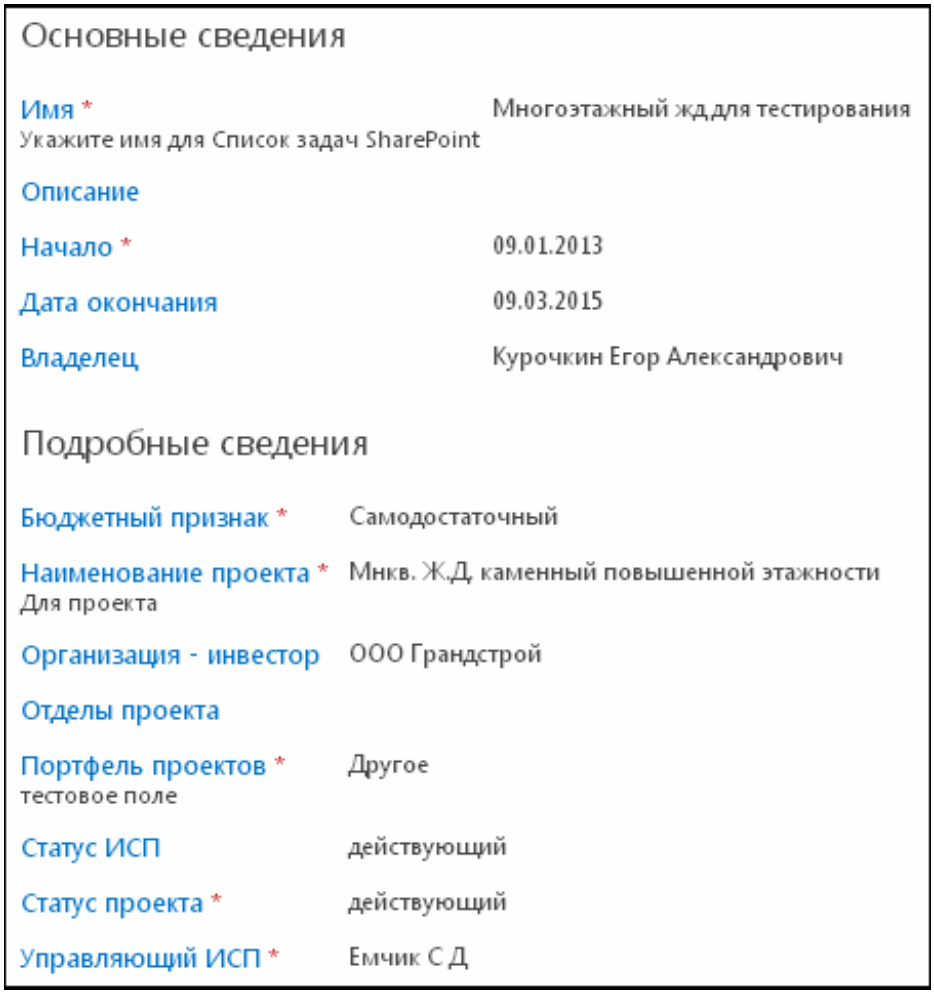

Основные сведения

Имя * Укажите имя для Список задач SharePoint	Многоэтажный жд для тестирования
Описание	
Начало *	09.01.2013
Дата окончания	09.03.2015
Владелец	Курочкин Егор Александрович

Подробные сведения

Бюджетный признак *	Самодостаточный
Наименование проекта * Для проекта	Мнкв. Ж.Д. каменный повышенной этажности
Организация - инвестор	ООО Грандстрой
Отделы проекта	
Портфель проектов * тестовое поле	Другое
Статус ИСП	действующий
Статус проекта *	действующий
Управляющий ИСП *	Емчик С Д

Данная информация формируется из списка ресурсов по пакетам работ верхнего уровня в Microsoft Project.

При обновлении старого сайта http://investproj.ru данные, заведенные на сайте проекта и данные по связанным с новым сайтом спецификациям, не затираются. Данные по старым спецификациям, ПУД передаются на старый сайт и через синхронизацию на новый, по новым спецификациям (связанным с МР) на новый сайт добавляются без затирания старых данных. Обновление происходит каждые 6 часа.

Данные со старого сайта передаются по гиперссылкам на новые пакеты работ в следующем формате: http://investproj.ru/ProjectManagment/GroupsItemInd.aspx?ID_Budget=DDEF965A-2619-46F6-A4EF-C7688E55386C&ID_BudgetGroup=/71245/1/&ID_BudgetGroupU=A00CB9E1-12CC-45C6-924A-536F45BC0BFD.

Поиск организации-инвестора и управляющего ИСП осуществляется в 1С «Каталог лиц» с учетом отсутствия точек. В вышеуказанном примере: «Емчик С Д».

Если на данном сайте нет информации по управляющему проектом, то информация берется со старого сайта.

Для просмотра более подробной информации необходимо перейти на сайт проекта (рисунок 6).

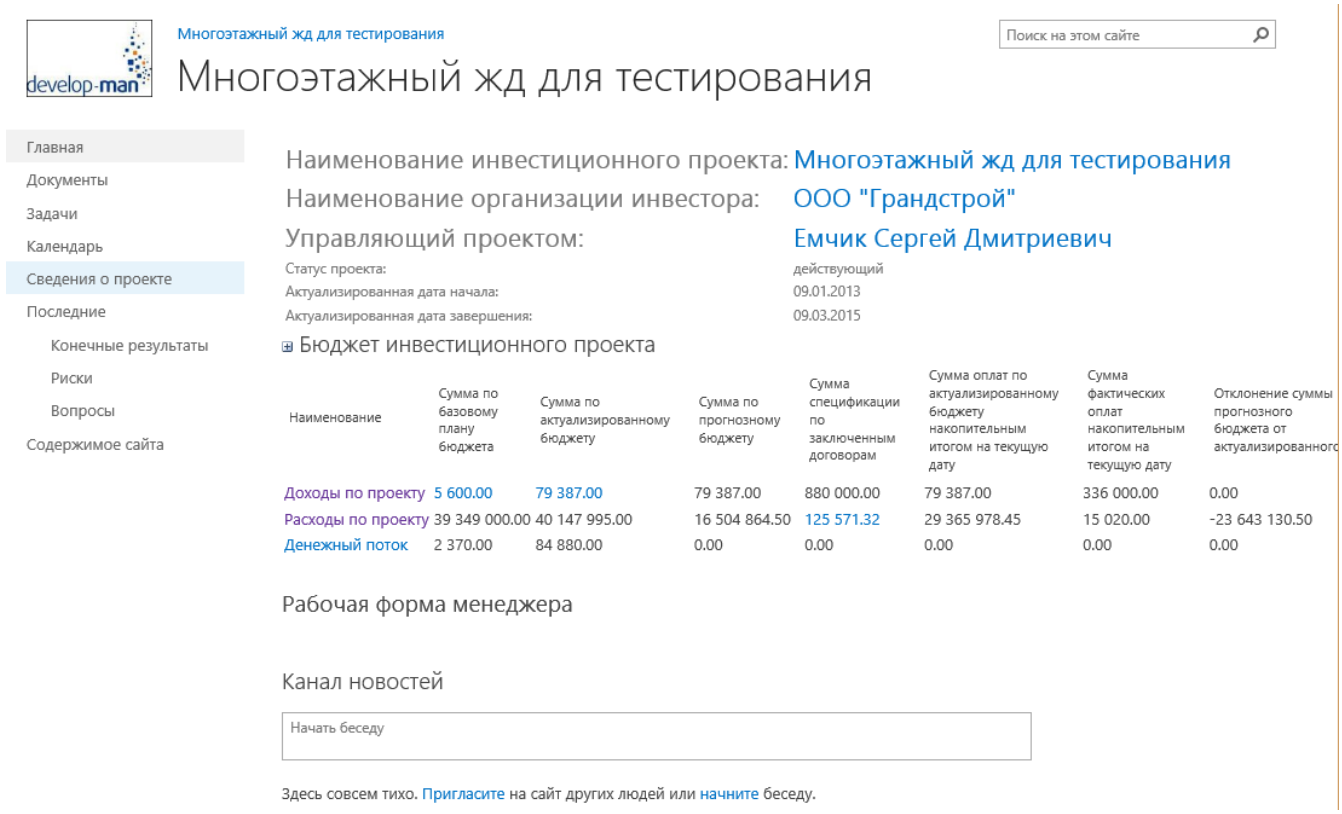

Раздел «Бюджет инвестиционного проекта» содержит следующие данные:

- Название единицы измерения проекта;
- Количество единиц измерения инвестиционного проекта;
- Ссылка на типовой инвестиционный проект;
- Ссылка на договор управления инвестиционным проектом и актуализированный бюджет;
- Дата актуализации бюджета;
- Чистая прибыль по базовому плану бюджета инвестиционного проекта;
- Чистая прибыль по актуализированному бюджету;
- Отклонение прогноза по прибыли от актуализированного бюджета;
- Себестоимость единицы измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету;
- Себестоимость единицы измерения инвестиционного проекта по прогнозу;
- Средневзвешенная цена реализации единицы измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету;
- Средневзвешенная цена реализации единицы измерения инвестиционного проекта по прогнозному бюджету;
- Средневзвешенная текущая цена реализации единицы измерения инвестиционного проекта;
- Прогноз чистой прибыли;
- Сумма доходов по базовому плану бюджета инвестиционного проекта;
- Сумма доходов по актуализированному бюджету;
- Сумма доходов по договорам долевого участия и договорам купли-продажи;
- Сумма расходов по базовому плану бюджета инвестиционного проекта;
- Сумма расходов по актуализированному бюджету;
- Сумма расходов по бюджету типового инвестиционного проекта;
- Сумма расходов по отчетам и первичным учетным документам;
- Единица измерения сумм, цен, активов и пассивов (руб., тыс. руб., ...);
- Активы на начало проекта;

- Пассивы на начало проекта;
- Базовый план по росту стоимости чистых активов;
- Прогноз роста стоимости чистых активов.

Ниже расположена таблица, которая формируется по следующим столбцам:

- Доходы по проекту,
- Расходы по проекту,
- Денежный поток.

Навигация по разделам осуществляется с помощью горизонтального меню, размещенного в верхней части страницы (рисунок 7).

Проекты / Жилой дом №2 в 34 мкрн / Расходы по проекту / Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения /

Доходы по проекту

Интерфейс страницы «Доходы по проекту» представлен на рисунке 8.

Рабочее пространство проектировщиков

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Доходы по проекту /

Наименование инвестиционного проекта: Многоэтажный жд для тестирования

Наименование организации инвестора: ООО "Грандстрой"

Управляющий проектом: ИП Фаттахова Светлана Салаватовна

Статус проекта:

Дата начала: 09.01.2013

Дата завершения: 09.03.2015

Карточка пакета работ по доходам бюджета инвестиционного проекта

Действия

Наименование пакета работ	Сумма по базовому плану бюджета	Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по прогнозному бюджету	Сумма по заключенным договорам долевого участия, договорам купли-продажи, договорам уступки, договорам инвестирования
ИТОГО:	**16 640.00**	**1 066 387.00**	**0.00**	**100.00**
ПродуктИнвестирования1_тест	0.00	0.00	0.00	0.00
ПродуктИнвестирования1_тест	9 570.00	985 900.00	0.00	0.00
ПродуктИнвестирования1_тест	1 470.00	1 100.00	0.00	0.00
тест1	850.00	78 610.00	0.00	0.00
тест2	4 750.00	777.00	0.00	0.00
Ежемесячная корректировка доходов по данным бухгалтерского учета	0.00	0.00	0.00	100.00

Добавление пакетов работ

Сумму по базовому плану бюджета и сумму по актуализированному бюджету может изменять только планировщик-аналитик. Список аналитиков можно

найти в разделе «Ресурсы», «Тип: Трудозатраты» (рисунок 9).

Проекты
Утверждения
Задачи
Ресурсы

	Название ресурса ↑	ИД	СДРес
	Тип: Трудозатраты		
☐	CGC 43.99.31 Укладка блоков и плит ленточны	3 855	
☐	Softline	3 904	
☐	Абакумов Олег Юрьевич	3 978	
☐	Абдрафигин Руслан Закуванович	3 950	Менеджер по управлению инвестированием в
☐	Абдуллин Ирек Чингисович	2 643	Менеджер по управлению инвестированием в
☐	Абрамушкин Евгений Олегович	3 903	Менеджер по управлению инвестированием в
☐	Акопян Арутюн Грачики	4 016	Менеджер по управлению инвестированием в
☐	Алексеев Павел Александрович	3 994	Специалист информационной и технической по
☐	Аликин Андрей Юрьевич	24	
☐	Анфимова Марина Сергеевна	3 971	Менеджер по управлению инвестированием в
☐	Астраханцева Ирина Васильевна	41	Специалист информационной и технической по
☐	Афанасьев Сергей Викторович	4 073	
☐	Багаутдинова Наталья Михайловна	3 859	Управляющий ИСП
☐	Барашков Михаил Владимирович	3 860	Управляющий ИСП
☐	Башенный кран Liebherr 132 EC-H 8 Litronic	3 885	Машины и механизмы
☐	Беляков Григорий Владимирович	6	Планировщик-аналитик
☐	Бигнов Урал Ришатович	3 927	

После выбора наименования пакета работ элементы таблицы становятся доступными для редактирования (рисунок 10).

Наименование пакета работ	Сумма по базовому плану бюджета	Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по прогнозному бюджету	Сумма по заключенным договорам долевого участия, договорам купли-продажи, договорам уступки, договорам инвестирования
ИТОГО:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ПродуктИнвестирования2_Тест	0.00	0.00	0.00	0.00
тест	0.00	0.00	0.00	0.00

Добавление пакетов работ

По щелчку кнопки открывается страница редактирования (рисунок 11).

Поиск на этом сайте

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Доходы по проекту / ПродуктИнвестирования1_тест / ПродуктИнвестирования2_Тест /

Дата	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Сумма по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету	Сумма по актуализированному бюджету
		0		0
	0	0	0	0

Кнопка предназначена для добавления новых строк, а кнопка – для удаления.

Заполненная таблица представлена на рисунке 12.

Дата	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Сумма по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету	Сумма по актуализированному бюджету
		9570,00		985900,00
29.01.2014	200,00	3000,00	400,00	550000,00
30.01.2014	120,00	2000,00	670,00	345560,00
31.01.2014	70,00	4570,00	250,00	90340,00
	50	890	0	0

В самом начале таблицы выводится итог по всем добавленным столбцам (рисунок 13).

Дата	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Сумма по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету	Сумма по актуализированному бюджету
		9570,00		985900,00
29.01.2014	200,00	3000,00	400,00	550000,00
30.01.2014	120,00	2000,00	670,00	345560,00
31.01.2014	70,00	4570,00	250,00	90340,00
	50	890	0	0

Планировщик-аналитик имеет право добавлять пакеты работ (рисунок 14).

Наименование пакета работ	Сумма по базовому плану бюдкета	Сумма по актуализированному бюджету
ПродуктИнвестирования2_Тест	9 570.00	985 900.00
тест	1 470.00	1 100.00

Добавление пакетов работ

После щелчка по ссылке появится форма для заполнения наименования нового пакета работ (рисунок 15).

Наименование

Тест2

Сохранить Добавить пакет работ

Сумма по базовому плану бюджета считается по всем датам и всем продуктам инвестирования (пакетам работ «Доходы») для базового плана (рисунок 16).

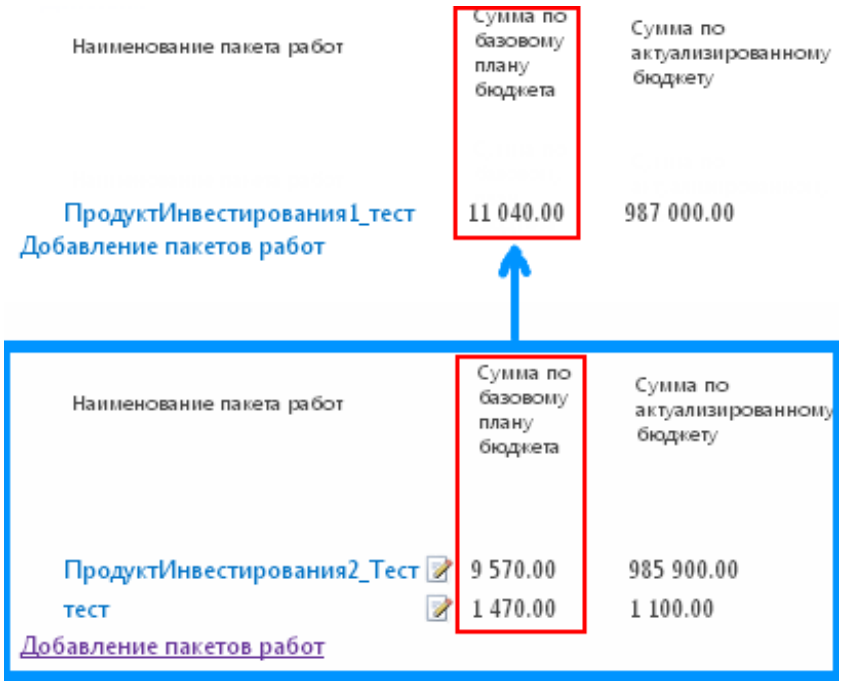

Сумма по актуализированному бюджету вычисляется по всем датам и всем продуктам инвестирования (пакетам работ «Доходы») для актуализированного плана (рисунок 17).

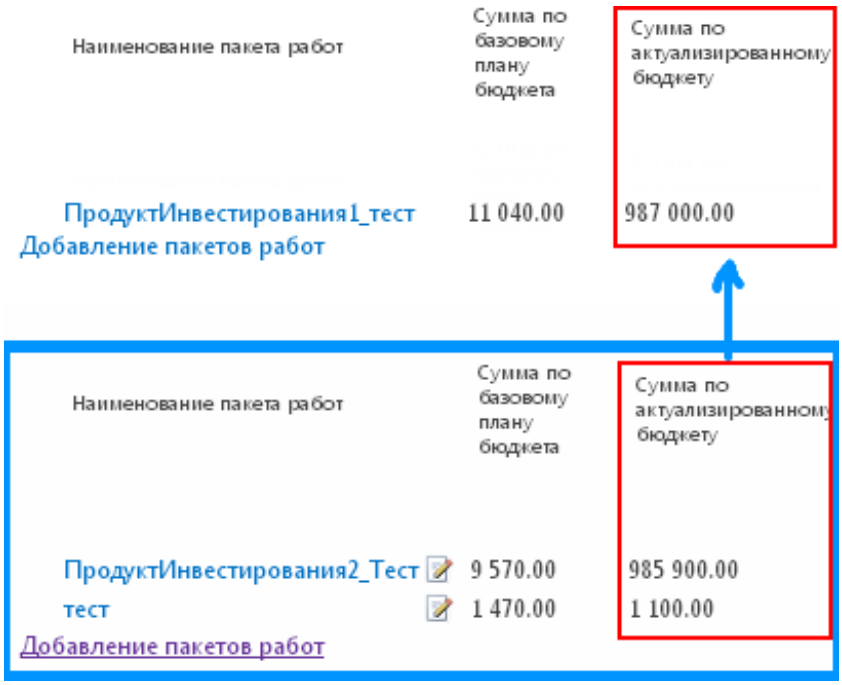

Показатели доходов «Сумма по заключенным договорам долевого участия, договорам купли-продажи, договорам уступки, договорам инвестирования», «Сумма фактических оплат накопительным итогом на текущую дату» подтягиваются из системы 1С.

Ежемесячная корректировка доходов по данным бухгалтерского учета

Пакет работ с фиксированным названием «Ежемесячная корректировка доходов по данным бухгалтерского учета» предназначен для редактирования доходов по бухгалтерскому учету (рисунок 18).

Наименование пакета работ	Сумма по базовому плану бюджета	Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по прогнозному бюджету
ИТОГО:	**5 600.00**	**79 387.00**	**0.00**
ПродуктИнвестирования1_тест	0.00	0.00	0.00
ПродуктИнвестирования1_тест	0.00	0.00	0.00
ПродуктИнвестирования1_тест	0.00	0.00	0.00
тест1	850.00	78 610.00	0.00
тест2	4 750.00	777.00	0.00
Ежемесячная корректировка доходов по данным бухгалтерского учета	0.00	0.00	0.00

Добавление пакетов работ

По щелчку кнопки открывается страница редактирования (рисунок 19).

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Доходы по проекту / Ежемесячная корректировка доходов по данным бухгалтерского учета /

Дата	Количество по заключенным договорам долевого участия	Сумма по заключенным договорам долевого участия, договорам купли-продажи, договорам уступки, договорам инвестирования, руб.	Сумма фактических оплат на текущую дату, руб.	Примечание по заключенным договорам	Примечание по фактическим оплатам
		0.00	0.00		
	0	0	0		

Колонки для заполнения:

- Дата,
- Количество по заключенным договорам долевого участия,
- Сумма по заключенным договорам долевого участия, договорам купли-продажи, договорам уступки, договорам инвестирования, руб.,
- Сумма фактических оплат на текущую дату, руб.,
- Примечание по заключенным договорам,
- Примечание по фактическим оплатам.

Значение поля «Дата» является уникальным: если пользователь укажет идентичную дату повторно, то система выдаст предупреждение (рисунок 20).

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Доходы по проекту / Ежемесячная корректировка доходов по данным бухгалтерского учета /

Дата	Количество по заключенным договорам долевого участия	Сумма по заключенным договорам долевого участия, договорам купли-продажи, договорам уступки, договорам инвестирования, руб.	Сумма фактических оплат на текущую дату, руб.	Примечание по заключенным договорам
		450 000.00	300 000.00	
16.06.2014	100.00	450 000.00	300 000.00	
16.06.2014	0	0	0	

Сообщение с веб-страницы

Выбранная дата уже имеется в таблице

OK

Кнопка служит для добавления новых строк, а кнопка – для удаления.

По столбцам «Сумма по заключенным договорам долевого участия, договорам купли-продажи, договорам уступки, договорам инвестирования, руб.» и «Сумма фактических оплат на текущую дату, руб.» в начале таблицы подсчитывается итог (рисунок 21).

Дата	Количество по заключенным договорам долевого участия	Сумма по заключенным договорам долевого участия, договорам купли-продажи, договорам уступки, договорам инвестирования, руб.	Сумма фактических оплат на текущую дату, руб.
		880 000.00	336 000.00
16.06.2014	100.00	450 000.00	300 000.00
17.06.2014	150.00	430 000.00	36 000.00
	0	0	0

Внесенная информация по данным столбцам будет отображаться на странице «Доходы по проекту» (рисунок 22).

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Доходы по проекту /

Наименование инвестиционного проекта: Многоэтажный жд для тестирования
Наименование организации инвестора: ООО "Грандстрой"
Управляющий проектом: ИП Фаттахова Светлана Салаватовна
Статус проекта:
Дата начала: 09.01.2013
Дата завершения: 09.03.2015

Карточка пакета работ по доходам бюджета инвестиционного проекта

Действия

Наименование пакета работ	Сумма по базовому плану бюджета	Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по прогнозному бюджету	Сумма по заключенным договорам долевого участия, договорам купли-продажи, договорам уступки, договорам инвестирования	Сумма оплат по актуализированному бюджету накопительным итогом на текущую дату	Сумма фактических оплат накопительным итогом на текущую дату
ИТОГО:	**5 600.00**	**79 387.00**	**0.00**	**880 000.00**	**0.00**	**336 000.00**
ПродуктИнвестирования1_тест	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПродуктИнвестирования1_тест	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПродуктИнвестирования1_тест	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
тест1	850.00	78 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
тест2	4 750.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ежемесячная корректировка доходов по данным бухгалтерского учета	0.00	0.00	0.00	880 000.00	0.00	336 000.00

Расходы по проекту

Внешний вид страницы «Расходы по проекту» показан на рисунке 23.

Наименование инвестиционного проекта: Многоэтажный жд для тестирования
Наименование организации инвестора: ООО "Грандстрой"
Управляющий проектом: ИП Фаттахова Светлана Салаватовна
Статус проекта:
Дата начала: 09.01.2013
Дата завершения: 09.03.2015

Карточка пакета работ по расходам бюджета инвестиционного проекта

Название единицы измерения инвестиционного проекта:	м2
Количество единиц измерения инвестиционного проекта:	1 000.00
Наименование пакета работ:	Расходы по проекту
Статус по ресурсной ведомости:	Разрабатывается
Дата утверждения ресурсной ведомости:	01.01.2001
Дата актуализации бюджета:	19.04.2014
Прогноз чистой прибыли:	0.00
Отклонение прогноза по прибыли от актуализированного бюджета:	0.00
Себестоимость единицы измерения инвестиционного проекта по прогнозу:	0.00
Себестоимость единицы измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету:	0.00
Сумма расходов по ресурсной ведомости:	128 343 972.84

Пакеты работ

1 - 100 Действия 1 - 100

Наименование пакета работ	Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по базовому плану бюджета	Сумма по прогнозному бюджету	Сумма по ресурсной ведомости	Сумма по заключенным договорам	Сумма по заключенным и обсуждающимся договорам	Сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня	Сумма по первичным учетным документам	Сумма платежей по авансам, отчетам и первичным учетным документам	Отклонение суммы прогнозного бюджета от актуализированного	Отклонение себестоимости единицы измерения инвестиционного проекта прогнозного бюджета от актуализированного
ИТОГО:	**39 148 400.00**	**39 348 990.00**	**59 584 407.84**	**128 343 972.84**	**116 548.03**	**31 705 483.25**	**15 972.60**	**21 546 420.78**	**0.00**	**20 436 007.84**	**539.21**
Сбор исходно-разрешительной документации	8 000.00	8 000.00	4 196 861.50	49.82	0.00	67 700.00	0.00	4 196 861.50	0.00	4 188 861.50	110.52
Работы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Материалы	0.00	0.00	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Машины и механизмы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Неопределено	8 000.00	8 000.00	4 196 861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4 196 861.50	0.00	4 188 861.50	110.52
Работы по устройству несущих конструкций выше отм. 0.000	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	1 978.60	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.04
Работы	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Карточка пакета работ содержит следующие данные:

- Наименование инвестиционного проекта.
- Наименование организации инвестора,
- Управляющий проектом,
- Статус проекта,

- Дата начала (рисунок 24),

Дата начала:	09.01.2013
Дата завершения:	09.03.2015

- Дата завершения.

Карточка пакета работ по расходам бюджета инвестиционного проекта по умолчанию скрыта и содержит следующие показатели:

- Название единицы измерения инвестиционного проекта,
- Количество единиц измерения инвестиционного проекта,
- Наименование пакета работ,
- Статус по ресурсной ведомости,
- Дата утверждения ресурсной ведомости – если значение пусто, то дата – 01.01.2001 (рисунок 25),

Дата утверждения ресурсной ведомости:	01.01.2001

- Дата актуализации бюджета – по показателю «Сумма по актуализированному бюджету». Вычисление осуществляется по всему проекту,
- Прогноз чистой прибыли – 0 (рисунок 26),

Прогноз чистой прибыли:	0.00
Отклонение прогноза по прибыли от актуализированного бюджета:	0.00
Себестоимость единицы измерения инвестиционного проекта по прогнозу:	0.00
Себестоимость единицы измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету:	0.00

- Отклонение прогноза по прибыли от актуализированного бюджета – 0,
- Себестоимость единицы измерения инвестиционного проекта по прогнозу – 0,
- Себестоимость единицы измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету – 0,
- Сумма расходов по ресурсной ведомости с учётом иерархии.

В строках табличной части расположены пакеты работ в разрезе типов ресурсов (Материалы/Работы/Механизмы). Пакеты работ выводятся с учётом иерархии сетевого графика (рисунок 27).

Наименование пакета работ		Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по базовому плану бюджета	Сумма по прогнозному бюджету	Сумма по ресурсной ведомости	Сумма по заключенным договорам
ИТОГО:		**39 148 400.00**	**39 348 990.00**	**59 584 407.84**	**128 343 972.84**	**116 548.03**
Сбор исходно-разрешительной документации		8 000.00	8 000.00	4 196 861.50	49.82	0.00
Работы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Материалы		0.00	0.00	0.00	49.82	0.00
Машины и механизмы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Неопределено		8 000.00	8 000.00	4 196 861.50	0.00	0.00
Работы по устройству несущих конструкций выше отм. 0.000		0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00

Столбцы таблицы:

- Сумма по актуализированному бюджету – заполняется вручную для каждого пакета работ,
- Сумма по базовому плану бюджета – заполняется вручную для каждого пакета работ,
- Сумма по прогнозному бюджету,

∑ максимальных значений по пакетам работ расходов {Сумма по актуализированному бюджету (Докипедия: СТО «Правила построения системы управления инвестиционными проектами»); Сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня (Докипедия: СТО «Правила построения системы управления инвестиционными проектами») + Сумма по первичным учетным документам (Докипедия: СТО «Правила построения системы управления инвестиционными проектами»)); Сумма по заключенным договорам (Докипедия: СТО «Правила построения системы управления инвестиционными проектами»} Вычисляется ежедневно,

- Сумма по ресурсной ведомости – заполняется по данным системы Autodesk Revit,
- Сумма по заключенным договорам включает в себя сумму по спецификациям со статусом «Действующая»,
- Сумма по заключенным и обсуждающимся договорам,
- Сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня,
- Сумма по первичным учетным документам,
- Сумма платежей по авансам, отчетам и первичным учетным документам,
- Отклонение суммы прогнозного бюджета от актуализированного,
- Отклонение себестоимости единицы измерения инвестиционного проекта прогнозного бюджета от актуализированного:

$$\frac{\text{Отклонение суммы прогнозного бюджета от актуализированного}}{\text{Количество прогнозному бюджету по пакетам работ}^{*}\text{Доходы}}$$

- Отклонение себестоимости единицы измерения инвестиционного проекта прогнозного бюджета от актуализированного.

Данные показатели представлены в формате деления на тысячи и после запятой присутствуют два знака (рисунок 28).

Наименование пакета работ		Сумма по актуализированному бюджету
ИТОГО:		**574 620 000.00**
Сбор исходно-разрешительной документации		348 000.00
Работы		0.00
Материалы		0.00
Машины и механизмы		0.00
Неопределено		348 000.00
Научные, технические и консультативные услуги		3 171 000.00

Перед пакетами работ выведена итоговая строка «Итого по всем пакетам» (рисунок 29).

Наименование пакета работ		Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по базовому плану бюджета	Сумма по прогнозному бюджету	Сумма по ресурсной ведомости	Сумма по заключенным договорам	Сумма по заключенным и обсуждающимся договорам
ИТОГО:		**39 148 400.00**	**39 348 990.00**	**59 584 407.84**	**128 343 972.84**	**116 548.03**	**31 705 483.25**

Следующие показатели таблицы формируются по данным учетной системы:

- Сумма по заключенным договорам,
- Сумма по заключенным и обсуждающимся договорам,
- Сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня,
- Сумма платежей по авансам, отчетам и первичным учетным документам,
- Прогноз по максимальному значению из списка пакета работа,
- Сумма платежей по авансам, отчетам и первичным учетным документам.

Каждая строчка пакета работ разбита на группы Материалы/Работы/Механизмы в зависимости от привязанных сумм к данному пакету работ.

Для следующих показателей разбивка на Материалы/Работы/Механизмы не осуществляется, а проставляются нули (рисунок 30):

- Сумма по актуализированному бюджету,
- Сумма по базовому плану бюджета,
- Сумма по прогнозному бюджету,

- Отклонение суммы прогнозного бюджета от актуализированного,
- Отклонение себестоимости единицы измерения инвестиционного проекта прогнозного бюджета от актуализированного,
- Сумма платежей по авансам, отчетам и первичным учетным документам,
- Сумма по первичным учетным документам.

Наименование пакета работ		Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по базовому плану бюджета	Сумма по прогнозному бюджету	Сумма по ресурсной ведомости	Сумма по заключенным договорам	Сумма по заключенным и обсуждающимся договорам	Сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня	Сумма по первичным учетным документам	Сумма платежей по авансам, отчетам и первичным учетным документам	Отклонение суммы прогнозного бюджета от актуализированного	Отклонение себестоимости единицы измерения инвестиционного проекта прогнозного бюджета от актуализированного
ИТОГО:		**39 148 400.00**	**39 348 990.00**	**59 584 407.84**	**128 343 972.84**	**116 548.03**	**31 705 483.25**	**15 972.60**	**21 546 420.78**	**0.00**	**20 436 007.84**	**539.21**
Сбор исходно-разрешительной документации		8 000.00	8 000.00	4 196 861.50	49.82	0.00	67 700.00	0.00	4 196 861.50	0.00	4 188 861.50	110.52
Работы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Материалы		0.00	0.00	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Машины и механизмы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Неопределено		8 000.00	8 000.00	4 196 861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4 196 861.50	0.00	4 188 861.50	110.52

Для остальных показателей разбиение происходит в зависимости от связки CGC – КПЕС – Материалы/Работы/Механизмы.

В названии пакета работ может быть указана ссылка, которая появляется, если в названии присутствует символ «№». При нажатии на неё осуществляется переход в карточку выбранного пакета работ.

Дополнительные пакеты работ, которые были получены со старого сайта отображаются, если сумма по одному из показателей не равна 0.

Сумму по базовому плану бюджета и сумму по актуализированному бюджету может изменять только планировщик-аналитик.

После выбора наименования пакета работ элементы таблицы становятся доступными для редактирования. Для внесения информации нужно щелкнуть два раза по выбранному полю (рисунок 31).

Поиск на этом сайте

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Расходы по проекту / Разработка эскизного проекта /

Наименование	Количество по базовому плану бюджета	Сумма по базовому плану бюджета	Количество по актуализированному бюджету	Сумма по актуализированному бюджету
Разработка эскизного проекта	20.00 ×	0.00	0.00	0.00
Договор на эскизный проект	0.00	0.00	0.00	0.00
Разработка эскизного проекта	0.00	0.00	0.00	0.00
Эскизный проект получен	0.00	0.00	0.00	0.00

Для сохранения информации можно воспользоваться кнопкой «Enter», для удаления – «Esc».

При попытке перемещения в другую ячейку без сохранения данных программа запрашивает подтверждение у пользователя (рисунок 32).



Заполненная таблица представлена на рисунке 33.

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Расходы по проекту / Разработка эскизного проекта /

Наименование	Количество по базовому плану бюджета	Сумма по базовому плану бюджета	Количество по актуализированному бюджету	Сумма по актуализированному бюджету
Разработка эскизного проекта	200.00	0.00	50.00	740.00
Договор на эскизный проект	250.00	420.00	40.00	8 900.00
Разработка эскизного проекта	52.00	0.00	72.00	1 000.00
Эскизный проект получен	410.00	520.00	0.00	6 300.00

Данные в пакете работ с фиксированным названием «Ежемесячная корректировка расходов по данным бухгалтерского учета» можно редактировать. Внешний вид формы как у формы для корректировки данных по пакетам работ доходы, столбцы: «Дата», «Сумма по первичным учетным документам».

Ежемесячная корректировка расходов по данным бухгалтерского учета

Пакет работ с фиксированным названием «Ежемесячная корректировка расходов по данным бухгалтерского учета» предназначен для редактирования расходов по бухгалтерскому учету (рисунок 34).

Рабочее пространство проектировщиков

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Расходы по проекту /

Наименование инвестиционного проекта: Многоэтажный жд для тестирования
Наименование организации инвестора: ООО "Грандстрой"
Управляющий проектом: ИП Фаттахова Светлана Салаватовна
Статус проекта:
Дата начала: 09.01.2013
Дата завершения: 09.03.2015

Карточка пакета работ по расходам бюджета инвестиционного проекта

Пакеты работ

101 - 200 Действия

Наименование пакета работ		Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по базовому плану бюджета	Сумма по прогнозному бюджету	Сумма по ресурсной ведомости	Сумма по заключенным договорам
ИТОГО:		**40 147 995.00**	**39 349 000.00**	**62 361 124.22**	**136 335.93**	**116 553.03**
Монтаж лифтового оборудования		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Материалы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Машины и механизмы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Неопределено		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ежемесячная корректировка расходов по данным бухгалтерского учета		15.00	10.00	15.00	0.00	0.00
Работы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Материалы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Машины и механизмы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Неопределено		15.00	10.00	15.00	0.00	0.00

По щелчку кнопки открывается страница редактирования (рисунок 35).

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Расходы по проекту / Ежемесячная корректировка расходов по данным бухгалтерского учета /

Дата	Сумма по первичным учетным документам, руб.	Сумма платежей по авансам, отчетам и первичным учетным документам, руб.	Примечание по первичным учетным документам	Примечание по сумме платежей
	1.00	**2.00**		
10.06.2014	1.00	2.00		
	0	0		

Колонки для заполнения:

- Дата,
- Сумма по первичным учетным документам, руб.,
- Сумма платежей по авансам, отчетам и первичным учетным документам, руб.,

- Примечание по первичным учетным документам,
- Примечание по сумме платежей.

Значение поля «Дата» является уникальным: если пользователь укажет идентичную дату повторно, то система выдаст предупреждение (рисунок 36).

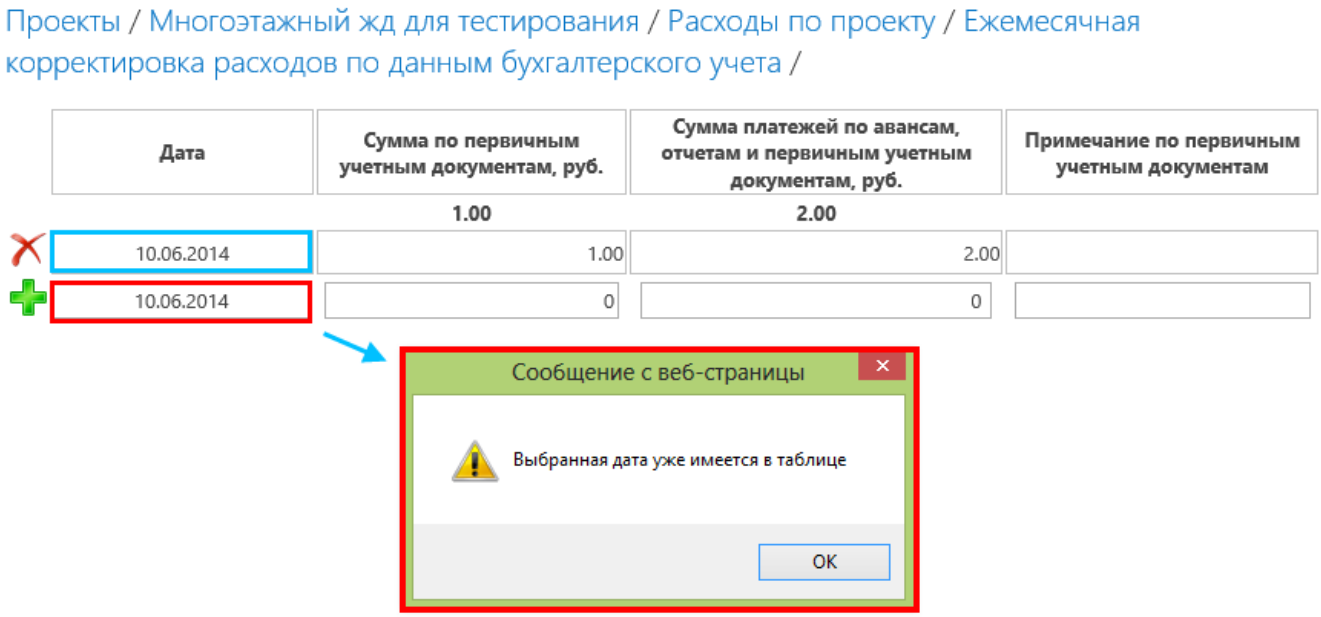

Кнопка предназначена для добавления новых строк, а кнопка – для удаления.

По колонкам «Сумма по первичным учетным документам, руб.» и «Сумма платежей по авансам, отчетам и первичным учетным документам, руб.» в начале таблицы подсчитывается итог (рисунок 37).

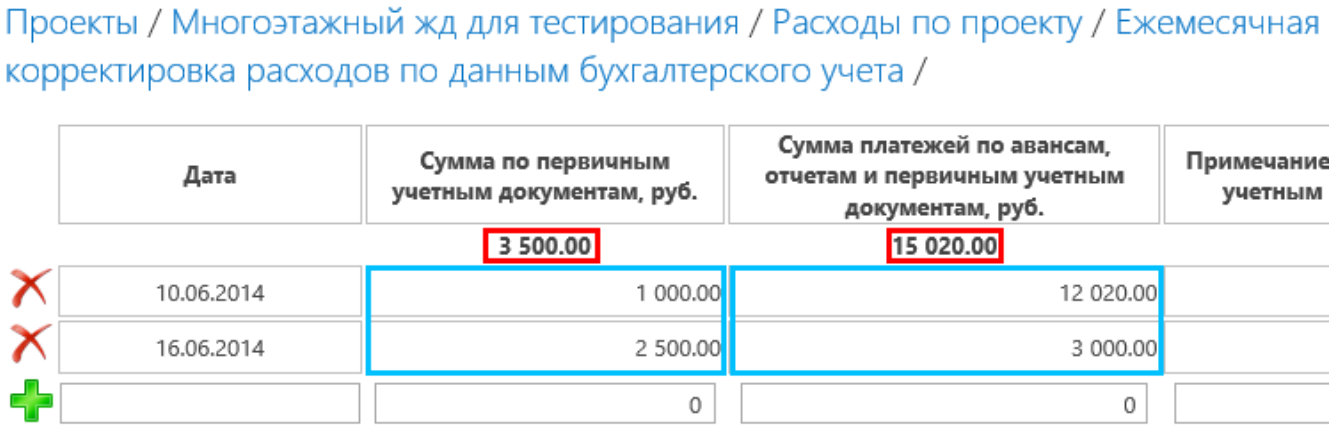

Внесенная информация по данным столбцам будет отображаться на странице «Расходы по проекту».

Карточка спецификации

Форма карточки отображается на отдельной странице сайта investproj.com и содержит скомпонованную информацию по расходам проекта (рисунок 38).

Проекты / 1 очередь одноэтажных блокированных домов в п Женева / Расходы по проекту / Разработка проектной, рабочей документации /

○ Все спецификации ◉ Спецификации по заключенным договорам

Пакет работ	Номер договора	Наименование поставщика	Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации	Номер первичного учетного документа, отчета, аванса	Сумма по документам	Сумма всех платежей	Отклонение суммы по ПУД от суммы всех платежей	Отклонение суммы по спецификации от суммы всех платежей
ИТОГО:					3 650 644.12		2 437 909.40	0.00	2 437 909.40	3 650 644.12
Разработка проектной, рабочей документации	12/004-2011/ЦИК от 01.05.2013	ООО "Грин Парк"			233 974.75		233 974.75	0.00	233 974.75	233 974.75
			Действующая	ЕГА00032 от 01.05.2013	233 974.75		233 974.75	0.00	233 974.75	233 974.75
Разработка проектной, рабочей документации	353/004-2011/ГП от 15.01.2013	ЗАО Проектное бюро "Призма"			808 500.00		808 500.00	0.00	808 500.00	808 500.00
			Действующая	ГИН00001 от 15.01.2013	808 500.00		808 500.00	0.00	808 500.00	808 500.00

Переход на данную страницу осуществляется по нажатию на поле «Сумма по заключенным и обсуждающимся договорам» или «Сумма по заключенным договорам» в соответствии с необходимым пакетом работ (рисунок 39).

Наименование пакета работ		Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по базовому плану бюджета	Сумма по прогнозному бюджету	Сумма по ресурсной ведомости	Сумма по заключенным договорам	Сумма по заключенным и обсуждающимся договорам	Сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня
ИТОГО:		**403 741 000.00**	**461 723 000.00**	**426 724 039.15**	**314 816 796.85**	**79 939 083.64**	**128 395 799.87**	**1 621 897.50**
Сбор исходно-разрешительной документации		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Материалы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Машины и механизмы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Неопределено		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разработка документации по планировке территории		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Материалы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Машины и механизмы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Неопределено		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разработка эскизного проекта		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Материалы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Машины и механизмы		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Неопределено		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разработка проектной, рабочей документации		1 857 000.00	2 093 000.00	3 827 909.40	0.00	3 650 644.12	5 092 394.12	0.00

При открытии формы спецификации можно проставить галочку для отбора: все спецификации или только по заключенным договорам (рисунок 40).

◉ Все спецификации ◯ Спецификации по заключенным договорам

Пакет работ	Номер договора	Наименование поставщика	Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации	Номер первичного учетного документа, отчета, аванса	Сумма по документам	Сумма всех платежей	Отклонение суммы по ПУД от суммы всех платежей	Отклонение суммы по спецификации от суммы всех платежей
ИТОГО:					5 092 394.12		3 827 909.40	118 398.60	3 709 510.80	4 973 995.52
Разработка проектной, рабочей документации	от	(НЕИЗВЕСТНО)			0.00		1 390 000.00	0.00	1 390 000.00	0.00
				(НЕИЗВЕСТНО)	0.00		1 390 000.00	0.00	1 390 000.00	0.00
Разработка проектной, рабочей документации	от	ООО "Генплан плюс"			0.00		0.00	118 398.60	-118 398.60	-118 398.60
				(НЕИЗВЕСТНО)	0.00		0.00	118 398.60	-118 398.60	-118 398.60
Разработка проектной, рабочей документации	100/018-2013/ГП от 18.04.2014	ООО "КОВИН"			329 375.00		0.00	0.00	0.00	329 375.00

В таблице данные создаются следующим образом:

- Номер договора формируется из спецификации в 1С (рисунок 41);

Проекты / 1 очередь одноэтажных блокированных домов в п Женева / Расходы по проекту / Разработка проектной, рабочей документации /

◯ Все спецификации ◉ Спецификации по заключенным договорам

Пакет работ	Номер договора	Наименование поставщика	Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации	Номер первичного учетного документа, отчета, аванса	Сумма по документам	Сумма всех платежей	Отклонение суммы по ПУД от суммы всех платежей	Отклонение суммы по спецификации от суммы всех платежей
ИТОГО:					3 650 644.12		2 437 909.40	0.00	2 437 909.40	3 650 644.12
Разработка проектной, рабочей документации	12/004-2011/ЦИК от 01.05.2013	ООО "Грин Парк"			233 974.75		233 974.75	0.00	233 974.75	233 974.75
			Действующая	ЕГА00032 от 01.05.2013	233 974.75		233 974.75	0.00	233 974.75	233 974.75
Разработка проектной, рабочей документации	353/004-2011/ГП от 15.01.2013	ЗАО Проектное бюро "Призма"			808 500.00		808 500.00	0.00	808 500.00	808 500.00
			Действующая	ГИН00001 от 15.01.2013	808 500.00		808 500.00	0.00	808 500.00	808 500.00

Спецификация к договору: Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента. Проведен

Операция | Цены и валюта... | Действия | Перейти | Открыть на сайте | Отразить на сайте

Номер: ГИН00001 от: 15.01.2013 0:00:00

Покупатель: Грин Парк ООО

Поставщик: Призма ПБ ЗАО

Договор: 353/004-2011/ГП от 15.01.2013

Цены и нормативы на дату: 15.01.2013

Вариант печатной формы: По умолчанию

Объект: 1 очередь одноэтажных блокир

Вид работ: 12.3. Проектная документация

Товары (1 поз.) | Накладные | Связь с Lotus

Подбор | Заполнить | Заполнить CGC

№	код ресурса	наименование товара/работы/услуги по договору	цена единичного	цена товара/р...	сумма по договору	ставка НДС	НДС	итого сумма по договору
1	CGC 71.12.12 Услуги по проек...	Проектирование блокированных жил...	353,10000	330,00	808 500,00	18%	123 330...	808 500,00
					808 500,00		123 330...	

Ссылка на договор позволяет открыть карточку договора на сайте «Закупки».

- Наименование поставщика берется из спецификации в 1С (рисунок 42);

Проекты / 1 очередь одноэтажных блокированных домов в п Женева / Расходы по проекту / Разработка проектной, рабочей документации /

○ Все спецификации ◉ Спецификации по заключенным договорам

Пакет работ	Номер договора	Наименование поставщика	Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации	Номер первичного учетного документа, отчета, аванса	Сумма по документам	Сумма всех платежей	Отклонение суммы по ПУД от суммы всех платежей	Отклонение суммы по спецификации от суммы всех платежей
ИТОГО:					3 650 644.12		2 437 909.40	0.00	2 437 909.40	3 650 644.12
Разработка проектной, рабочей документации	12/004-2011/ЦИК от 01.05.2013	ООО "Грин Парк"			233 974.75		233 974.75	0.00	233 974.75	233 974.75
			Действующая	ЕГА00032 от 01.05.2013	233 974.75		233 974.75	0.00	233 974.75	233 974.75
Разработка проектной, рабочей документации	353/004-2011/ГП от 15.01.2013	ЗАО Проектное бюро "Призма"			808 500.00		808 500.00	0.00	808 500.00	808 500.00
			Действующая	ГИН00001 от 15.01.2013	808 500.00		808 500.00	0.00	808 500.00	808 500.00

Спецификация к договору: Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента. Проведен

Операция | Цены и валюта... | Действия | Перейти | Открыть на сайте | Отразить на сайте

Номер: ГИН00001 от: 15.01.2013 0:00:00

Покупатель: Грин Парк ООО

Поставщик: Призма ПБ ЗАО

Договор: 353/004-2011/ГП от 15.01.2013

Цены и нормативы на дату: 15.01.2013

Вариант печатной формы: По умолчанию

Объект: 1 очередь одноэтажных блокир

Вид работ: 12.3. Проектная документация

Товары (1 поз.) | Накладные | Связь с Lotus

Подбор | Заполнить | Заполнить CGC

№	код ресурса	наименование товара/работы/услуги по договору	цена единичного	цена товара/р...	сумма по договору	ставка НДС	НДС	итого сумма по договору
1	CGC 71.12.12 Услуги по проек...	Проектирование блокированных жил...	353,10000	330,00	808 500,00	18%	123 330...	808 500,00
					808 500,00		123 330...	

По нажатию ссылки на наименование поставщика открывается страница организации на сайте «Юридические лица» (рисунок 43).

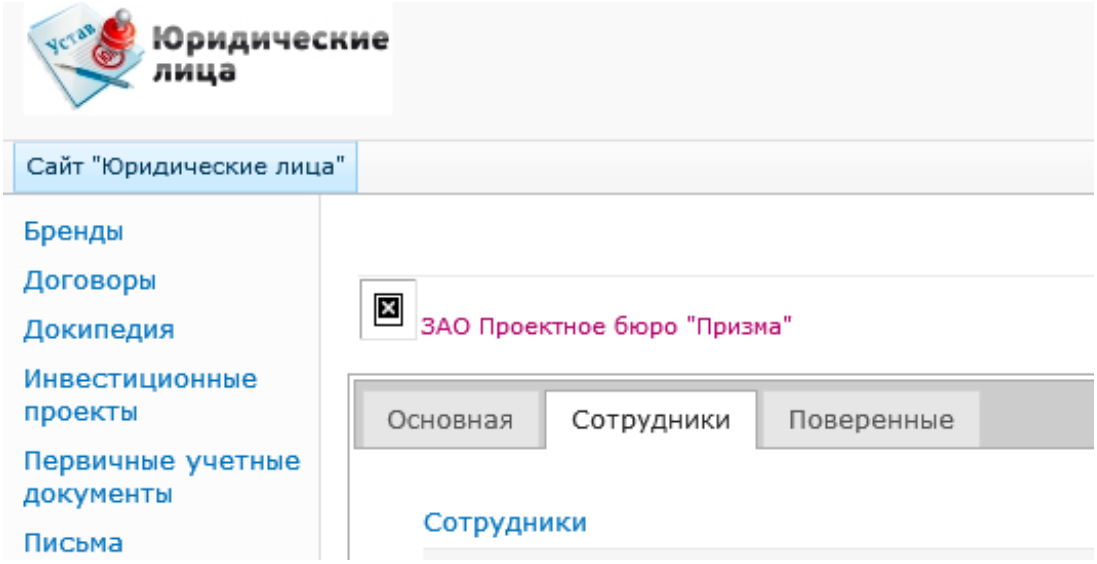

- Статус спецификации формируется из спецификации в 1С (рисунок 44).

Проекты / 1 очередь одноэтажных блокированных домов в п Женева / Расходы по проекту / Разработка проектной, рабочей документации /

Все спецификации Спецификации по заключенным договорам

Пакет работ	Номер договора	Наименование поставщика	Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации	Номер первичного учетного документа, отчета, аванса	Сумма по документам	Сумма всех платежей	Отклонение суммы по ПУД от суммы всех платежей	Отклонение суммы по спецификации от суммы всех платежей
ИТОГО:					3 650 644.12		2 437 909.40	0.00	2 437 909.40	3 650 644.12
Разработка проектной, рабочей документации	12/004-2011/ЦИК от 01.05.2013	ООО "Грин Парк"			233 974.75		233 974.75	0.00	233 974.75	233 974.75
			Действующая	ЕГА00032 от 01.05.2013	233 974.75		233 974.75	0.00	233 974.75	233 974.75
Разработка проектной, рабочей документации	353/004-2011/ГП от 15.01.2013	ЗАО Проектное бюро "Призма"			808 500.00		808 500.00	0.00	808 500.00	808 500.00
			Действующая	ГИН00001 от 15.01.2013	808 500.00		808 500.00	0.00	808 500.00	808 500.00

Спецификация к договору: Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента. Проведен

Операция | Цены и валюта... | Действия | Перейти | Открыть на сайте | Отразить на сайте

Номер: ГИН00001 от: 15.01.2013 0:00:00

Покупатель: Грин Парк ООО

Поставщик: Призма ПБ ЗАО

Договор: 353/004-2011/ГП от 15.01.2013

Цены и нормативы на дату: 15.01.2013

Вариант печатной формы: По умолчанию

Объект: 1 очередь одноэтажных блокир

Вид работ: 12.3. Проектная документация

Товары (1 поз.) | Накладные | Связь с Lotus

Открыть спецификацию в Лотусе

Состояние: Действующая

Ссылка на спецификацию позволяет открыть карточку спецификации на сайте «Закупки» (рисунок 45).

Маршрут	Договоры \ Договор № 353/004-2011/ГП от 15.01.2013 \ Спецификация № ГИН00001 от 15.01.2013
Номер	ГИН00001
Дата	15.01.2013
Организация (покупатель)	Грин Парк ООО
Контрагент (продавец)	Призма ПБ ЗАО
Сумма	808500,00
Вариант печатной формы	По умолчанию

Проект покупателя	Проект продавца	Код ресурса	Наименование товара \ работы \ услуги по договору	Ед. изм.	Кол-во	Цена единичного ресурса за ед.	Цена товара \ работы \ услуги по договору за ед.	Сумма по договору	НДС	Итого сумма по договору
Проектов: 1, на сумму 808500,00		CGC 71.12.12 Выполнение комплекса услуг по проектированию жилых зданий	Проектирование блокированных жилых зданий	нормо-час	2450,000	353,10	279,66	685169,49	123330,51	808500,00

В отбор по статусу попадают не только действующие спецификации, но и со статусами: «Исполнена», «Приостановлена», «Прекратила действие» (рисунки 46 и 47);

○ Все спецификации ◉ Спецификации по заключенным договорам

Пакет работ	Номер договора	Наименование поставщика	Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации
ИТОГО:					994 995.36
Проведение экспертизы проектной документации	137/022-2011/ИЦЭф от 19.11.2013	ООО "Грин Парк"			133 047.36
			Действующая	УЮТ00624 от 19.11.2013	133 047.36
Проведение экспертизы проектной документации	25/010-2012/ИЦЭф/уч.145Га от 14.03.2013	ООО "Грин Парк"			861 948.00
			Приостановлена	УЮТ00086 от 14.03.2013	861 948.00

○ Все спецификации ◉ Спецификации по заключенным договорам

Пакет работ	Номер договора	Наименование поставщика	Статус спецификации	Номер спецификации
Работы по устройству несущих конструкций выше отм.0.000	978/009-2012/ГП от 23.12.2013	ООО "Механизация строительства"		
			Действующая	ГИН04222 от 23.12.2013
Работы по устройству несущих конструкций выше отм.0.000	99/026-2012/ГП от 04.09.2012	ООО "ЭмБиЭм Маркетинг"		
			ПрекратилаДействие	ГИН00304 от 01.09.2012
			ПрекратилаДействие	ГИН00307 от 17.09.2012
			ПрекратилаДействие	ГИН00308 от 18.09.2012

- Номер спецификации берется из спецификации в 1С (рисунок 48);

Проекты / 1 очередь одноэтажных блокированных домов в п Женева / Расходы по проекту / Разработка проектной, рабочей документации /

Все спецификации | Спецификации по заключенным договорам

Пакет работ	Номер договора	Наименование поставщика	Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации	Номер первичного учетного документа, отчета, аванса	Сумма по документам	Сумма всех платежей	Отклонение суммы по ПУД от суммы всех платежей	Отклонение суммы по спецификации от суммы всех платежей
ИТОГО:					3 650 644.12		2 437 909.40	0.00	2 437 909.40	3 650 644.12
Разработка проектной, рабочей документации	12/004-2011/ЦИК от 01.05.2013	ООО "Грин Парк"			233 974.75		233 974.75	0.00	233 974.75	233 974.75
			Действующая	ЕГА00032 от 01.05.2013	233 974.75		233 974.75	0.00	233 974.75	233 974.75
Разработка проектной, рабочей документации	353/004-2011/ГП от 15.01.2013	ЗАО Проектное бюро "Призма"			808 500.00		808 500.00	0.00	808 500.00	808 500.00
			Действующая	ГИН00001 от 15.01.2013	808 500.00		808 500.00	0.00	808 500.00	808 500.00

Спецификация к договору: Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента. Проведен

Операция | Цены и валюта... | Действия | Перейти | Открыть на сайте | Отразить на сайте

Номер: ГИН00001 от: 15.01.2013 0:00:00

Покупатель: Грин Парк ООО

Поставщик: Призма ПБ ЗАО

Договор: 353/004-2011/ГП от 15.01.2013

Цены и нормативы на дату: 15.01.2013

Вариант печатной формы: По умолчанию

Объект: 1 очередь одноэтажных блокир

Вид работ: 12.3. Проектная документация

Товары (1 поз.) | Накладные | Связь с Lotus

Подбор | Заполнить | Заполнить CGC

№	код ресурса	наименование товара/работы/услуги по договору	цена единичного	цена товара/р...	сумма по договору	ставка НДС	НДС	итого сумма по договору
1	CGC 71.12.12 Услуги по проек...	Проектирование блокированных жил...	353,10000	330,00	808 500,00	18%	123 330...	808 500,00
					808 500,00		123 330...	

- Сумма по спецификации считается по строкам спецификации, привязанным к сайту (рисунок 49);

Проекты / 1 очередь одноэтажных блокированных домов в п Женева / Расходы по проекту / Разработка проектной, рабочей документации /

Все спецификации | Спецификации по заключенным договорам

Пакет работ	Номер договора	Наименование поставщика	Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации	Номер первичного учетного документа, отчета, аванса	Сумма по документам	Сумма всех платежей	Отклонение суммы по ПУД от суммы всех платежей	Отклонение суммы по спецификации от суммы всех платежей
ИТОГО:					3 650 644.12		2 437 909.40	0.00	2 437 909.40	3 650 644.12
Разработка проектной, рабочей документации	12/004-2011/ЦИК от 01.05.2013	ООО "Грин Парк"			233 974.75		233 974.75	0.00	233 974.75	233 974.75
			Действующая	ЕГА00032 от 01.05.2013	233 974.75		233 974.75	0.00	233 974.75	233 974.75
Разработка проектной, рабочей документации	353/004-2011/ГП от 15.01.2013	ЗАО Проектное бюро "Призма"			808 500.00		808 500.00	0.00	808 500.00	808 500.00
			Действующая	ГИН00001 от 15.01.2013	808 500.00		808 500.00	0.00	808 500.00	808 500.00

Спецификация к договору: Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента. Проведен

Операция | Цены и валюта... | Действия | Перейти | Открыть на сайте | Отразить на сайте

Номер: ГИН00001 от: 15.01.2013 0:00:00

Покупатель: Грин Парк ООО

Поставщик: Призма ПБ ЗАО

Договор: 353/004-2011/ГП от 15.01.2013

Цены и нормативы на дату: 15.01.2013

Вариант печатной формы: По умолчанию

Объект: 1 очередь одноэтажных блокир

Вид работ: 12.3. Проектная документация

Товары (1 поз.) | Накладные | Связь с Lotus

Подбор | Заполнить | Заполнить CGC

№	код ресурса	наименование товара/работы/услуги по договору	цена единичного	цена товара/р...	сумма по договору	ставка НДС	НДС	итого сумма по договору
1	CGC 71.12.12 Услуги по проек...	Проектирование блокированных жил...	353,10000	330,00	808 500,00	18%	123 330...	808 500,00
					808 500,00		123 330	

- Номер первичного учетного документа, отчета, аванса;
- Сумма по документам – сумма первичных учетных документов, связанных со спецификацией и имеющих статус «Проведен» (рисунок 50).

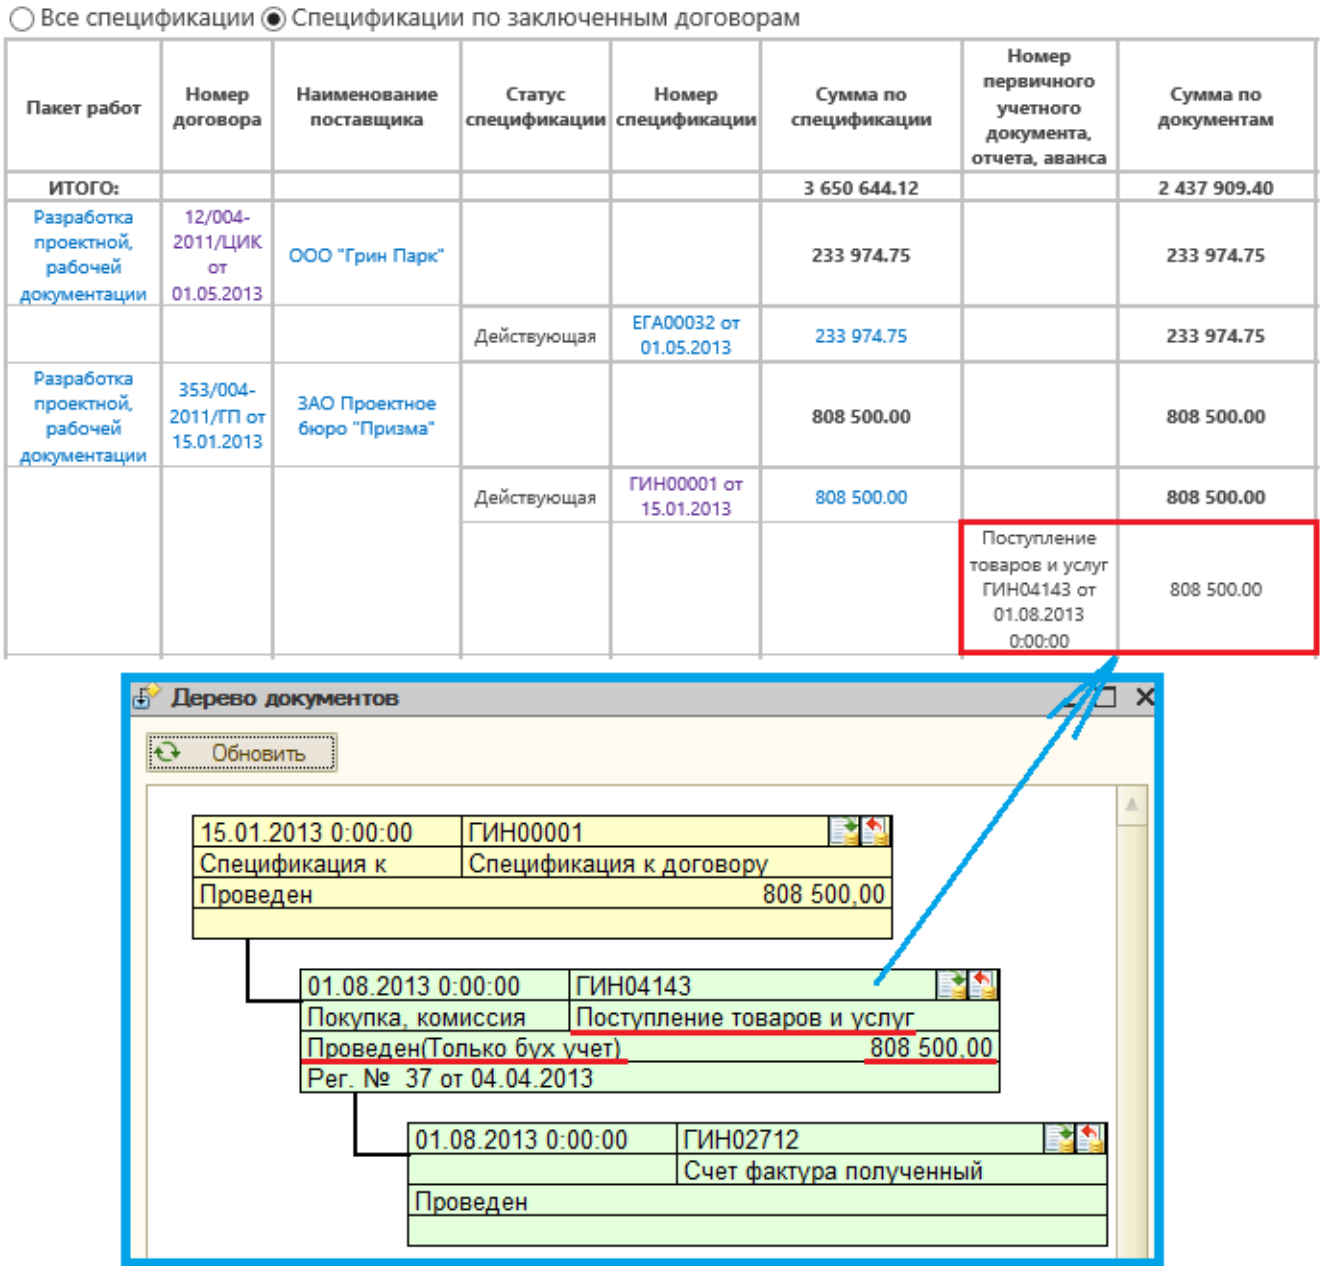

Все спецификации ◉ Спецификации по заключенным договорам

Пакет работ	Номер договора	Наименование поставщика	Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации	Номер первичного учетного документа, отчета, аванса	Сумма по документам
ИТОГО:					3 650 644.12		2 437 909.40
Разработка проектной, рабочей документации	12/004-2011/ЦИК от 01.05.2013	ООО "Грин Парк"			233 974.75		233 974.75
			Действующая	ЕГА00032 от 01.05.2013	233 974.75		233 974.75
Разработка проектной, рабочей документации	353/004-2011/ГП от 15.01.2013	ЗАО Проектное бюро "Призма"			808 500.00		808 500.00
			Действующая	ГИН00001 от 15.01.2013	808 500.00		808 500.00
						Поступление товаров и услуг ГИН04143 от 01.08.2013 0:00:00	808 500.00

- Сумма всех платежей – сумма по документам «Расходование/ Пополнение бюджета по проектам», связанным с договором, спецификацией, пакетом работ (рисунок 51);

Пакет работ	Номер договора	Наименование поставщика	Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации	Номер первичного учетного документа, отчета, аванса	Сумма по документам	Сумма всех платежей
ИТОГО:					63 387 189.55		25 601 163.90	572 927.25
Земляные работы	46/125-2009/СТК от 01.07.2012	ООО "Грин Парк"			0.00		289 510.00	0.00
			Действующая	СЛК00349 от 01.07.2012	0.00		289 510.00	0.00
Земляные работы	52/125-2009/ТСТ от 01.07.2012	ООО "Грин Парк"			0.00		20 980.00	0.00
			Действующая	ТСТ00252 от 01.07.2012	0.00		20 980.00	0.00
Работы по устройству фундаментов	1028/009-2012/ГП сваи 3 от 30.12.2013	ООО "Строймеханизация"			3 161 957.99		0.00	250 000.00
			Действующая	ГИН04551 от 30.12.2013	3 161 957.99		0.00	250 000.00
						Пополнение/Расходование бюджета по проектам ГИН01652 от 08.05.2014 17:00:00	0.00	250 000.00

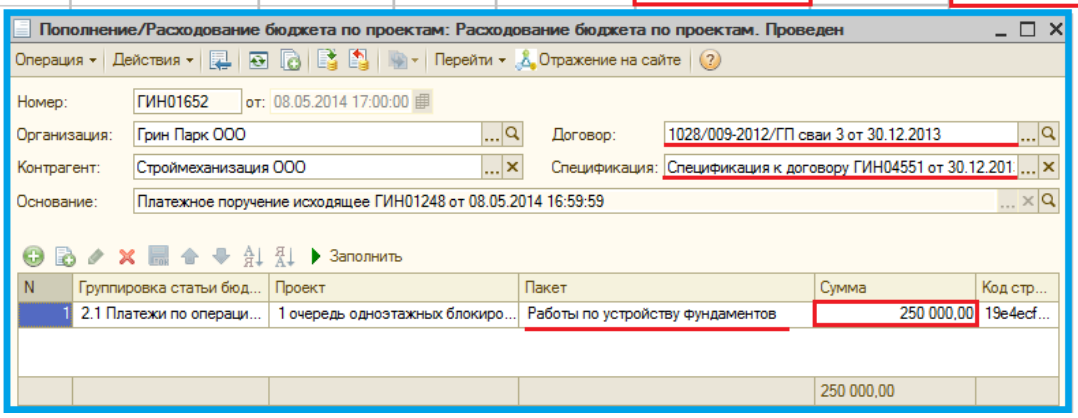

- Отклонение суммы по ПУД от суммы всех платежей рассчитывается как разница между показателями «Сумма по документам» и «Сумма всех платежей» (рисунок 52);

Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации	Номер первичного учетного документа, отчета, аванса	Сумма по документам	Сумма всех платежей	Отклонение суммы по ПУД от суммы всех платежей	Отклонение суммы по спецификации от суммы всех платежей
		63 387 189.55		25 601 163.90	572 927.25	25 028 236.65	62 814 262.30
		0.00		289 510.00	0.00	289 510.00	0.00
Действующая	СЛК00349 от 01.07.2012	0.00		289 510.00	0.00	289 510.00	0.00
		0.00		20 980.00	0.00	20 980.00	0.00
Действующая	ТСТ00252 от 01.07.2012	0.00		20 980.00	0.00	20 980.00	0.00
		3 161 957.99		0.00	250 000.00	-250 000.00	2 911 957.99
Действующая	ГИН04551 от 30.12.2013	3 161 957.99		0.00	250 000.00	-250 000.00	2 911 957.99
			Пополнение/Расходование бюджета по проектам ГИН01652 от 08.05.2014 17:00:00	0.00	250 000.00	-250 000.00	

- Отклонение суммы по спецификации от суммы всех платежей вычисляется как разница между показателями «Сумма по спецификации» и «Сумма всех платежей» (рисунок 53).

Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации	Номер первичного учетного документа, отчета, аванса	Сумма по документам	Сумма всех платежей	Отклонение суммы по ПУД от суммы всех платежей	Отклонение суммы по спецификации от суммы всех платежей
		63 387 189.55		25 601 163.90	572 927.25	25 028 236.65	62 814 262.30
		0.00		289 510.00	0.00	289 510.00	0.00
Действующая	СЛК00349 от 01.07.2012	0.00		289 510.00	0.00	289 510.00	0.00
		0.00		20 980.00	0.00	20 980.00	0.00
Действующая	ТСТ00252 от 01.07.2012	0.00		20 980.00	0.00	20 980.00	0.00
		3 161 957.99		0.00	250 000.00	-250 000.00	2 911 957.99
Действующая	ГИН04551 от 30.12.2013	3 161 957.99		0.00	250 000.00	-250 000.00	2 911 957.99
			Пополнение/Расходование бюджета по проектам ГИН01652 от 08.05.2014 17:00:00	0.00	250 000.00	-250 000.00	

минус равно

Ресурсная ведомость

Общая информация

Сумма ресурсной ведомости формируется из программы Revit и не подлежит редактированию.

В таблице столбец «Сумма ресурсной ведомости» содержит гиперссылку по каждому пакету работ (рисунок 54).

Наименование пакета работ		Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по базовому плану бюджета	Сумма по прогнозному бюджету	Сумма по ресурсной ведомости
ВСЕГО:		**28 148 400.00**	**28 348 990.00**	**0.00**	**59 558.00**
Сбор исходно-разрешительной документации		8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
Работы		2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
Материалы		4 800.00	4 800.00	0.00	0.00
Машины и механизмы		1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
Неопределено		0.00	0.00	0.00	0.00
Работы по устройству несущих конструкций выше отм. 0.000		0.00	0.00	0.00	2.00
Работы		0.00	0.00	0.00	2.00
Материалы		0.00	0.00	0.00	0.00
Машины и механизмы		0.00	0.00	0.00	0.00

По ссылке отображается «Карточка единичного ресурса CGC инвестиционного проекта» (рисунок 55).

Карточка единичного ресурса CGC инвестиционного проекта

Название единицы измерения инвестиционного проекта:	м2
Количество единиц измерения инвестиционного проекта по базовому плану:	13 419.00
Количество единиц измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету:	13 419.00
Дата актуализации бюджета:	23.10.2012
Наименование пакета работ:	ЖД №193.2
Статус по ресурсной ведомости:	
Дата утверждения ресурсной ведомости:	
Сумма расходов по ресурсной ведомости:	14 816 614.32

Ресурсная ведомость в Excel

Наименование пакета работ	Наименование единичного ресурса CGC	Ед. изм.	Кол-во по ресурсной ведомости	Рекомендуемая цена единицы измерения по ресурсной ведомости	Сумма рекомендованных стоимостей по ресурсной ведомости	Источник данных	Кол-во в спецификации по заключенным и обсуждающимся договорам	Цена по спецификации единицы измерения	Сумма спецификации по заключенным и обсуждающимся договорам	Номер спецификации	Статус спецификации	Номер договора
Земляные работы			0.00	0.00	0.00	SPC	326.00	200.00	65 200.00	ЙЙЙ00271 от 18.10.2012	Захвачена	СТД СМК 009-2012 Договор строительного подряда (из материалов Заказчика)
Земляные работы			0.00	0.00	0.00	SPC	160.00	200.00	32 000.00	ЙЙЙ00279 от 22.10.2012	Захвачена	СТД СМК 009-2012 Договор строительного подряда (из материалов Заказчика)
Земляные работы			0.00	0.00	0.00	SPC	406.00	200.00	81 200.00	ЙЙЙ00297 от 24.10.2012	Захвачена	СТД СМК 009-2012 Договор строительного подряда (из материалов Заказчика)
Земляные работы			0.00	0.00	0.00	SPC	326.00	200.00	65 200.00	ЙЙЙ00271 от 18.10.2012	Захвачена	СТД СМК 009-2012 Договор строительного подряда (из материалов Заказчика)

В столбце «Источник данных» возможны следующие значения (рисунок 56):

- SPC – данные формируются из спецификации;
- XLS – данные формируются из Excel;
- 3D – данные формируются из программы Revit;
- 3D Civil – данные формируются из программы Civil;
- MNL – данные исправляются вручную.

Ресурсная ведомость в Excel

Наименование пакета работ	Наименование единичного ресурса CGC	Ед. изм.	Кол-во по ресурсной ведомости	Рекомендуемая цена единицы измерения по ресурсной ведомости	Сумма рекомендованных стоимостей по ресурсной ведомости	Источник данных	Кол-во в спецификации по заключенным и обсуждающимся договорам
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения			0.00	0.00	0.00	SPC	-8.00
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения			0.00	0.00	0.00	SPC	-2.759
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения			0.00	0.00	0.00	SPC	-0.04
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения	CGC 23.14.12 Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к теплоизоляционному слою, марки 100, толщиной 80 мм	м3	0.00015441	0.00	0.00	3D	0.00
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения	CGC 23.14.12 Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к теплоизоляционному слою, марки 100, толщиной 80 мм	м3	0.00080094	0.00	0.00	3D	0.00

В колонке «Количество в спецификации по заключенным и обсуждающимся договорам» выводятся данные из спецификаций, привязанных к выбранному пакету работ и имеющих аналогичный код CGC. Если код CGC отсутствует для сопоставления, то новой строкой выводится данный код CGC, у которого в источнике данных будет стоять SPC.

Цена по спецификации образуется по данным спецификации, связанной с сайтом (рисунок 57).

Ресурсная ведомость в Excel

Наименование пакета работ	Наименование единичного ресурса CGC	Ед. изм.	Кол-во по ресурсной ведомости	Рекомендуемая цена единицы измерения по ресурсной ведомости	Сумма рекомендованных стоимостей по ресурсной ведомости	Источник данных	Кол-во в спецификации по заключенным и обсуждающимся договорам	Цена по спецификации единицы измерения
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения			0.00	0.00	0.00	SPC	-8.00	320.89
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения			0.00	0.00	0.00	SPC	-2.759	445.06
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения			0.00	0.00	0.00	SPC	-0.04	2 830.75
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения			0.00	0.00	0.00	SPC	-3.00	4 883.13

Сумма по спецификации также формируется по данным спецификации, связанной с сайтом (рисунок 58).

Ресурсная ведомость в Excel

Наименование пакета работ	Наименование единичного ресурса CGC	Ед. изм.	Кол-во по ресурсной ведомости	Рекомендуемая цена единицы измерения по ресурсной ведомости	Сумма рекомендованных стоимостей по ресурсной ведомости	Источник данных	Кол-во в спецификации по заключенным и обсуждающимся договорам	Цена по спецификации единицы измерения	Сумма спецификации по заключенным и обсуждающимся договорам
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения			0.00	0.00	0.00	SPC	-8.00	320.89	-2 567.12
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения			0.00	0.00	0.00	SPC	-2.759	445.06	-1 227.92
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения			0.00	0.00	0.00	SPC	-0.04	2 830.75	-113.23

В таблице могут встречаться пакеты с одинаковыми CGC, но имеющие разные показатели (рисунок 59).

CGC 42.21.21 Общестроительные работы по прокладке магистральных трубопроводов	нормо-час	0.00	0.00	0.00	SPC	125.00	419.61	52 451.25	ГПУ09176 от 27.08.2013	Действующая	СТД СМК 009-2012 Договор строительного подряда (из материалов Заказчика) (с изменениями №2)
CGC 42.21.21 Общестроительные работы по прокладке магистральных трубопроводов	нормо-час	0.00	0.00	0.00	SPC	308.14	419.61	129 298.63	ГПУ09176 от 27.08.2013	Действующая	СТД СМК 009-2012 Договор строительного подряда (из материалов Заказчика) (с изменениями №2)
CGC 42.21.21 Общестроительные работы по прокладке магистральных трубопроводов	нормо-час	0.00	0.00	0.00	SPC	156.16	419.61	65 526.30	ГПУ09176 от 27.08.2013	Действующая	СТД СМК 009-2012 Договор строительного подряда (из материалов Заказчика) (с изменениями №2)

Пользователь может выгрузить данные ресурсной ведомости в формате .xlsx с помощью нажатия по надписи «Ресурсная ведомость Excel» (рисунок 60).

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Расходы по проекту / Конструкции сборные железобетонные, монолитные, кирпичные, металлические /

Главная
Документы
Задачи
Календарь
Сведения о проекте
Последние
Конечные результаты
Риски
Вопросы
Содержимое сайта
ИЗМЕНИТЬ ССЫЛКИ

Карточка единичного ресурса CGC инвестиционного проекта

Название единицы измерения инвестиционного проекта: м2
Количество единиц измерения инвестиционного проекта по базовому плану: 1 970.00
Количество единиц измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету: 6 630.00
Дата актуализации бюджета: 09.01.2013
Наименование пакета работ: Конструкции сборные железобетонные, монолитные, ки
Статус по ресурсной ведомости:
Дата утверждения ресурсной ведомости:
Сумма расходов по ресурсной ведомости: 0.00

Ресурсная ведомость в Excel

Наименование пакета работ	Наименование единичного ресурса CGC	Ед. изм.	Кол-во по ресурсной ведомости	Рекомендуемая цена единицы измерения по ресурсной ведомости	Сумма рекомендованных стоимостей по ресурсной ведомости	Источник данных	Кол-во в спецификации по заключенным и обсуждающимся договорам	Цена по специфика единицы измерени
Конструкции сборные железобетонные, монолитные, кирпичные, металлические	CGC 24.10.61 Сталь нелегированная горячекатаная для армирования гладкого профиля диаметр 10 мм	кг	0.00	0.00	0.00	SPC	2.00	40
Конструкции сборные железобетонные,	CGC 24.10.61 Сталь нелегированная	кг	0.00	0.00	0.00	SPC	2.00	50

nvestproj.com/_layouts/15/inv13/bcc_descriptions.aspx?id_packag...

Ресурсная_ведомост....xlsx Все загрузки...

Пример выгруженной ресурсной ведомости представлен на рисунке 61.

Файл | Главная | Вставка | Разметка страницы | Формулы | Данные | Рецензирование | Вид | Надстройки

Вставить | Буфер обмена | Calibri 11 | Шрифт | Выравнивание | Общий | Число | Условное форматирование | Форматировать как таблицу | Стили ячеек | Стили | Вставить | Удалить | Формат | Ячейки | Сортировка и фильтр | Найти и выделить | Редактирование

A1 | id = ad98369e-e6b5-472f-b6a4-536027ebfe69

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	id = ad98369e-e6b5-472f-b6a4-536027ebfe69													
2	Наименов	Наименов	Ед. изм.	Кол-во по	Рекомен	Сумма ре	Источник	Кол-во в с	Цена по с	Сумма сп	Номер сп	Статус спе	Номер договора	
3	Конструк	CGC 49.39	маш-час				SPC	2,0000000	100,00000	200,00000	ГДС02438	Свободна		
4	Конструк	CGC 49.39	маш-час				SPC	100,00000	1100,0000	110000,00	ГПУ01171	Захвачена	СТД СМК 127-2009	
5	Конструк	CGC 49.39	маш-час				SPC	2,0000000	1000,0000	2000,0000	ГПУ05724	Прекрати	СТД СМК 001-2013	
6	Конструк	CGC 33.20	км				SPC	10,000000	400,00000	4000,0000	ГПУ05724	Прекрати	СТД СМК 001-2013	
7	Конструк	CGC 49.39	маш-час				SPC	3,0000000	1000,0000	3000,0000	ГПУ05741	Прекрати	СТД СМК 001-2013	
8	Конструк	CGC 49.39	маш-час				SPC	3,0000000	1000,0000	3000,0000	ГПУ05845	Захвачена	СТД СМК 001-2013	
9	Конструк	CGC 49.39	маш-час				SPC	5,0000000	1000,0000	5000,0000	ГПУ05845	Захвачена	СТД СМК 001-2013	
10	Конструк	CGC 43.31	нормо-ча				SPC	7,0000000	300,00000	2100,0000	ГДС00682	Захвачена	СТД СМК 017-2013	
11	Конструк	CGC 43.31	нормо-ча				SPC	150,00000	300,00000	45000,000	ГДС00763	Действук	Тест	
12	Конструк	CGC 49.39	маш-час				SPC	2,0000000	150,00000	300,00000	ГДС02227	Захвачена	СТД СМК 001-2013	
13	Конструк	CGC 24.10	кг				SPC	1,0000000	300,00000	300,00000	ГДС02075	Захвачена	СТД СМК 107-2009	
14	Конструк	CGC 24.10	кг				SPC	2,0000000	400,00000	800,00000	ГДС02075	Захвачена	СТД СМК 107-2009	
15	Конструк	CGC 24.10	кг				SPC	2,0000000	500,00000	1000,0000	ГДС02142	Захвачена	СТД СМК 118-2009	
16	Конструк	CGC 24.10	кг				SPC	5,0000000	100,00000	500,00000	ГДС02315	Захвачена	СТД СМК 118-2009	
17	Конструк	CGC 24.10	кг				SPC	6,0000000	30,000000	180,00000	ГДС02558	Захвачена	СТД СМК 118-2009	
18	Конструк	CGC 24.10	кг				SPC	5,0000000	20,000000	100,00000	ГДС02558	Захвачена	СТД СМК 118-2009	
19	Конструк	CGC 24.10	кг				SPC	3,0000000	500,00000	1500,0000	ГДС02146	Захвачена	СТД СМК 119-2009	
20	Конструк	CGC 24.10	кг				SPC	5,0000000	100,00000	500,00000	ГДС02247	Захвачена	СТД СМК 119-2009	

Лист1

Готово 100%

Внизу таблицы ресурсной ведомости расположены те пакеты, CGC которых помечен на удаление (рисунок 62).

Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения	CGC Ресурсы на удалении	шт	0.00	0.00	0.00	SPC
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения	CGC Ресурсы на удалении	шт	0.00	0.00	0.00	SPC
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения	CGC Ресурсы на удалении	шт	0.00	0.00	0.00	SPC
Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения	CGC Ресурсы на удалении	шт	0.00	0.00	0.00	SPC

Роли, участвующие в согласовании и утверждении ресурсной ведомости

Статус ресурсной ведомости с «Разрабатывается» на «Выполнена» меняется только следующими ответственными лицами:

- по работам и механизмам – инженером-сметчиком из организации, имеющей аккредитацию от Инвестора;
- по материалам – менеджером по управлению инвестированием в проектирование и согласование проектно-сметной документации.

Пример

Проекты / Жилой дом №2 в 34 мкрн / Расходы по проекту / Земляные работы / Устройство котлована / Устройство котлована /

Карточка единичного ресурса CGC инвестиционного проекта

Название единицы измерения инвестиционного проекта:	м2
Количество единиц измерения инвестиционного проекта по базовому плану:	0.00
Количество единиц измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету:	0.00
Дата актуализации бюджета:	16.12.2011
Наименование пакета работ:	Устройство котлована
Статус по ресурсной ведомости:	Разрабатывается
Дата утверждения ресурсной ведомости:	
Сумма расходов по ресурсной ведомости:	0.00

Ресурсная ведомость в Excel

Наименование пакета работ	Наименование единичного ресурса CGC	Ед. изм.	Кол-во по ресурсной ведомости	Рекомендуемая цена единицы измерения по ресурсной ведомости	Сумма рекомендованных стоимостей по ресурсной ведомости	Источник данных	Кол-во в спецификации по заключенным и обсуждающимся договорам

Проекты / Жилой дом №2 в 34 мкрн / Расходы по проекту / Земляные работы / Устройство котлована / Устройство котлована /

Вид ресурсов	Кем утверждено	Утверждение
Работы и механизмы		☑
Материалы		☑

Если будет проставлена только одна галочка, то статус также и останется «Разрабатывается»

Разработанная ресурсная ведомость утверждается Управляющим ИСП на сайте проекта. Статус ресурсной ведомости на сайте проекта меняется с «Выполнена» на «Утверждена». При необходимости Управляющий ИСП до изменения статуса проводит по системе электронного документооборота согласование по пакету работ с ответственным за выполнение работ из соответствующих единичных ресурсов CGC. Информация о превышения суммы по ресурсной ведомости над суммой по пакету работ направляется автоматически с сайта проекта Инвестору**.**

Рабочее пространство проектировщиков

Для пользователей с определенными правами есть возможность доступа к сайту «Рабочее пространство проектировщиков» по адресу http://investproj.com/dev_build (рисунок 63).

Рабочее пространство проектировщиков

Поиск на этом сайте

Рабочее пространство проектировщика

- Рабочее пространство проектировщика
  - Загрузка из Excel
  - Управление удаленными CGC
  - Копирование данных пакета работ
  - Удаление пакетов работ
- Содержимое сайта

Название пакета	Статус	Сумма
1 очередь многоквартирных жилых домов п Залесье	Утвердить	352 046 914.91
1 очередь одноэтажных блокированных домов в п Женева	Утвердить	151 653 979.32
1 очередь строительства ЦСиАО Чайка	Утвердить	2 955 345.79
1 ПК п Просторы	Утвердить	25 685 513.51
2 очередь многоквартирных жилых домов п Залесье	Утвердить	404 211 135.63

Столбец «Статус», относящийся к корневому элементу проекта, содержит значение «Утвердить» (рисунок 64), которое представлено ссылкой на страницу ресурсной ведомости.

1 очередь многоквартирных жилых домов п Залесье	Утвердить	352 043 930.04
Пожарная сигнализация		543 700.47
Вентиляция и кондиционирование		509 128.59
Работы по устройству наружных сетей водоснабжения	Разрабатывается	312 991.29
Монтаж домофонных систем	Разрабатывается	7 199 757.23

Для пакетов работ верхнего уровня столбец «Статус» заполняется текущим статусом пакета работ (рисунок 65).

1 очередь многоквартирных жилых домов п Залесье	**Утвердить**	**352 043 930.04**
Пожарная сигнализация		543 700.47
Вентиляция и кондиционирование		509 128.59
Работы по устройству наружных сетей водоснабжения	Разрабатывается	312 991.29
Монтаж домофонных систем	Разрабатывается	7 199 757.23
Электромонтажные работы	Разрабатывается	17 981 956.05
Сантехмонтажные работы	Разрабатывается	30 833 044.49
Фасадные работы	Разрабатывается	11 245 164.37
Отделочные работы	Разрабатывается	71 610 902.88
Работы по остеклению балконов, лоджий, витражей	Разрабатывается	16 581 821.30
Монтаж оконных и балконых блоков		15 322 380.14
Кровельные работы	Разрабатывается	29 870 328.95
Работы по устройству несущих конструкций выше отм. 0.000		122 613 928.87
Работы по устройству фундаментов	Разрабатывается	25 685 569.12
Земляные работы	Разрабатывается	1 733 256.29

По щелчку на статус «Утвердить» осуществляется переход на страницу утверждения ресурсной ведомости проекта (рисунок 66).

ИЗМЕНИТЬ ССЫЛКИ

Поиск на этом сайте

Страница утверждения ресурсной ведомости

ИЗМЕНИТЬ ССЫЛКИ

Содержимое сайта

Название пакета	Сумма	Управляющий ИСП	Работы и механизмы	Материалы
1 очередь многоквартирных жилых домов п Залесье	352 043 930.04			
Сбор исходно-разрешительной документации	0.00	☐	☐	☐
Сбор исходно-разрешительной документации	0.00	☐	☐	☐
Разработка эскизного проекта	0.00	☐	☐	☐
Разработка эскизного проекта	0.00	☐	☐	☐

На данной странице представлена таблица, содержащая наименования выбранного пакета работ, начиная с самого верхнего уровня.

Три столбца «Управляющий ИСП», «Работы и механизмы», «Материалы» предназначены для установки галочки об утверждении пакета работ и заполнения информации об ответственных за согласование (рисунок 67).

Название пакета	Сумма	Управляющий ИСП	Работы и механизмы	Материалы
1 очередь многоквартирных жилых домов п Залесье	352 043 930.04			
Сбор исходно-разрешительной документации	0.00	☐	☑ Александр Лысяков	☑ Александр Лысяков

Галочки активны, если пользователь имеет право выполнять согласование.

Если вход выполнен от управляющего ИСП, то он имеет право утверждать только, если выполнены согласования в остальных столбцах – установка галочки «Управляющий ИСП» будет недоступна (рисунок 68).

Название пакета	Сумма	☐ Управляющий ИСП	☐ Работы и механизмы	☐ Материалы
1 очередь многоквартирных жилых домов п Залесье	352 043 930.04			
Сбор исходно-разрешительной документации	0.00	☐	☐	☐

Если ресурсная ведомость уже утверждена управляющим ИСП, остальным отменять утверждение уже нельзя – установка галочек «Работы и механизмы», «Материалы» будет недоступна (рисунок 69).

Название пакета	Сумма	☐ Управляющий ИСП	☐ Работы и механизмы	☐ Материалы
1 очередь многоквартирных жилых домов п Залесье	352 043 930.04			
Сбор исходно-разрешительной документации	0.00	☑ Александр Лысяков	☑ Александр Лысяков	☑ Александр Лысяков

Установка галочки в названии столбца позволит проставить утверждения по всему столбцу (рисунок 70).

Название пакета	Сумма	☐ Управляющий ИСП	☑ Работы и механизмы	☐ Материалы
1 очередь многоквартирных жилых домов п Залесье	352 043 930.04			
Сбор исходно-разрешительной документации	0.00		☑ Александр Лысяков	☐
Сбор исходно-разрешительной документации	0.00	☐	☑ Александр Лысяков	☐
Разработка эскизного проекта	0.00	☐	☑ Александр Лысяков	☐
Разработка эскизного проекта	0.00	☐	☑ Александр Лысяков	☐
Разработка проектной, рабочей документации	0.00	☐	☑ Александр Лысяков	☐
Разработка проектной, рабочей документации	0.00	☐	☑ Александр Лысяков	☐
Проведение экспертизы проектной документации	0.00	☐	☑ Александр Лысяков	☐
Подготовка территории строительства	0.00	☐	☑ Александр Лысяков	☐
Устройство и разборка временных зданий и сооружений	0.00	☐	☑ Александр Лысяков	☐

Загрузка из Excel

После выбора пункта меню «Загрузка из Excel» открывается страница «Загрузка расходов из файла Excel» (рисунок 71).



На данной странице нужно выбрать файл загрузки (рисунок 72).

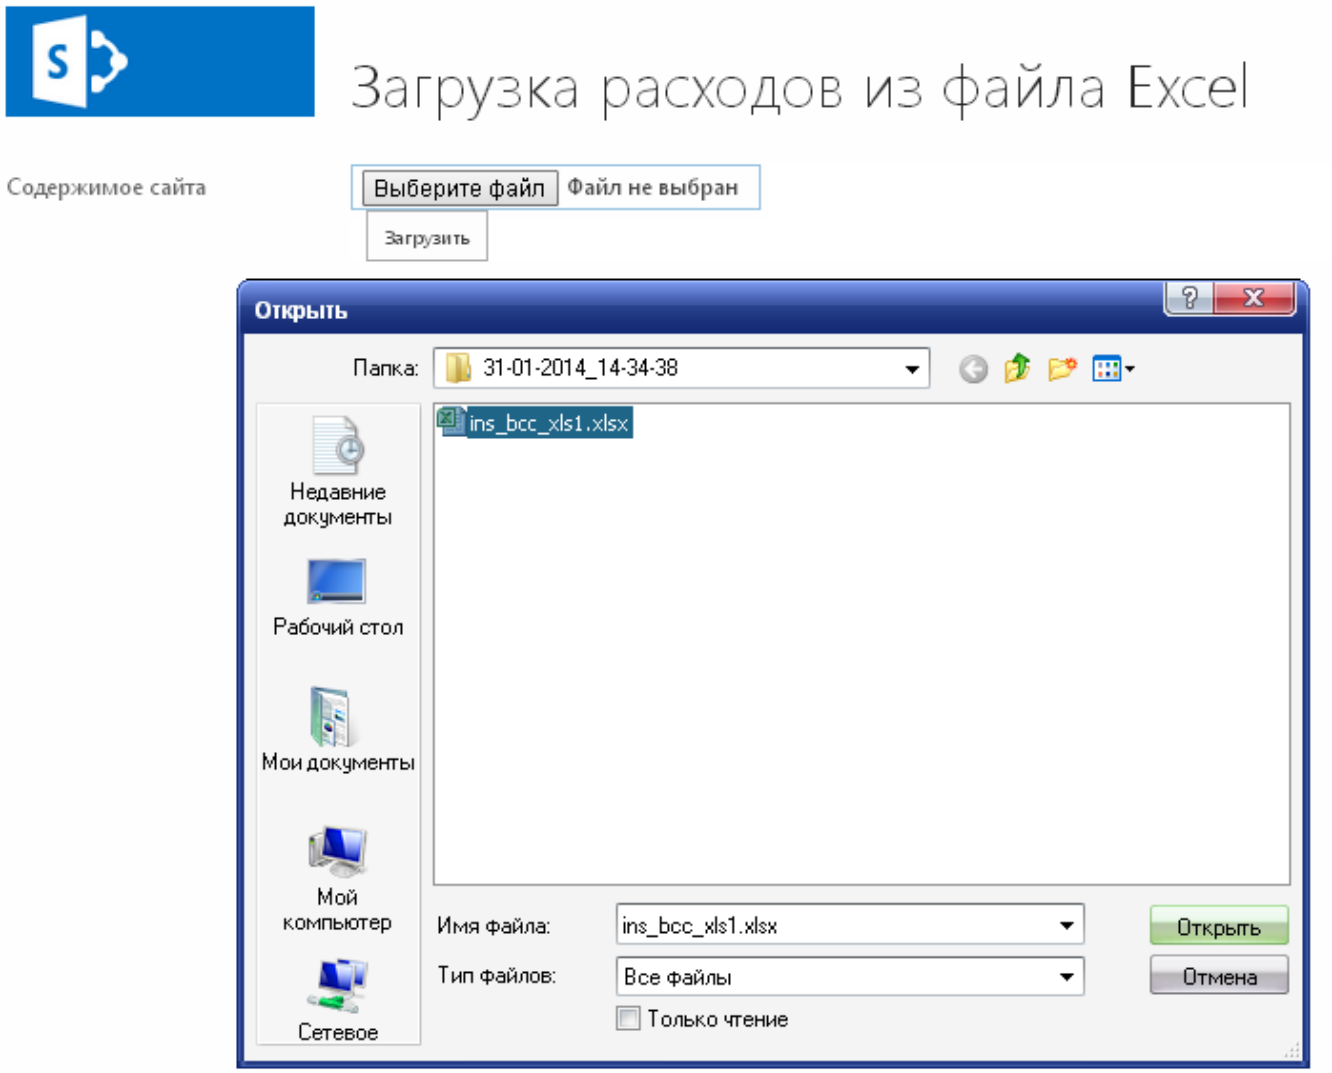

Управление удаленными CGC

Помимо загрузки данных пользователи с определенными правами доступа имеют возможность обновления ссылок удаленных ресурсов на активные ссылки единичных ресурсов.

После выбора пункта меню «Управление удаленными CGC» открывается страница, где выводится список удаленных ресурсов, которые привязаны к проектам (рисунок 73).

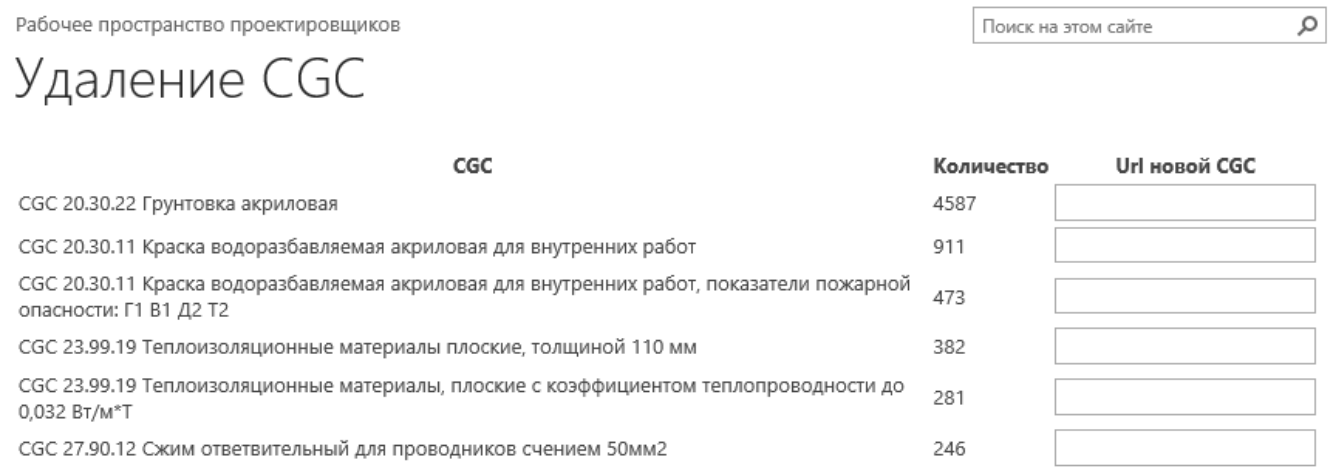

Колонки:

- CGC;
- Количество;
- URL новой CGC.

Для замены удаленного элемента CGC необходимо найти его страницу на веб-портале «Маркетинговые технологии» в каталоге единичных ресурсов и скопировать адрес в буфер обмена (рисунок 74).

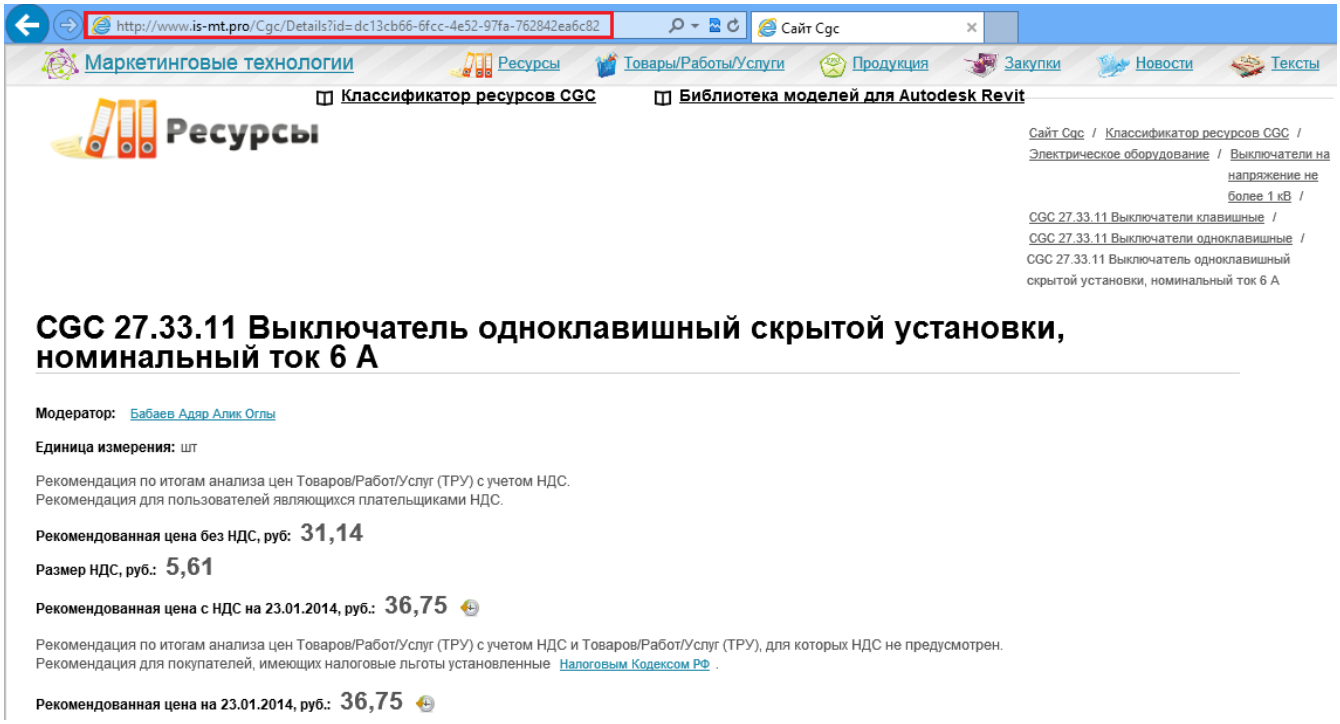

Далее скопированную ссылку на ресурс нужно вставить на сайте в поле «URL новой CGC» (рисунок 75).

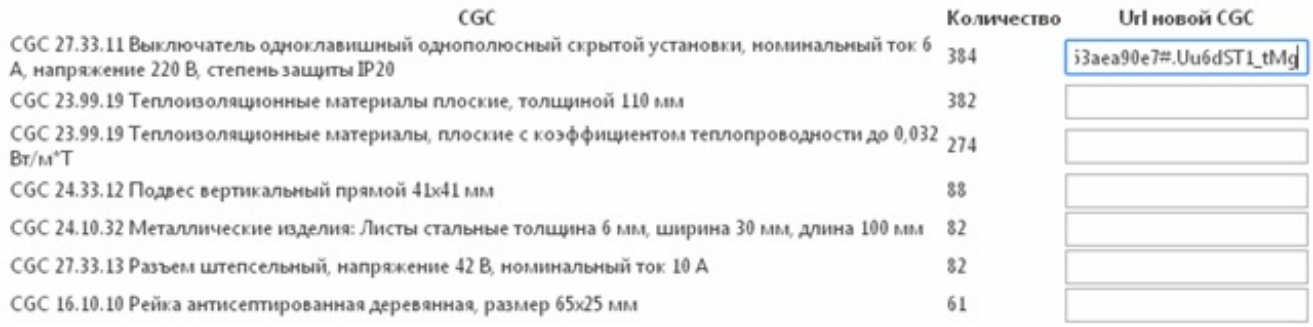

CGC	Количество	Url новой CGC
CGC 27.33.11 Выключатель одноклавишный однополюсный скрытой установки, номинальный ток 6 А, напряжение 220 В, степень защиты IP20	384	i3aea90e7#.Uu6dST1_tMg
CGC 23.99.19 Теплоизоляционные материалы плоские, толщиной 110 мм	382	
CGC 23.99.19 Теплоизоляционные материалы, плоские с коэффициентом теплопроводности до 0,032 Вт/м*Т	274	
CGC 24.33.12 Подвес вертикальный прямой 41x41 мм	88	
CGC 24.10.32 Металлические изделия: Листы стальные толщина 6 мм, ширина 30 мм, длина 100 мм	82	
CGC 27.33.13 Разъем штепсельный, напряжение 42 В, номинальный ток 10 А	82	
CGC 16.10.10 Рейка антисептированная деревянная, размер 65x25 мм	61	

После того, как ссылка добавлена по нажатию клавиши «Tab» (или смещению выделения/редактирования поля ссылки), происходит обновление CGC, удаленный ресурс зачеркивается и появляется надпись «Ok» – это означает, что элемент обновлен (рисунок 76).



CGC	Количество	Url новой CGC
~~CGC 27.33.11 Выключатель одноклавишный однополюсный скрытой установки, номинальный ток 6 А, напряжение 220 В, степень защиты IP20~~	384	fcc-4e52-97fa-762842ea6c82 Ok
CGC 23.99.19 Теплоизоляционные материалы плоские, толщиной 110 мм	382	
CGC 23.99.19 Теплоизоляционные материалы, плоские с коэффициентом теплопроводности до 0,032 Вт/м*Т	274	
CGC 24.33.12 Подвес вертикальный прямой 41x41 мм	88	

Страница «Копирование данных пакета работ» расположена на сайте «Рабочее пространство проектировщика» (рисунок 77).

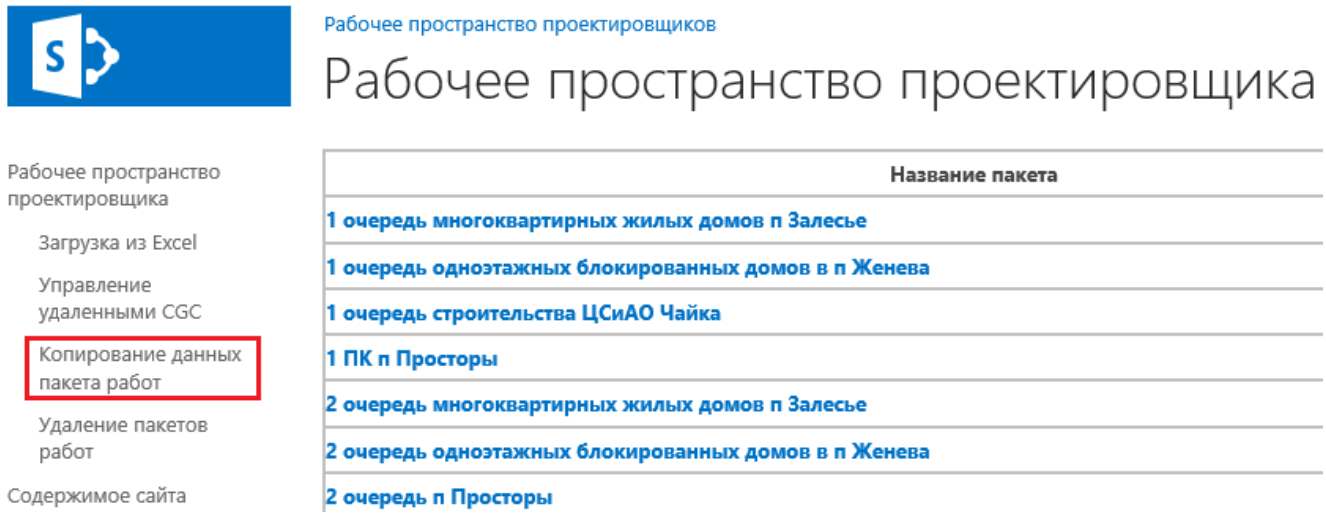

Данная страница позволяет пользователям производить копирование данных между пакетами работ по строительному пакету.

На странице «Копирование данных пакета работ по строительному проекту в другой пакет» через раскрывающиеся списки выбираются источник для копирования и приемник копируемых данных (рисунок 78).



После выбора или изменения элемента из списка сразу же начинается загрузка его содержимого (рисунок 79).

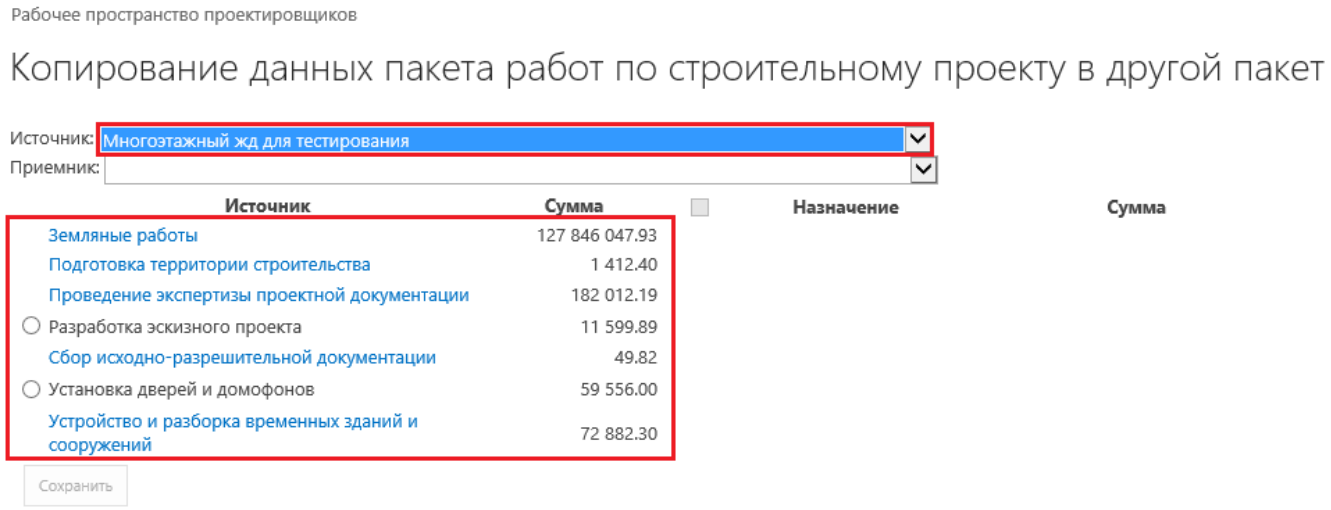

После указания источника, приемника и окончания их загрузки на странице появятся иерархично сгруппированные пакеты работ (рисунок 80).

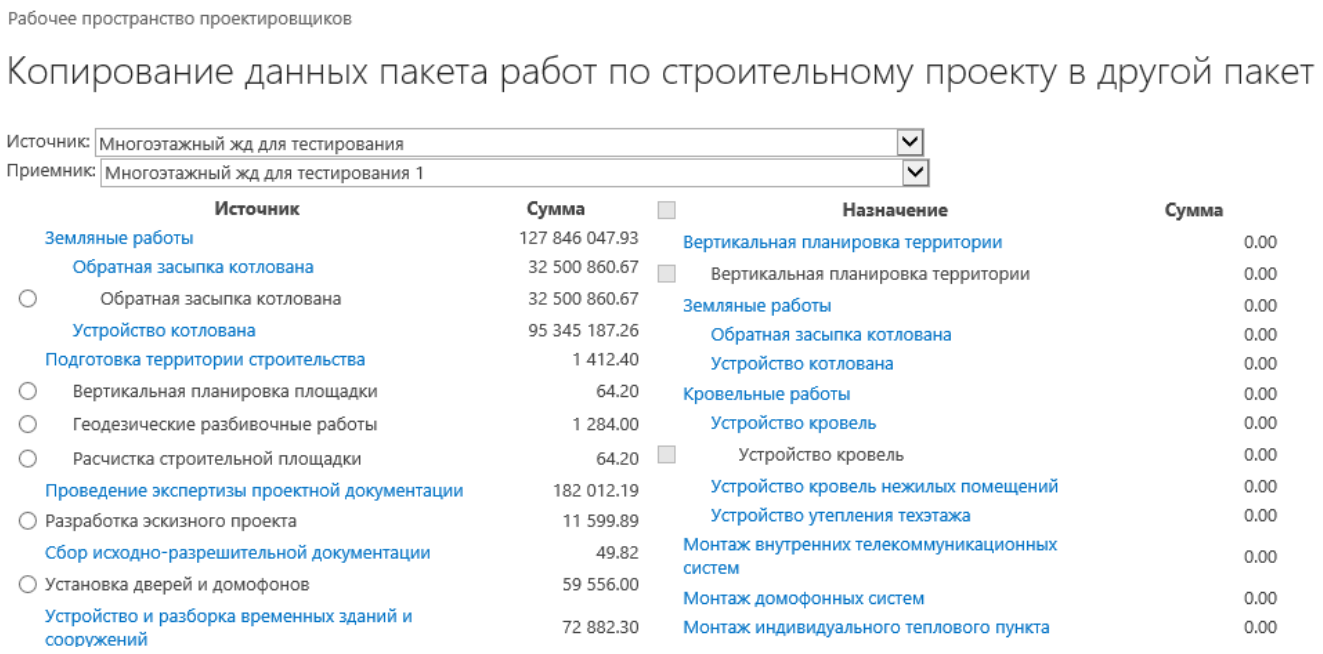

Левая часть отвечает за источник для копирования, интересующие пользователя элементы выбираются нажатием на radio-кнопки (рисунок 81).



Правая часть отвечает за приемники копируемых данных, необходимые элементы пользователь отмечает галочками (рисунок 82).

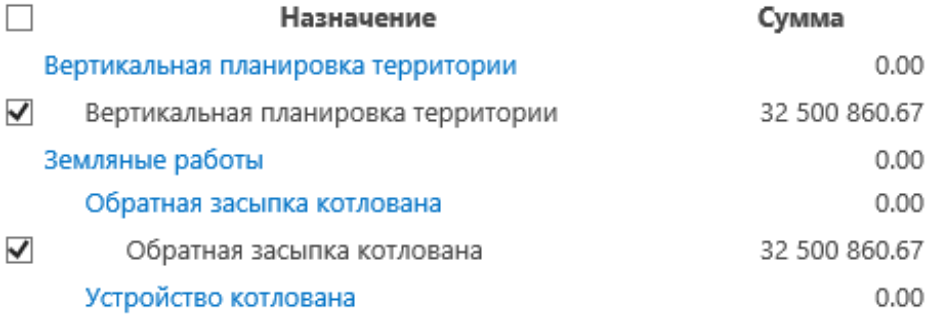

Существует возможность данные выбранного для копирования источника скопировать сразу во все возможные приемники. Для этого следует установить галочку в заголовке (рисунок 83).

Назначение	Сумма
Вертикальная планировка территории	0.00
Вертикальная планировка территории	32 500 860.67
Земляные работы	0.00
Обратная засыпка котлована	0.00
Обратная засыпка котлована	32 500 860.67
Устройство котлована	0.00
Кровельные работы	0.00
Устройство кровель	0.00
Устройство кровель	32 500 860.67
Устройство кровель нежилых помещений	0.00
Устройство кровель нежилых помещений	32 500 860.67
Устройство утепления техэтажа	0.00

При использовании галочки «Выбрать всё» в качестве приемников отмечаются только те пакеты, текущая сумма которых равна нулю (рисунок 84).

Назначение	Сумма
Вертикальная планировка территории	0.00
Вертикальная планировка территории	0.00
Земляные работы	0.00
Обратная засыпка котлована	0.00
Обратная засыпка котлована	0.00

Назначение	Сумма
Вертикальная планировка территории	0.00
Вертикальная планировка территории	32 500 860.67
Земляные работы	0.00
Обратная засыпка котлована	0.00
Обратная засыпка котлована	32 500 860.67

При этом будут выбраны абсолютно все пакеты, независимо от состояния узла (свернут/раскрыт) иерархии, в которой они находятся.

При выборе пакета приемника можно сразу увидеть, какая сумма будет у него после копирования (рисунок 85).

Источник	Сумма
Земляные работы	127 846 047.93
Обратная засыпка котлована	32 500 860.67
Обратная засыпка котлована	32 500 860.67

Назначение	Сумма
Вертикальная планировка территории	0.00
Вертикальная планировка территории	32 500 860.67
Земляные работы	0.00

При смене источника без сохранения предыдущих изменений автоматического сохранения не происходит, то есть внесенные изменения отменяются (рисунки 86 и 87).

Источник: Многоэтажный жд для тестирования
Приемник: Многоэтажный жд для тестирования 1

Источник	Сумма	Назначение	Сумма
Земляные работы	127 846 047.93	Вертикальная планировка территории	0.00
Обратная засыпка котлована	32 500 860.67	Земляные работы	0.00
Обратная засыпка котлована	32 500 860.67	Обратная засыпка котлована	0.00
Устройство котлована	95 345 187.26	Обратная засыпка котлована	32 500 860.67

Источник: Нежилые здания п Залесье
Приемник: Многоэтажный жд для тестирования 1

Источник	Сумма	Назначение	Сумма
Нежилое здание №35: 3-этажное, площадь застройки 1400 кв.м	2 751 985.74	Вертикальная планировка территории	0.00
		Земляные работы	0.00
Нежилое здание №51: 1-этажное, площадь застройки 195 кв.м	1 619 843.40	Обратная засыпка котлована	0.00
		Обратная засыпка котлована	0.00
Нежилое здание №52: 1-этажное, площадь застройки 195 кв.м	314.46	Устройство котлована	0.00

После выбора источника для копирования, пакетов-приемников копируемых данных и нажатия на кнопку «Сохранить» Сохранить внизу таблицы, в случае, если данные были успешно скопированы, перед принимающим пакетом исчезнет галочка для выбора, а на ее месте появится галочка зеленого цвета (рисунок 88).

Назначение	Сумма
Вертикальная планировка территории	0.00
√ Вертикальная планировка территории	32 500 860.67

Теперь при смене источника скопированные данные приемника не изменятся (рисунки 89 и 90).

Источник: Многоэтажный жд для тестирования
Приемник: Многоэтажный жд для тестирования 1

Источник	Сумма	Назначение	Сумма
Земляные работы	127 846 047.93	Вертикальная планировка территории	0.00
Подготовка территории строительства	1 412.40	√ Вертикальная планировка территории	32 500 860.67
Проведение экспертизы проектной документации	182 012.19	Земляные работы	0.00
		Обратная засыпка котлована	0.00

Источник: Нежилые здания п Залесье
Приемник: Многоэтажный жд для тестирования 1

Источник	Сумма	Назначение	Сумма
Нежилое здание №35: 3-этажное, площадь застройки 1400 кв.м	2 751 985.74	Вертикальная планировка территории	0.00
		√ Вертикальная планировка территории	32 500 860.67
Нежилое здание №51: 1-этажное, площадь застройки 195 кв.м	1 610 920.46	Земляные работы	0.00

Удаление пакетов работ

Страница «Удаление пакетов работ» содержит скомпонованную информацию по ресурсной ведомости проекта и предназначена для удаления пакетов работ.

Доступ на удаление имеют право участники группы «Удаление пакетов».

Внешний вид страницы представлен на рисунке 91.

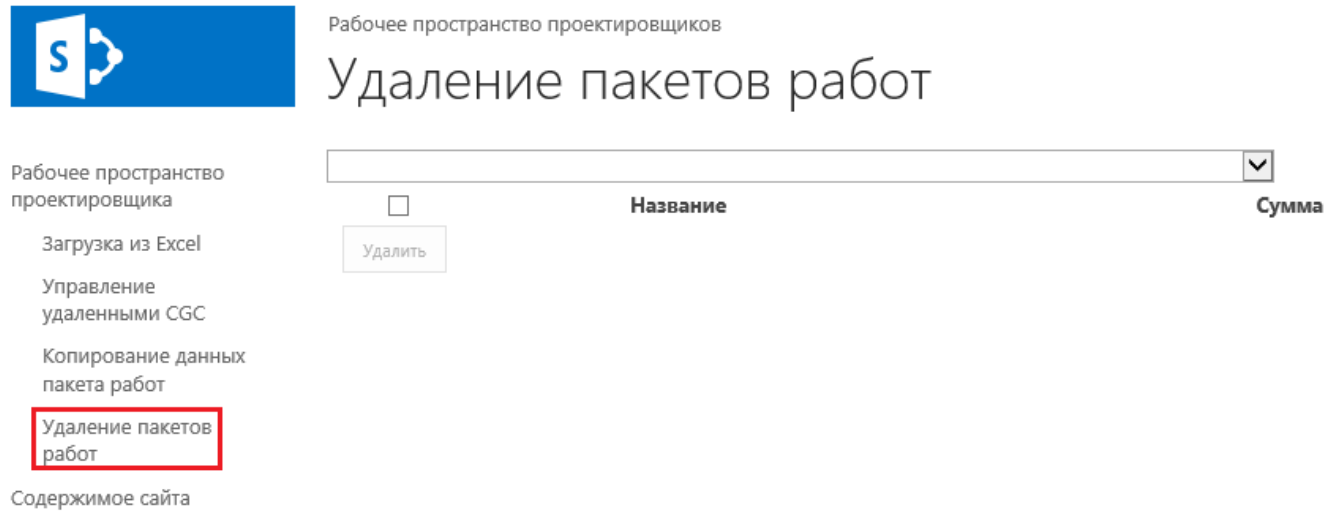

Для начала пользователю необходимо выбрать проект из раскрывающегося списка (рисунок 92).

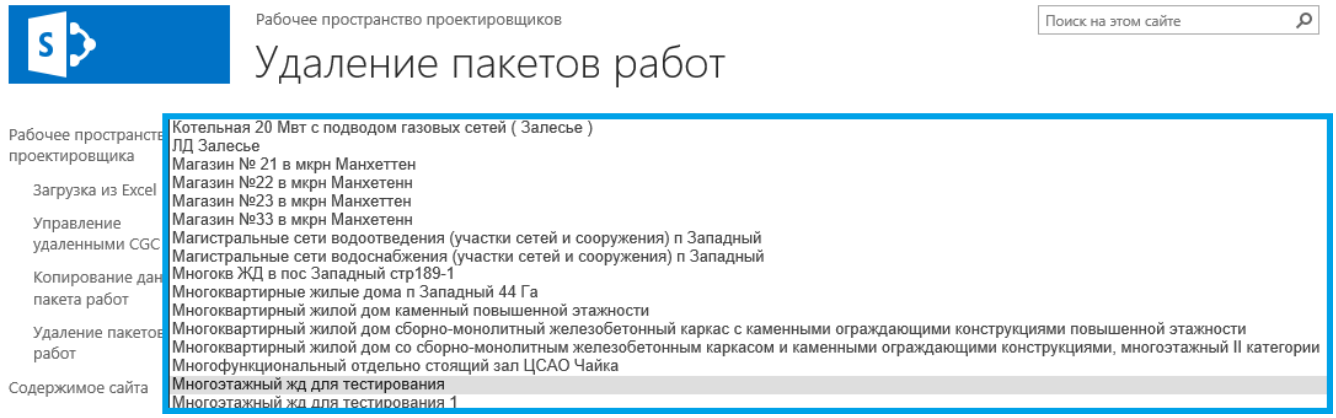

После указания проекта на странице появятся иерархично сгруппированные пакеты работ, где можно выбрать интересующий пользователя пакет (рисунок 93).

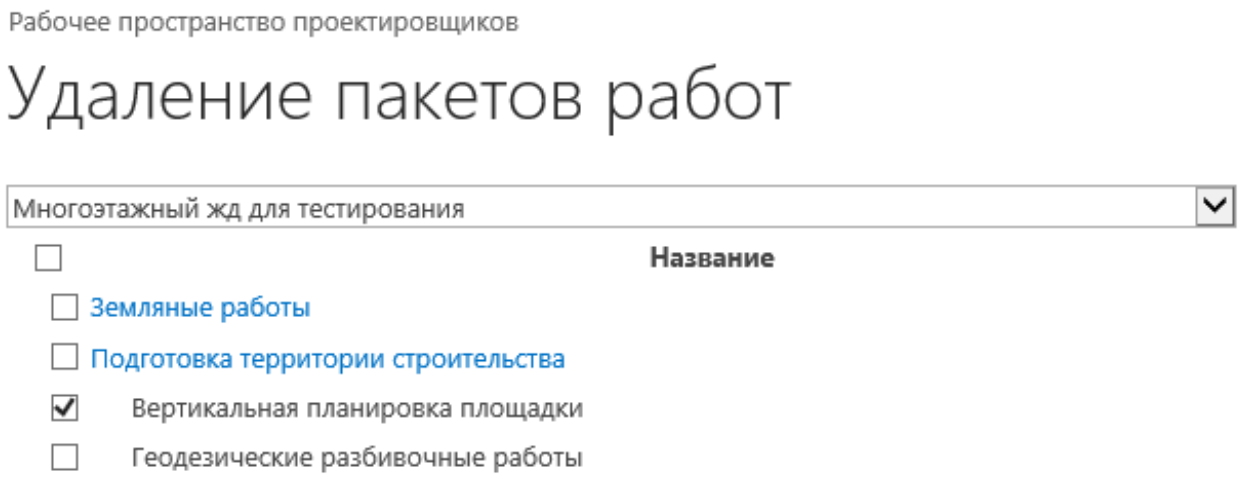

Можно установить галочки для всех пакетов, независимо от состояния узла (свернут/раскрыт) иерархии, в которой они находятся (рисунок 94).

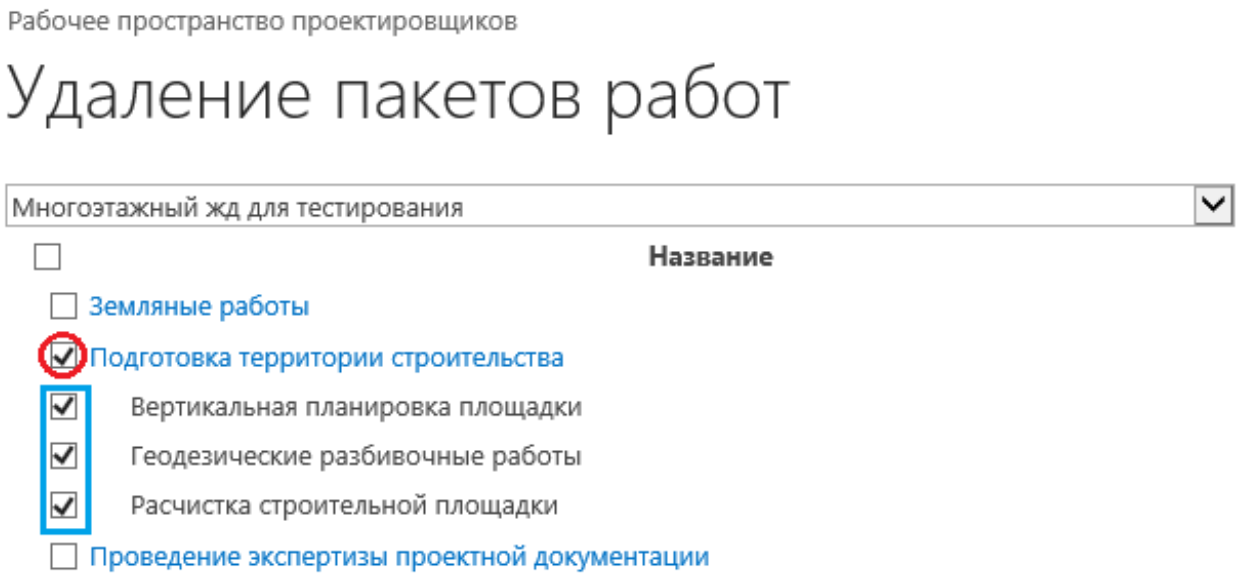

По нажатию на кнопку «Удалить», если у пользователя нет прав на удаление, на странице появится соответствующее сообщение (рисунок 95).

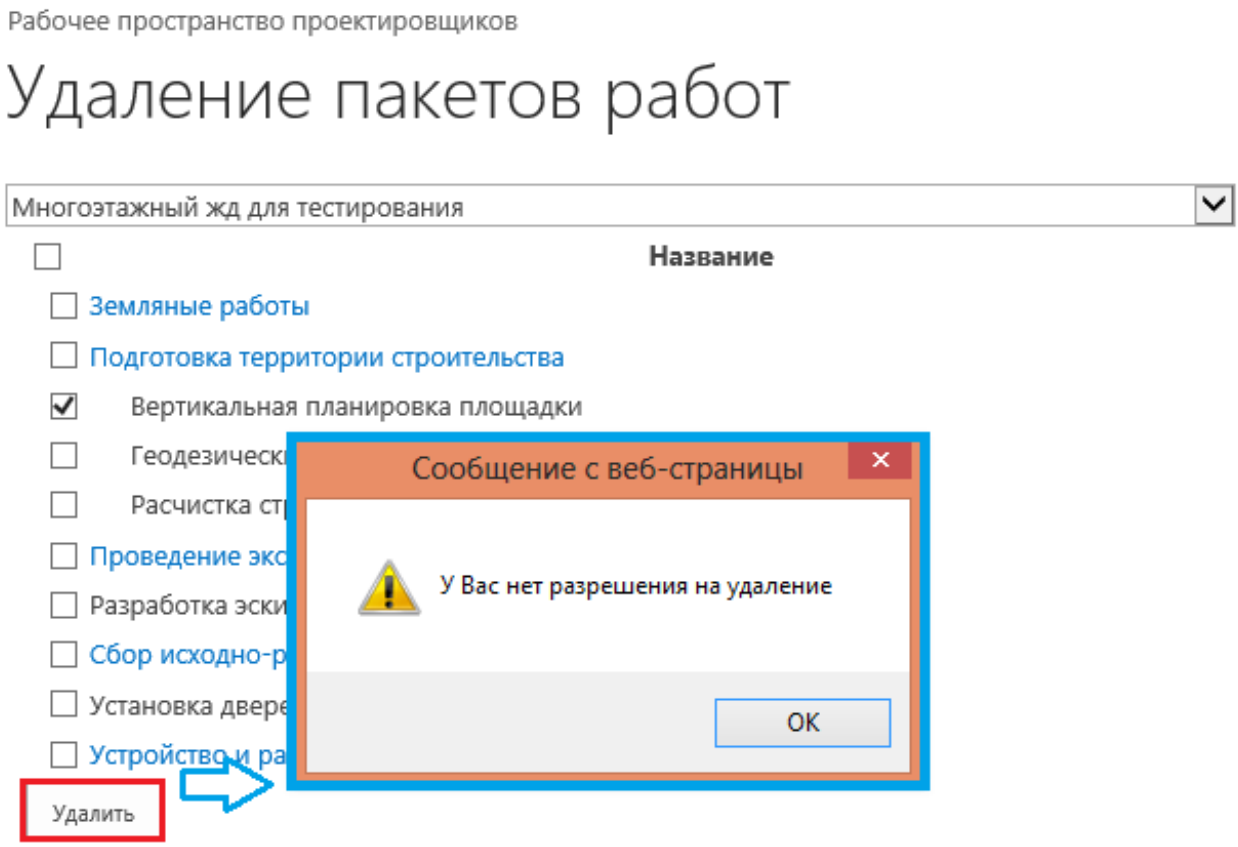

При нажатии на кнопку «Удалить» происходит удаление данных ресурсной ведомости из выбранных пакетов работ и его веток без возможности восстановления (рисунок 96).

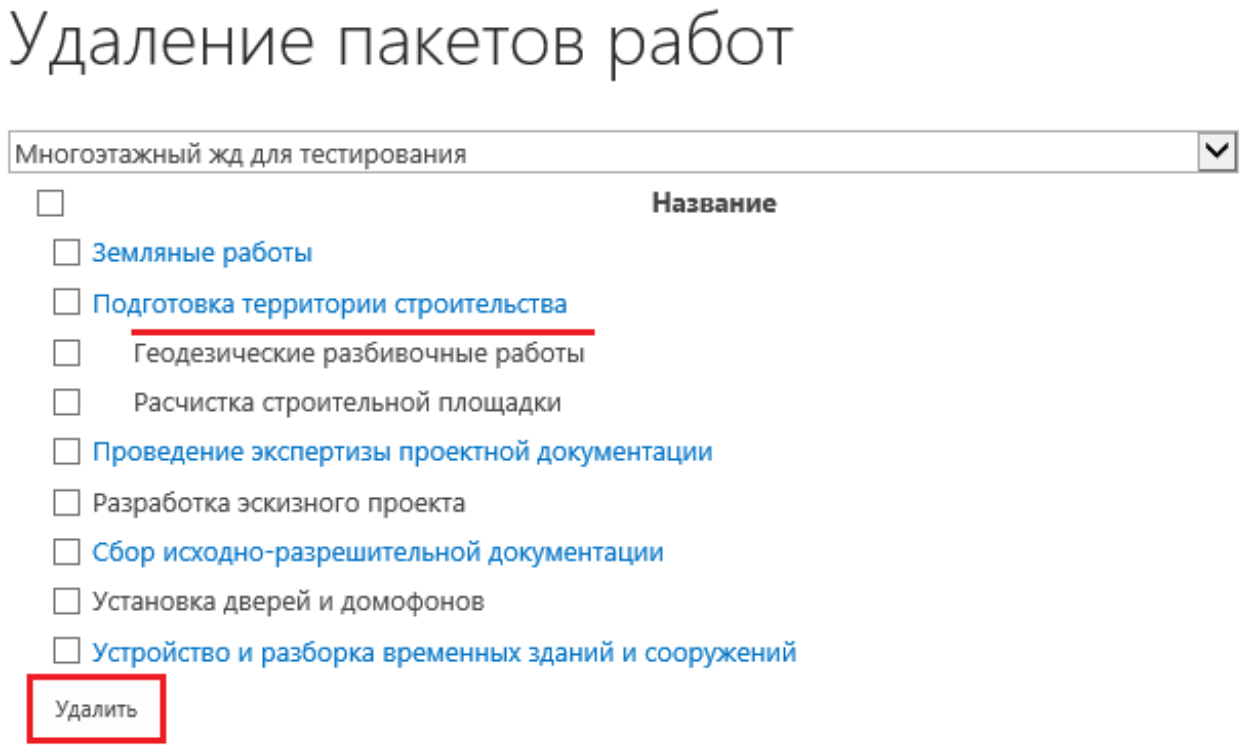

В данном примере был удален пакет работ «Вертикальная планировка площади» (см. предыдущий рисунок).

Денежный поток

Интерфейс страницы «Денежный поток» изображен на рисунке 97.

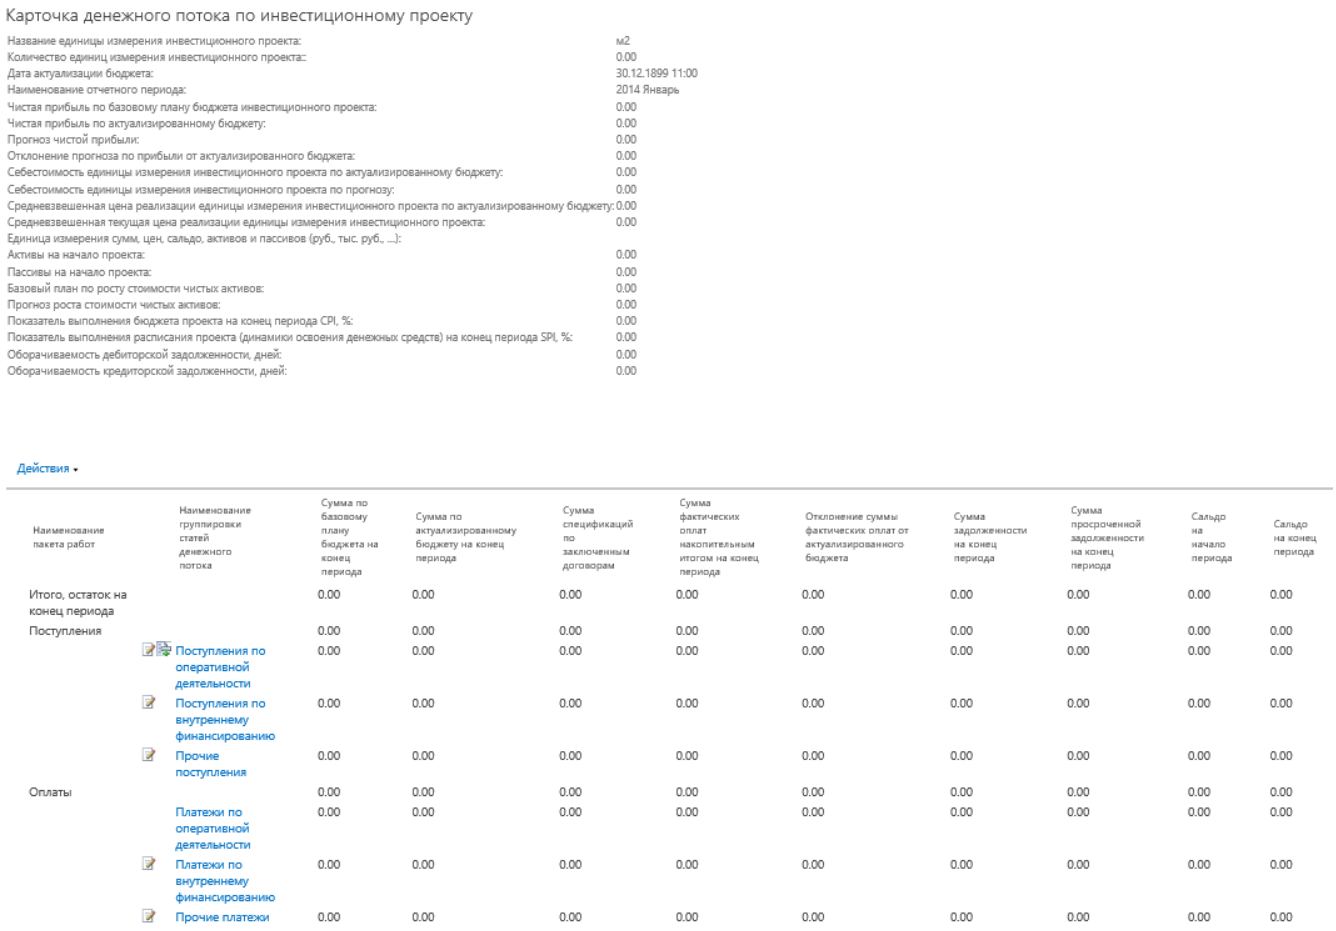

Карточка денежного потока по инвестиционному проекту

Название единицы измерения инвестиционного проекта:	м2
Количество единиц измерения инвестиционного проекта::	0.00
Дата актуализации бюджета:	30.12.1899 11:00
Наименование отчетного периода:	2014 Январь
Чистая прибыль по базовому плану бюджета инвестиционного проекта:	0.00
Чистая прибыль по актуализированному бюджету:	0.00
Прогноз чистой прибыли:	0.00
Отклонение прогноза по прибыли от актуализированного бюджета:	0.00
Себестоимость единицы измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету:	0.00
Себестоимость единицы измерения инвестиционного проекта по прогнозу:	0.00
Средневзвешенная цена реализации единицы измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету:	0.00
Средневзвешенная текущая цена реализации единицы измерения инвестиционного проекта:	0.00
Единица измерения сумм, цен, сальдо, активов и пассивов (руб., тыс. руб., ...):	
Активы на начало проекта:	0.00
Пассивы на начало проекта:	0.00
Базовый план по росту стоимости чистых активов:	0.00
Прогноз роста стоимости чистых активов:	0.00
Показатель выполнения бюджета проекта на конец периода CPI, %:	0.00
Показатель выполнения расписания проекта (динамики освоения денежных средств) на конец периода SPI, %:	0.00
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней:	0.00
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней:	0.00

Действия

Наименование пакета работ	Наименование группировки статей денежного потока	Сумма по базовому плану бюджета на конец периода	Сумма по актуализированному бюджету на конец периода	Сумма спецификаций по заключенным договорам	Сумма фактических оплат накопительным итогом на конец периода	Отклонение суммы фактических оплат от актуализированного бюджета	Сумма задолженности на конец периода	Сумма просроченной задолженности на конец периода	Сальдо на начало периода	Сальдо на конец периода
Итого, остаток на конец периода		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Поступления по оперативной деятельности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Поступления по внутреннему финансированию	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Прочие поступления	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплаты		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Платежи по оперативной деятельности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Платежи по внутреннему финансированию	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Прочие платежи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Сумму по базовому плану бюджета и сумму по актуализированному бюджету

может изменять пользователь с ролью «Планировщик-аналитик».

После выбора наименования пакета работ элементы таблицы становятся доступными для редактирования (рисунок 98).

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Денежный поток / Поступления / Поступления по оперативной деятельности /

Дата	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Сумма по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету	Сумма по актуализированному бюджету
		4230,00		**7720,00**
27.01.2014	20,00	230,00	50,00	320,00
29.01.2014	10,00	4000,00	40,00	7400,00
30.01.2014	170 ✕	500	40	747

Сумма по базовому плану бюджета считается по всем датам и пакетам работ для базового плана (рисунок 99).

Наименование пакета работ	Наименование группировки статей денежного потока	Сумма по базовому плану бюджета на конец периода	Сумма по актуализированному бюджету на конец периода
Итого, остаток на конец периода		6 260.00	8 500.00
Поступления		6 260.00	8 500.00
	Поступления по оперативной деятельности	4 230.00	7 720.00
	Поступления по внутреннему финансированию	0.00	0.00
	Прочие поступления	2 030.00	780.00

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Денежный поток / Поступления / Поступления по оперативной деятельности /

Дата	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Сумма по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету	Сумма по актуализированному бюджету
		4230,00		7720,00
27.01.2014	20,00	230,00	50,00	320,00
29.01.2014	10,00	4000,00	40,00	7400,00
	0	0	0	0

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Денежный поток / Поступления / Прочие поступления /

Дата	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Сумма по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету	Сумма по актуализированному бюджету
		2030,00		780,00
29.01.2014	52,00	2030,00	50,00	780,00
	0	0	0	0

Сумма по актуализированному бюджету вычисляется по всем датам и пакетам работ для актуализированного плана (рисунок 100).

Наименование пакета работ	Наименование группировки статей денежного потока	Сумма по базовому плану бюджета на конец периода	Сумма по актуализированному бюджету на конец периода
Итого, остаток на конец периода		6 260.00	8 500.00
Поступления		6 260.00	8 500.00
	Поступления по оперативной деятельности	4 230.00	7 720.00
	Поступления по внутреннему финансированию	0.00	0.00
	Прочие поступления	2 030.00	780.00

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Денежный поток / Поступления / Поступления по оперативной деятельности /

Дата	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Сумма по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету	Сумма по актуализированному бюджету
		4230,00		7720,00
27.01.2014	20,00	230,00	50,00	320,00
29.01.2014	10,00	4000,00	40,00	7400,00
	0	0	0	0

Проекты / Многоэтажный жд для тестирования / Денежный поток / Поступления / Прочие поступления /

Дата	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Сумма по базовому бюджету реализации инвестиционного проекта	Количество в единицах измерения инвестиционного проекта по актуализированному бюджету	Сумма по актуализированному бюджету
		2030,00		780,00
29.01.2014	52,00	2030,00	50,00	780,00
	0	0	0	0

Рабочая форма менеджера

Рабочая форма менеджера представляет собой веб-страницу, на которой расположена форма отчета с возможностью редактирования определенных полей с учетом прав доступа на уровне ресурсов.

Менеджер может изменять только те строки, где числится ресурсом по данной задаче в MS Project.

Ссылка «Рабочая форма менеджера» размещена на сайте проекта после таблицы «Пакеты работ» (рисунок 101).

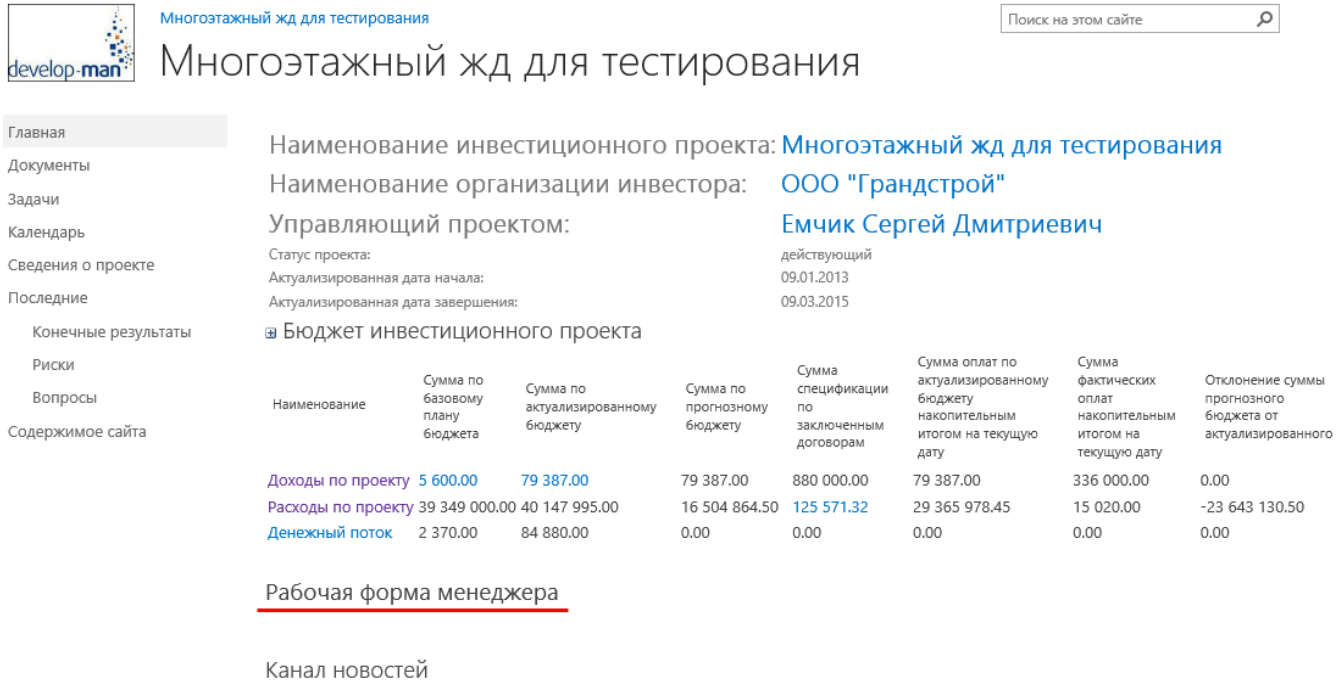

При нажатии на ссылку открывается страница «Рабочая форма менеджера» (рисунок 102).

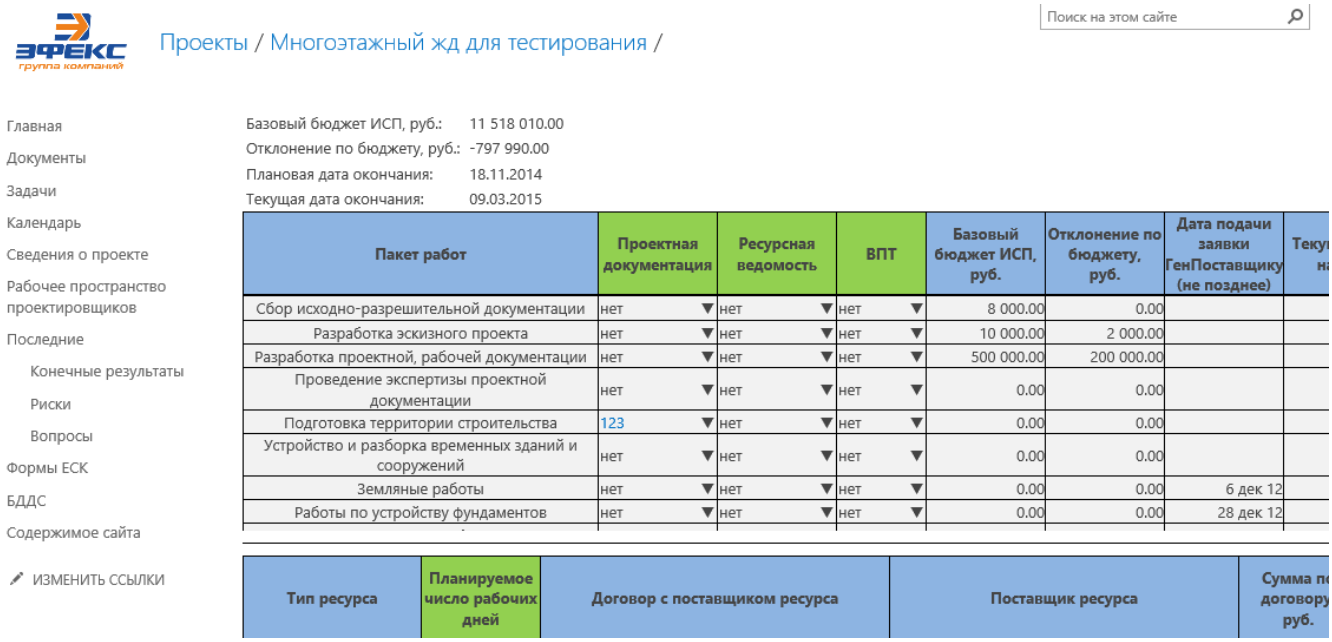

Данная страница состоит из трех основных блоков:

- Основная информация по проекту,
- Таблица с информацией по пакетам работ,
- Таблица с информацией по договорам по определенному пакету работ.

Блок «Основная информация по проекту» содержит следующие поля:

- Базовый бюджет ИСП, руб – число. Поле недоступно для редактирования, заполняется по данным «Сумма по базовому плану» по статье «Расходы» из таблицы «Суммы по проекту» (рисунок 103);

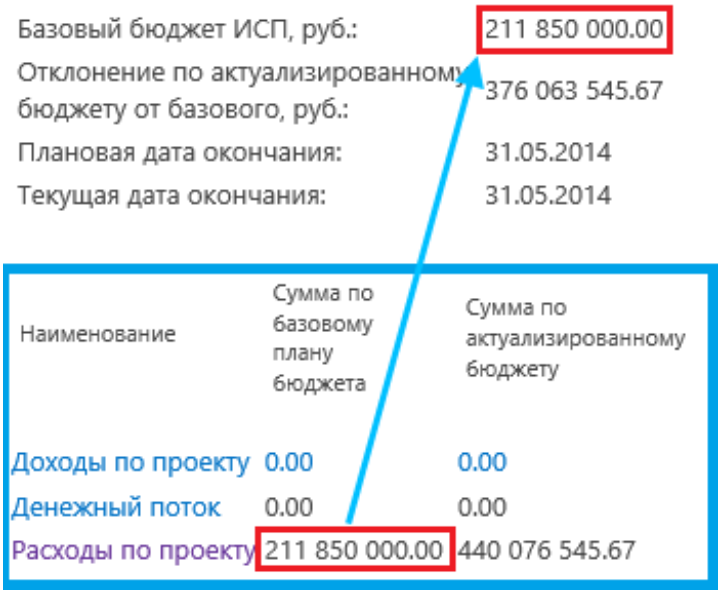

- Отклонение по бюджету, руб – число. Поле недоступно для редактирования, заполняется по данным разницы между «Актуализированный план» и «Базовый план» по статье «Расходы» из таблицы «Суммы по проекту» (рисунок 104);

- Плановая дата окончания – дата. Поле недоступно для редактирования, заполняется по данным «Базовая дата окончания» (рисунок 105);

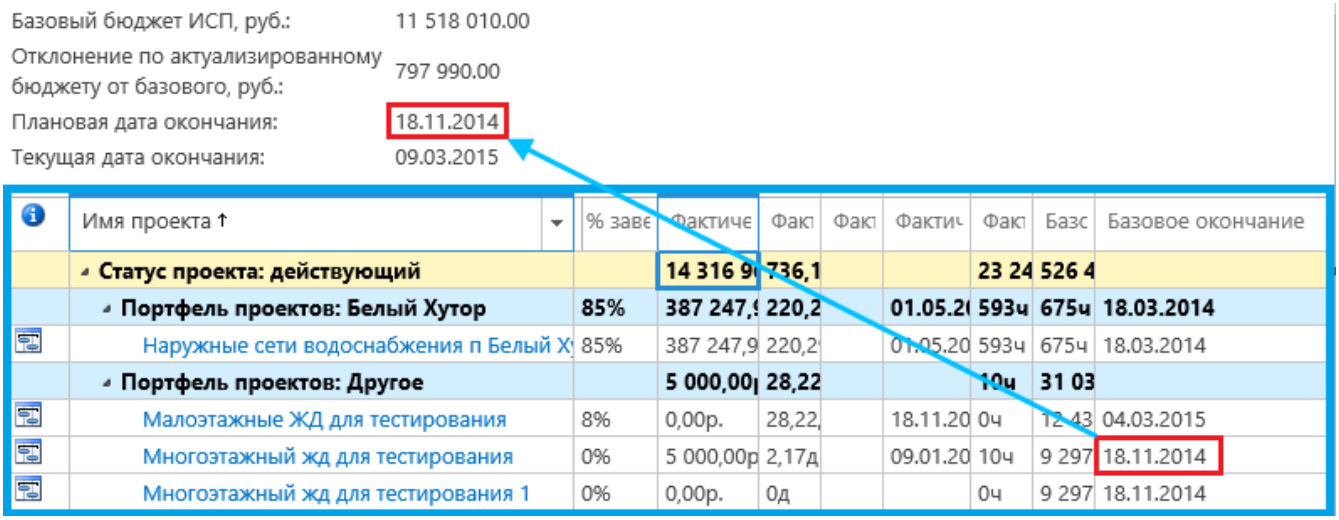

- Текущая дата окончания – дата. Поле недоступно для редактирования, заполняется по данным «Текущая дата окончания» (рисунок 106).

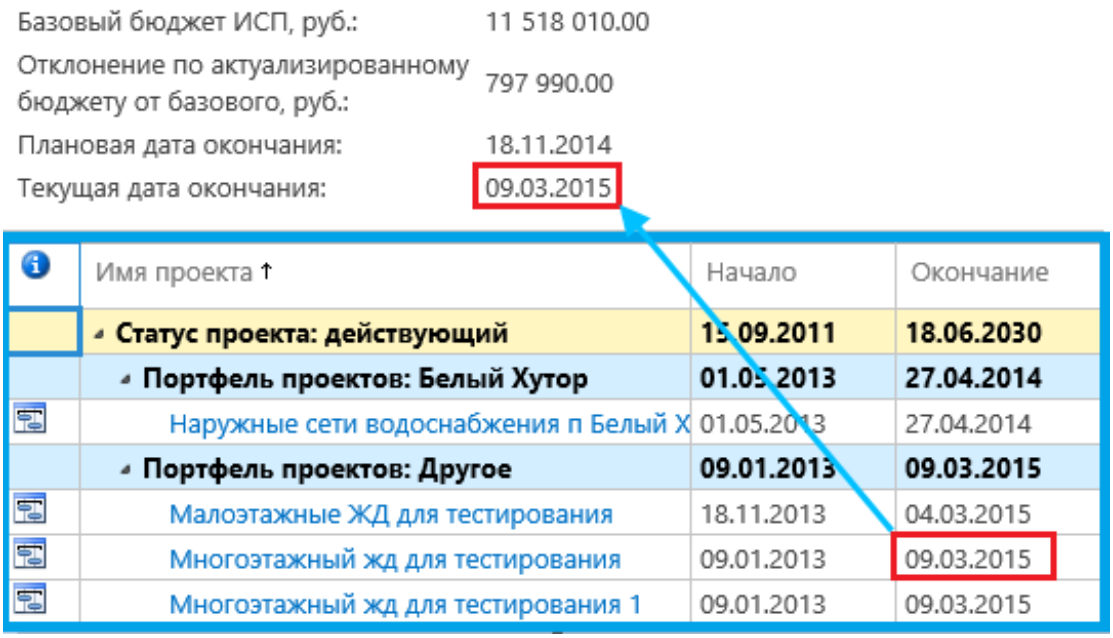

В таблице «Пакеты работ по проекту» выводятся все задачи, где «Вид задачи» равен пакету работ верхнего уровня по данному проекту из таблицы «Задачи по проекту».

Таблица «Пакеты работ по проекту» содержит следующие колонки:

- Пакет работ – поле «Наименование задачи» из таблицы «Задачи по проекту» (рисунок 107);

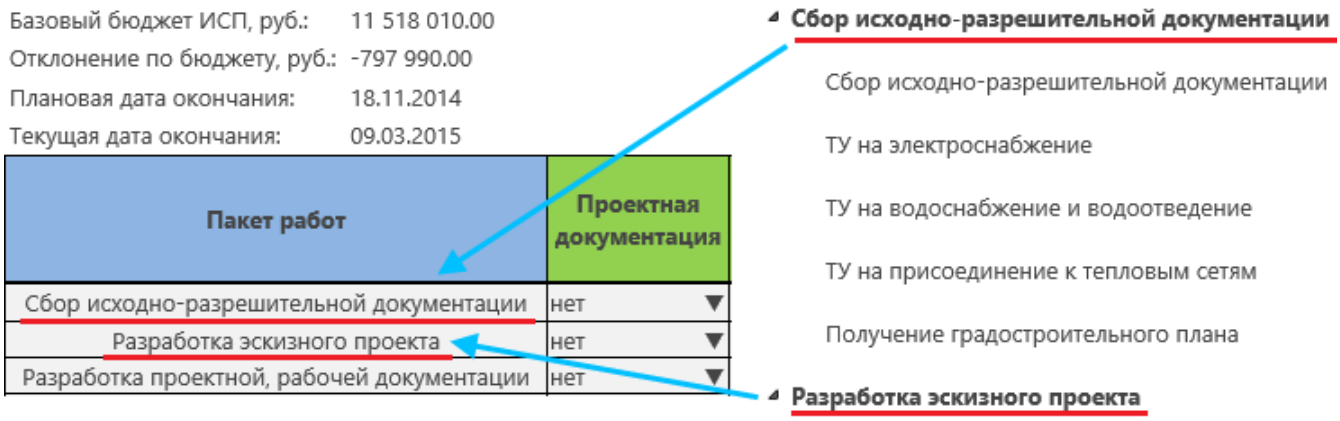

- Проектная документация – поле «Проектная документация» из таблицы «Задачи по проекту», доступно для редактирования (рисунок 108).

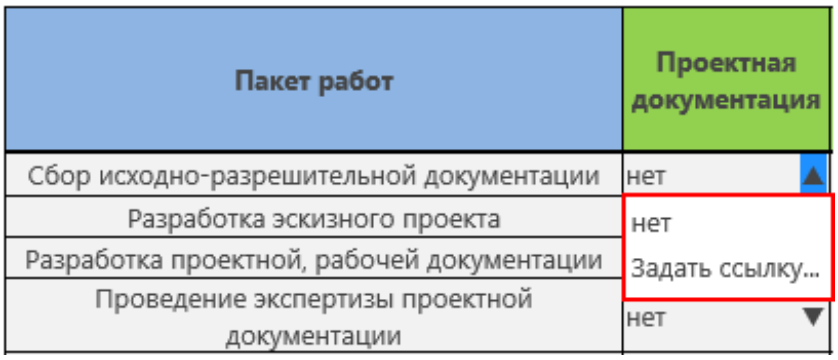

При выборе параметра «Задать ссылку» открывается новое окно для ввода ссылки и замещающего текста (рисунок 109).



После нажатия кнопки «Готово» ссылка отобразится в поле «Проектная документация» (рисунок 110).

Пакет работ	Проектная документация
Сбор исходно-разрешительной документации	сайт проекта

- Ресурсная ведомость – поле «Ресурсная ведомость» из таблицы «Задачи по проекту», доступно для редактирования;
- ВПТ – поле «ВПТ» из таблицы «Задачи по проекту», доступно для редактирования;
- Базовый бюджет ИСП, руб – сумма по базовому плану по статье «Расходы» из таблицы «Суммы по проекту» по данному пакету работ

(рисунок 111).

Пакет работ	Проектная документация	Ресурсная ведомость	ВПТ	Базовый бюджет ИСП, руб.
Сбор исходно-разрешительной документации	сайт проекта	нет	нет	8 000.00
Разработка эскизного проекта	нет	нет	нет	10 000.00

Пакеты работ

1 - 100

Наименование пакета работ		Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по базовому плану бюджета
ИТОГО:		**40 147 995.00**	**39 349 000.00**
Сбор исходно-разрешительной документации		8 000.00	8 000.00
Работы		8 000.00	8 000.00
Материалы		0.00	0.00
Неопределено		0.00	0.00
Разработка эскизного проекта		8 000.00	10 000.00
Работы		8 000.00	10 000.00

- Отклонение по бюджету, руб – разница между параметрами «Сумма по актуализированному плану» и «Сумма по базовому плану» по статье «Расходы» из таблицы «Суммы по проекту» по данному пакету работ (рисунок 112);

Пакет работ	Проектная документация	Ресурсная ведомость	ВПТ	Базовый бюджет ИСП, руб.	Отклонение по актуализирован бюджету от базового, руб.
Работы по устройству фундаментов	нет	нет	нет	0.00	0.00
Кровельные работы	нет	нет	нет	10.00	999 990.00
Отделочные работы	нет	нет	нет	0.00	0.00

Наименование пакета работ		Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по базовому плану бюджета
ИТОГО:		**40 147 995.00**	**39 349 000.00**
Работы по устройству несущих конструкций ниже отм. 0.000		2 000.00	1 000.00
Работы по устройству несущих конструкций выше отм. 0.000		0.00	0.00
Кровельные работы		1 000 000.00	10.00

- Дата подачи заявки ГенПоставщику (не позднее) – если «Тип статьи» – накладные расходы данного пакета работ, то «Базовая дата начала» – 21 (рисунок 113), иначе пустое значение (рисунок 114);

Пакет работ	Проектная документация	Ресурсная ведомость	ВПТ	Базовый бюджет ИСП, руб.	Отклонение по актуализированному бюджету от базового, руб.	Дата подачи заявки ГенПоставщику (не позднее)
Земляные работы	нет	нет	нет	412 000.00	2 540 000.00	26 дек 13

Главная
Документы
Задачи
Календарь
Сведения о проекте

Этот проект можно редактировать только в Project Web App. Изменить проект

Имя задачи: Земляные работы
Дата начала: 16.01.2014 — 21
Кому назначено

Пакет работ	Проектная документация	Ресурсная ведомость	ВПТ	Базовый бюджет ИСП, руб.	Отклонение по актуализированному бюджету от базового, руб.	Дата подачи заявки ГенПоставщику (не позднее)
Сбор исходно-разрешительной документации	нет	нет	нет	0.00	328 000.00	
Разработка эскизного проекта	нет	нет	нет	0.00	0.00	
Разработка проектной, рабочей документации	нет	нет	нет	1 853 000.00	79 000.00	

- Текущая дата начала – поле «Текущая дата начала» из таблицы «Задачи по проекту» (рисунок 115);

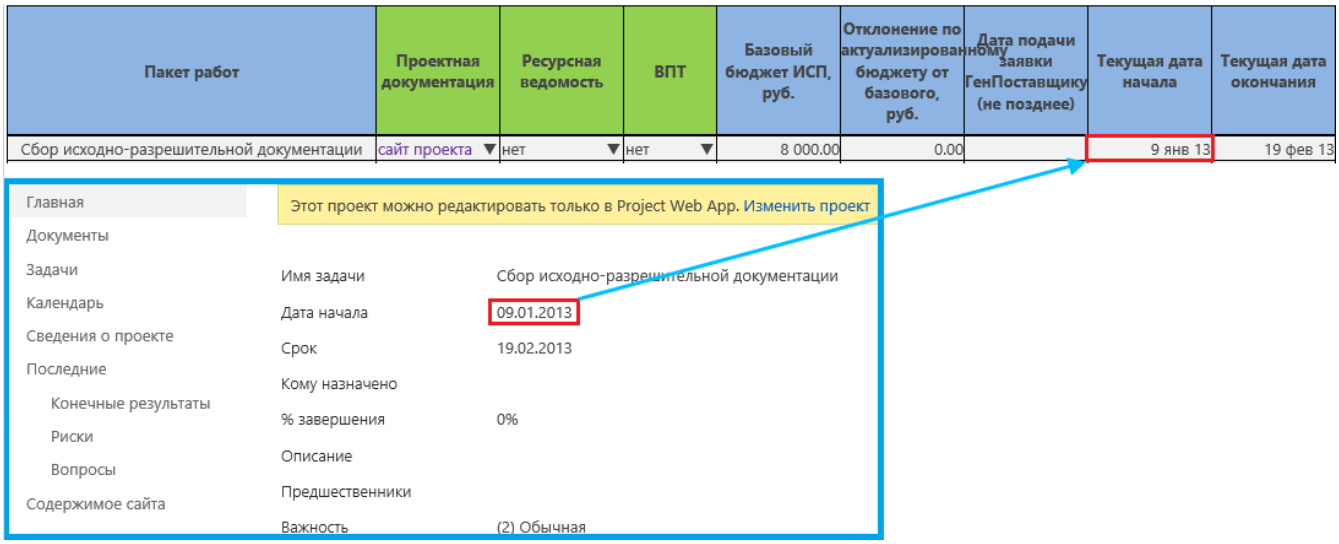

- Текущая дата окончания – поле «Текущая дата окончания» из таблицы «Задачи по проекту» (рисунок 116);

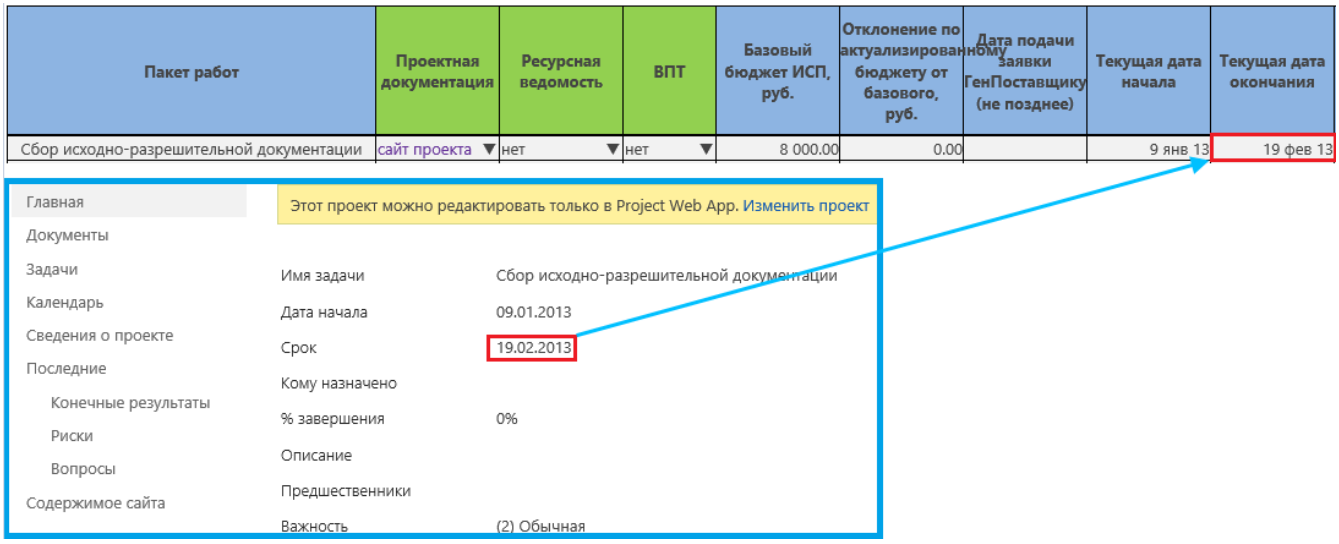

- Отклонение по срокам, дней – разница между параметрами «Текущая дата окончания» и «Плановая дата окончания» из таблицы «Задачи по проекту»;
- Примечание – поле доступно для редактирования (рисунок 117).



В таблице «Договора по типу ресурса в разрезе пакета работ» выводятся все договора по данному пакету работ.

Таблица содержит следующие столбцы:

- Тип ресурса (рисунок 118);

Пакет работ	Проектная документация	Ресурсная ведомость
Сбор исходно-разрешительной документации	нет	нет
Разработка эскизного проекта	нет	нет
Разработка проектной, рабочей документации	нет	нет
Проведение экспертизы проектной документации	нет	нет
Подготовка территории строительства	123	нет
Устройство и разборка временных зданий и сооружений	нет	нет
Земляные работы	нет	нет
Работы по устройству фундаментов	нет	нет

Тип ресурса	Планируемое число рабочих дней	Договор с поставщиком ресурса
Работы	0	НОМЕР ОТ 04.04.2014
	0	НОМЕР ОТ 06.06.2014
	0	НОМЕР ОТ 06.06.2014
	0	НОМЕР ОТ 13.03.2014
	0	номер ОТ 16.06.2014
	0	НОМЕР ОТ 18.03.2014
	0	НОМЕР ОТ 19.03.2014
Материалы		НОМЕР ОТ 11.06.2014
		НОМЕР ОТ 14.04.2014

Пакеты работ

1 - 100

Наименование пакета работ
ИТОГО:
Разработка проектной, рабочей документации
Работы
Материалы
Проведение экспертизы проектной документации

- Планируемое число рабочих дней – поле доступно для редактирования, если тип ресурса «Работы» (рисунок 119);

Тип ресурса	Планируемое число рабочих, чел.	Договор с поставщиком ресурса
Работы	0	ОТ
	0	НОМЕР ОТ 04.04.2014
	10 ✕	НОМЕР ОТ 06.06.2014
	0	НОМЕР ОТ 06.06.2014
	0	НОМЕР ОТ 13.03.2014

- Договор с поставщиком ресурса – ссылка на сайт «Закупки»;
- Поставщик ресурса – ссылка на сайт «Закупки» (рисунок 120);

Тип ресурса	Планируемое число рабочих дней	Договор с поставщиком ресурса	Поставщик ресурса
Работы	0	ОТ	ООО "Учебный подрядчик", для обучения
	0	НОМЕР ОТ 04.04.2014	ООО "Учебный подрядчик", для обучения
	0	НОМЕР ОТ 06.06.2014	ООО "Учебный подрядчик", для обучения
	0	НОМЕР ОТ 06.06.2014	ООО "Учебный подрядчик", для обучения
	0	НОМЕР ОТ 13.03.2014	ООО "Учебный подрядчик", для обучения
	0	номер ОТ 16.06.2014	ООО "Учебный подрядчик", для обучения

◉ Все спецификации ◯ Спецификации по заключенным договорам

Пакет работ	Номер договора	Наименование поставщика	Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации
ИТОГО:					347.00
Разработка проектной, рабочей документации	от	ООО "Учебный подрядчик", для обучения			52.00
			Свободна	ГДС00095 от 13.03.2014	15.00
			Свободна	ГДС00098 от 13.03.2014	10.00
			Свободна	ГДС00099 от 13.03.2014	3.00
			Свободна	ГДС00162 от 08.04.2014	19.00
			Свободна	ГДС00166 от 14.04.2014	5.00
Разработка проектной, рабочей документации	НОМЕР от 04.04.2014	ООО "Учебный подрядчик", для обучения			15.00
			Захвачена	ГДС00163 от 08.04.2014	15.00

- Сумма по договору, руб – сумма по спецификации по договорам по статье «Расходы» (рисунок 121);

Договор с поставщиком ресурса	Поставщик ресурса	Сумма по договору, руб.	Платеж по договору, руб.	Промежуточные отчеты (акты), руб.	Сумма по ПУД общая, руб.	Остаток освоения по договорам, руб.
ОТ	ООО "Учебный подрядчик", для обучения	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
НОМЕР ОТ 04.04.2014	ООО "Учебный подрядчик", для обучения	15.00	0.00	0.00	3.00	12.00
НОМЕР ОТ 06.06.2014	ООО "Учебный подрядчик", для обучения	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

◉ Все спецификации ◯ Спецификации по заключенным договорам

Пакет работ	Номер договора	Наименование поставщика	Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации	Номер первичного учетного документа, отчета, аванса	Сумма по документам	Сумма всех платежей	Отклонение суммы по ПУД от суммы всех платежей
ИТОГО:					347.00		3.00	0.00	
Разработка проектной, рабочей документации	от	ООО "Учебный подрядчик", для обучения			52.00		0.00	0.00	0.00
			Свободна	ГДС00095 от 13.03.2014	15.00		0.00	0.00	0.00
			Свободна	ГДС00098 от 13.03.2014	10.00		0.00	0.00	0.00
			Свободна	ГДС00099 от 13.03.2014	3.00		0.00	0.00	0.00
			Свободна	ГДС00162 от 08.04.2014	19.00		0.00	0.00	0.00
			Свободна	ГДС00166 от 14.04.2014	5.00		0.00	0.00	0.00
Разработка проектной, рабочей документации	НОМЕР от 04.04.2014	ООО "Учебный подрядчик", для обучения			15.00		3.00	0.00	3.00
			Захвачена	ГДС00163 от 08.04.2014	15.00		3.00	0.00	3.00

- Платеж по договору, руб – сумма платежей по авансам, отчетам и первичным учетным документам по статье «Расходы» (рисунок 122);

Устройство и разборка временных зданий и сооружений	нет	нет	нет	1 439 000.00	10 489 000.00		3 фев 14	11

Тип ресурса	Планируемое число рабочих, чел.	Договор с поставщиком ресурса	Поставщик ресурса	Сумма по договору, руб.	Платеж по договору, руб.
Работы	0	96/125-2009/ГП/п.Женева ОТ 01.02.2013	ООО ТПП "УралТехМаш"	0.00	0.00
Машины и механизмы		322/125-2009/ГП/Женева ОТ 01.04.2013	ООО Торговый Дом "УралГидроМаш"	460 370.00	0.00
Неопределено		28/026-2012/ГП ОТ 23.01.2013	ООО "ЭмБиЭм Маркетинг"	0.00	0.00
		322/125-2009/ГП/Женева ОТ 01.04.2013	ООО "Грин Парк"	0.00	0.00
		322/125-2009/ГП/Женева ОТ 01.04.2013	ООО Торговый Дом "УралГидроМаш"	0.00	300 000.00

Наименование пакета работ		Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по базовому плану бюджета	Сумма по прогнозному бюджету	Сумма по ресурсной ведомости	Сумма по заключенным договорам	Сумма платежей по авансам, отчетам и первичным учетным документам
ИТОГО:		574 620 000.00	579 010 000.00	595 342 197.77	0.00	148 720 103.49	49 650 442.63
Подготовка территории строительства		0.00	351 000.00	87 040.00	0.00	87 040.00	0.00
Устройство и разборка временных зданий и сооружений		11 928 000.00	1 439 000.00	11 928 000.00	0.00	460 370.00	300 000.00

- Промежуточные отчеты (акты), руб – сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня по статье «Расходы» (рисунок 123);

Разработка проектной, рабочей документации	нет	нет	нет	2 065 000.00	-15 000.00		18 дек 13	2 апр 14
Проведение экспертизы проектной документации	нет	нет	нет	0.00	0.00		1 янв 14	14 авг 14
Подготовка территории строительства	нет	нет	нет	351 000.00	-351 000.00		14 фев 14	2 мар 14
Устройство и разборка временных зданий и сооружений	нет	нет	нет	1 439 000.00	10 489 000.00		3 фев 14	11 янв 15

Тип ресурса	Планируемое число рабочих, чел.	Договор с поставщиком ресурса	Поставщик ресурса	Сумма по договору, руб.	Платеж по договору, руб.	Промежуточные отчеты (акты), руб.
	0	739/018-2013/ГП ОТ 01.10.2013	ЗАО Проектное бюро "Призма"	599 940.00	0.00	0.00
	0	860/018-2013/ГП ОТ 21.10.2013	ЗАО Проектное бюро "Призма"	1 174 512.40	0.00	0.00
	0	890/017-2013/ГП ОТ 28.10.2013	ООО "ТехПроект"	786 402.40	0.00	673 699.00

Наименование пакета работ		Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по базовому плану бюджета	Сумма по прогнозному бюджету	Сумма по ресурсной ведомости	Сумма по заключенным договорам	Сумма по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня
ИТОГО:		574 620 000.00	579 010 000.00	595 342 197.77	0.00	148 720 103.49	12 642 580.40
Разработка проектной, рабочей документации		2 050 000.00	2 065 000.00	5 704 390.53	0.00	8 131 867.86	673 699.00

- Сумма по ПУД общая, руб – сумма по первичным учетным документам по статье «Расходы» (рисунок 124);

Договор с поставщиком ресурса	Поставщик ресурса	Сумма по договору, руб.	Платеж по договору, руб.	Промежуточные отчеты (акты), руб.	Сумма по ПУД общая, руб.	Остаток освоения по договорам, руб.
ОТ	ООО "Учебный подрядчик", для обучения	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
НОМЕР ОТ 04.04.2014	ООО "Учебный подрядчик", для обучения	15.00	0.00	0.00	3.00	12.00
НОМЕР ОТ 06.06.2014	ООО "Учебный подрядчик", для обучения	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

◉ Все спецификации ◯ Спецификации по заключенным договорам

Пакет работ	Номер договора	Наименование поставщика	Статус спецификации	Номер спецификации	Сумма по спецификации	Номер первичного учетного документа, отчета, аванса	Сумма по документам	Сумма всех платежей	Отклонение суммы по ПУД от суммы всех платежей
ИТОГО:					347.00		3.00	0.00	
Разработка проектной, рабочей документации	от	ООО "Учебный подрядчик", для обучения			52.00		0.00	0.00	0.00
			Свободна	ГДС00095 от 13.03.2014	15.00		0.00	0.00	0.00
			Свободна	ГДС00098 от 13.03.2014	10.00		0.00	0.00	0.00
			Свободна	ГДС00099 от 13.03.2014	3.00		0.00	0.00	0.00
			Свободна	ГДС00162 от 08.04.2014	19.00		0.00	0.00	0.00
			Свободна	ГДС00166 от 14.04.2014	5.00		0.00	0.00	0.00
Разработка проектной, рабочей документации	НОМЕР от 04.04.2014	ООО "Учебный подрядчик", для обучения			15.00		3.00	0.00	3.00
			Захвачена	ГДС00163 от 08.04.2014	15.00		3.00	0.00	3.00

- Остаток освоения по договорам, руб = «Сумма по договору, руб» – «Сумма по ПУД общая, руб.» – «Промежуточные отчеты (акты), руб.» (рисунок 125).

Поставщик ресурса	Сумма по договору, руб.	Платеж по договору, руб.	Промежуточные отчеты (акты), руб.	Сумма по ПУД общая, руб.	Остаток освоения по договорам, руб.
ООО "Учебный подрядчик", для обучения	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
ООО "Учебный подрядчик", для обучения	15.00	0.00	0.00	3.00	12.00
ООО "Учебный подрядчик", для обучения	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Отчет по ресурсной ведомости

Отчет по ресурсной ведомости находится по следующему адресу: http://mps13/powerpivotcollection/Forms/Gallery.aspx (рисунок 126).

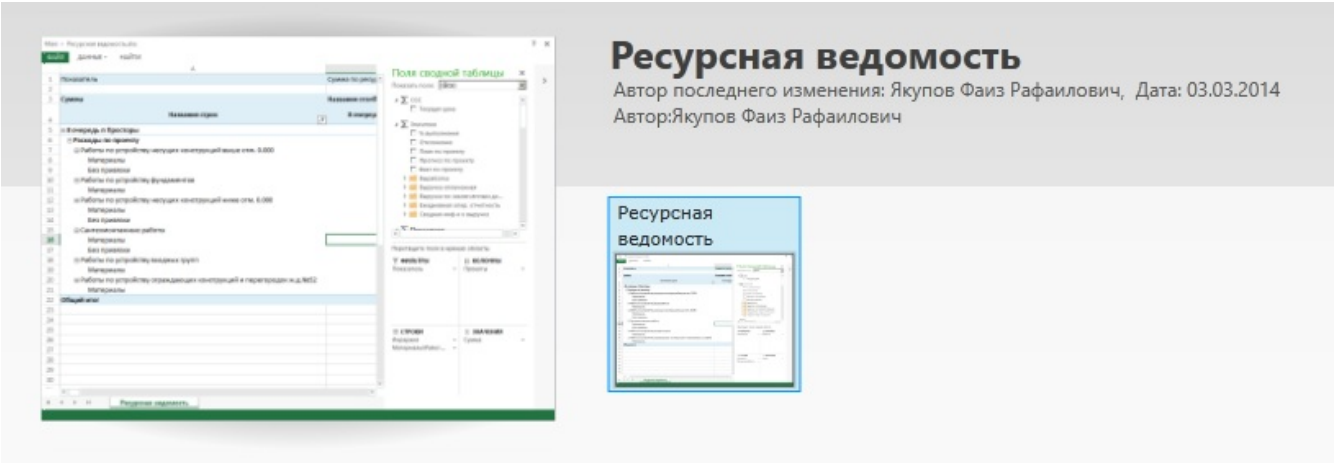

Внешний вид отчета показан на рисунке 127.

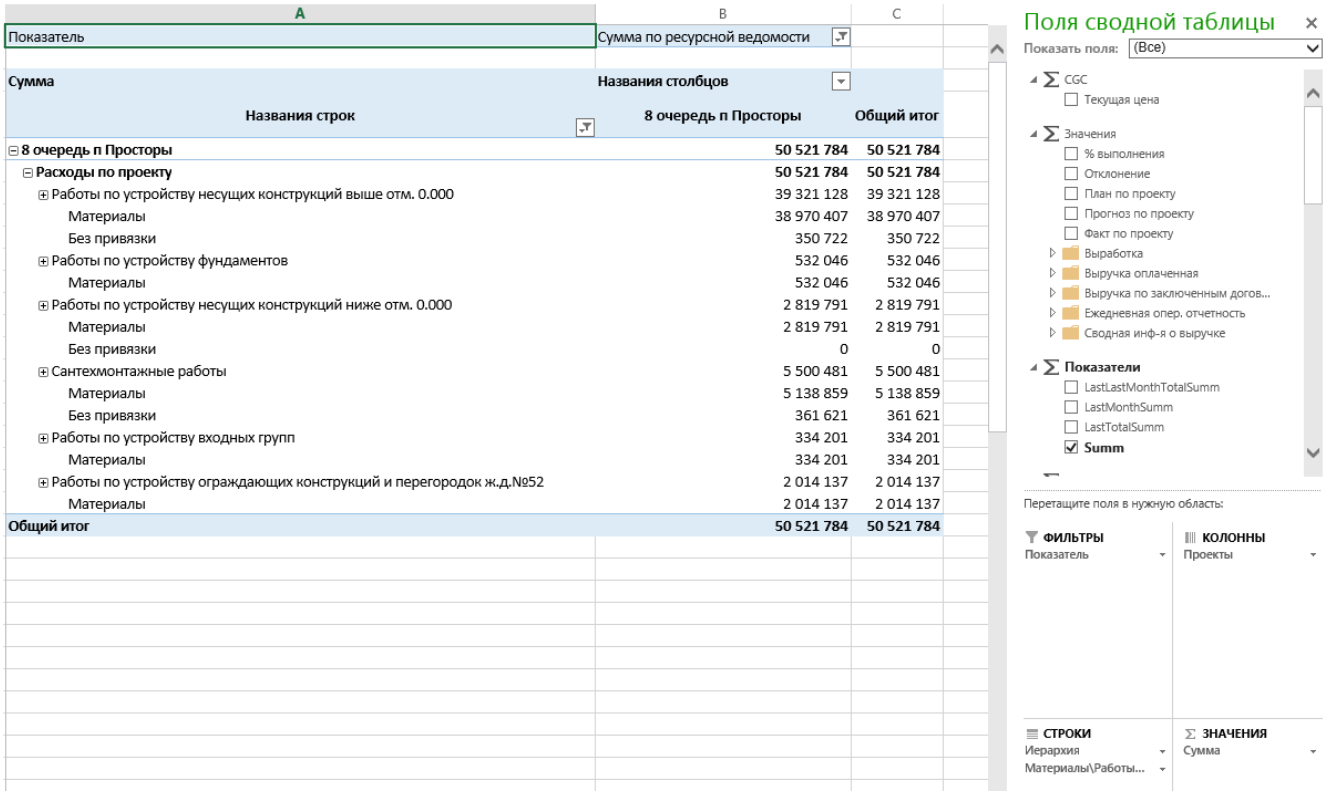

Показатель	Сумма по ресурсной ведомости	
Сумма	Названия столбцов	
Названия строк	8 очередь п Просторы	Общий итог
8 очередь п Просторы	50 521 784	50 521 784
Расходы по проекту	50 521 784	50 521 784
Работы по устройству несущих конструкций выше отм. 0.000	39 321 128	39 321 128
Материалы	38 970 407	38 970 407
Без привязки	350 722	350 722
Работы по устройству фундаментов	532 046	532 046
Материалы	532 046	532 046
Работы по устройству несущих конструкций ниже отм. 0.000	2 819 791	2 819 791
Материалы	2 819 791	2 819 791
Без привязки	0	0
Сантехмонтажные работы	5 500 481	5 500 481
Материалы	5 138 859	5 138 859
Без привязки	361 621	361 621
Работы по устройству входных групп	334 201	334 201
Материалы	334 201	334 201
Работы по устройству ограждающих конструкций и перегородок ж.д.№52	2 014 137	2 014 137
Материалы	2 014 137	2 014 137
Общий итог	50 521 784	50 521 784

Иерархия пакетов работ в разрезе проекта имеет следующий вид (рисунок 128):

- Пакет работ верхнего уровня 1

    - Работа 1
    - Работа 2
    - ...
- Пакет работ верхнего уровня 2
    - Работа 1
    - Работа 2
    - ...
- Пакет работ верхнего уровня N
    - Работа 1
    - Работа 2
    - ...

Сумма	Названия столбцов	
Названия строк	8 очередь п Просторы	Общий итог
8 очередь п Просторы	**52 905 125**	**52 905 125**
Расходы по проекту	**52 905 125**	**52 905 125**
Работы по устройству несущих конструкций ниже отм. 0.000	3 104 968	3 104 968
Работы по устройству несущих конструкций ниже отм. 0.000	**3 104 968**	**3 104 968**
Работы по устройству несущих конструкций ниже отм.0.000 ж.д.№52	3 104 968	3 104 968
	3 104 968	**3 104 968**
	3 104 968	3 104 968
	3 104 968	**3 104 968**
	3 104 968	3 104 968
Материалы	3 104 968	3 104 968
Без привязки	0	0

Помимо пакетов работ верхнего уровня и непосредственно самих работ в иерархию включена строка «Материалы/Работы/Механизмы» (рисунок 129).



По умолчанию показателем отчета установлена сумма по ресурсной ведомости (рисунок 130).

Показатель	Сумма по ресурсной ведомости

Иерархия данного отчета может не совпадать с иерархией на сайте http://investproj.com, так как в отчет попадают данные только по суммам, не равным нулю (рисунок 131).

Наименование инвестиционного проекта: 8 очередь п Просторы
Наименование организации инвестора: ООО "Грин Парк"
Управляющий проектом: ИП Неведров Александр Геннадьевич
Статус проекта:
Дата начала: 01.12.2012
Дата завершения: 31.07.2014

Карточка пакета работ по расходам бюджета инвестиционного проекта

Пакеты работ

Действия

Наименование пакета работ		Сумма по актуализированному бюджету	Сумма по базовому плану бюджета	Сумма по прогнозному бюджету	Сумма по ресурсной ведомости	Сумма по заключенным договорам	Сумма по заключенным и обсуждающимся договорам
ВСЕГО:		**385 557 006.00**	**385 557 006.00**	**0.00**	**52 905 125.41**	**178 955 776.12**	**190 031 314.08**
Сбор исходно-разрешительной документации		276 000.00	276 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы		69 000.00	69 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Материалы		165 600.00	165 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Машины и механизмы		41 400.00	41 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

На странице отчета в иерархии можно изменять данные (рисунок 132).

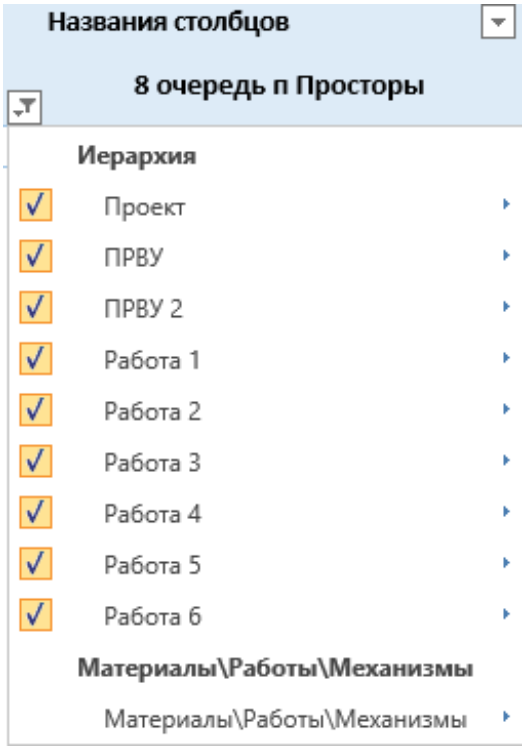

Форма отчета представлена на рисунке 133.

			Проект 1	Проект 2	...	Проект N
Пакет работ верхнего уровня 1			**Сумма**			
	Работа 1					
		Материалы				
		Работы				
		Механизмы				
Пакет работ верхнего уровня 2						
	Работа 1					
		Материалы				
		Работы				
		Механизмы				
	Работа 2					
		Материалы				
		Работы				
		Механизмы				
Пакет работ верхнего уровня N						
	Работа 1					
		Материалы				
		Работы				
		Механизмы				
	Работа 2					
		Материалы				
		Работы				
		Механизмы				

На сайте MSP создан проект «Классификатор пакетов работ верхнего уровня» (Классификатор ПРВУ), который идентичен СТО УП «Классификатор пакетов работ верхнего уровня» на сайте dokipedia.ru и внутри которого находится список всех пакетов работ верхнего уровня.

При изменении классификатора ПРВУ на сайте dokipedia.ru «Классификатор ПРВУ» в MSP будет также изменен в соответствии СТО.

Данный «Классификатор ПРВУ» при синхронизации используется как стандарт ПРВУ, где далее производится поиск и отмечаются все совпадения ПРВУ в проектах.

Задачи

Раздел «Задачи» представляет собой рабочую область сотрудника по заполнению фактических трудозатрат, назначенных на него задач. При открытии страницы таблица по умолчанию формируется по текущему пользователю, который прошел стадию аутентификации (рисунок 134).

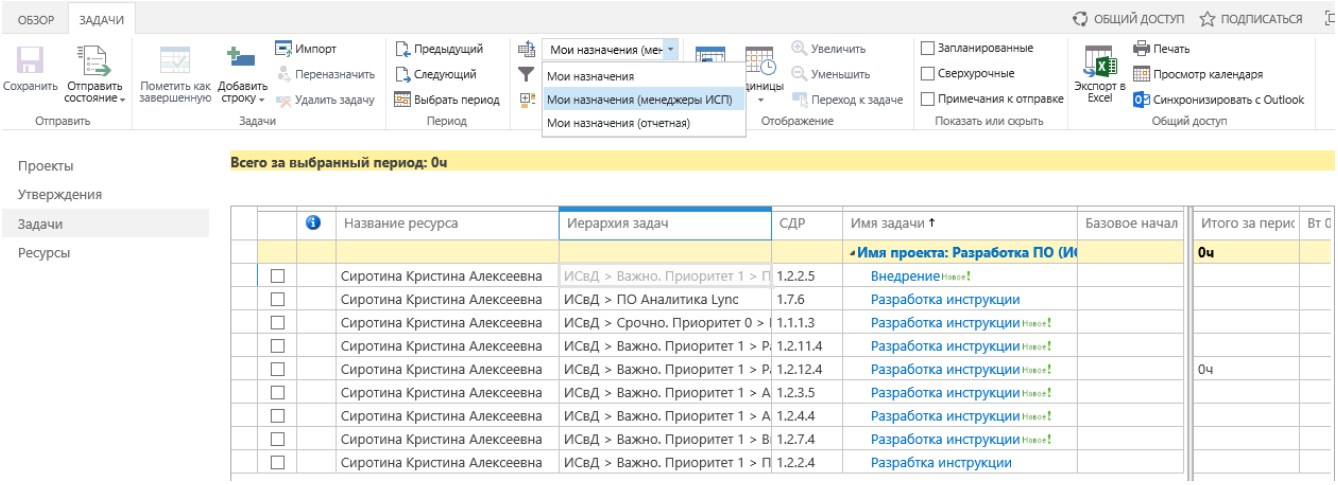

Менеджеры ИСП используют назначение «Мои назначения (менеджеры ИСП)» (рисунок 135).



Поля левой части таблицы:

- Название ресурса – ФИО сотрудника,
- Иерархия задач,
- СДР,
- Имя задачи,
- Базовое начало – запланированная дата начала выполнения задачи (рисунок 136. Здесь см. также следующие поля),
- Фактическое начало – дата начала выполнения задачи по факту,
- Базовое окончание – запланированная дата окончания выполнения задачи,
- Фактическое окончание – дата окончания выполнения задачи по факту,
- Базовые трудозатраты – время выполнения задачи по плану,
- Фактические трудозатраты – время выполнения задачи по факту,
- Оставшиеся трудозатраты – время, которое возможно осталось после выполнения задачи, то есть разница между базовыми и фактическими трудозатратами,
- Фактические затраты – значение «Фактические трудозатраты», умноженное на ставку сотрудника,
- Имя проекта,
- Примечания,
- Состояние процесса.

Проекты
Утверждения
Задачи
Ресурсы

Всего за выбранный период: 0ч

Базовое	Фактическс	Базовое ої	Фактическое ок	Базовые труд	Фактич	Оставшие	Фактические зат	Имя проекта	Примечания	Состояние
			28.02.2014		**9ч**	**120ч**				
	28.02.2014		28.02.2014		1ч	0ч		Разработка ПО (И		Обновлено
					0ч	16ч		Разработка ПО (И		Обновлено
					0ч	8ч		Разработка ПО (И		Обновлено
					0ч	8ч		Разработка ПО (И		Обновлено
					0ч	24ч		Разработка ПО (И		Обновлено
					0ч	16ч		Разработка ПО (И		Обновлено
					0ч	40ч		Разработка ПО (И		Обновлено
					0ч	8ч		Разработка ПО (И		Обновлено
	26.02.2014		28.02.2014		8ч	0ч		Разработка ПО (И		Обновлено

На рисунке 137 представлена правая часть таблицы, в которую заполняются фактические трудозатраты в разрезе недели указанного периода.

Итого за перис	Вт 01.04 - Вс 06.04	Пн 07.04 - Вс 13.04	Пн 14.04 - Вс 20.04	Пн 21.04 - Вс 27.04
0ч				
0ч			0ч	0ч

Период, за который формируется таблица можно изменить на панели функций (рисунок 138).

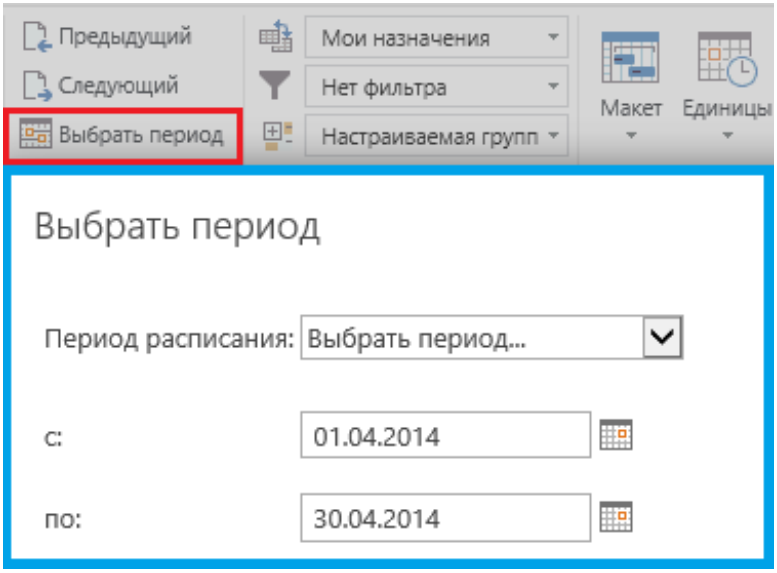

С помощью кнопки «Отправить состояние» → «Все задачи» информация отправляется ответственным сотрудникам (рисунок 139).

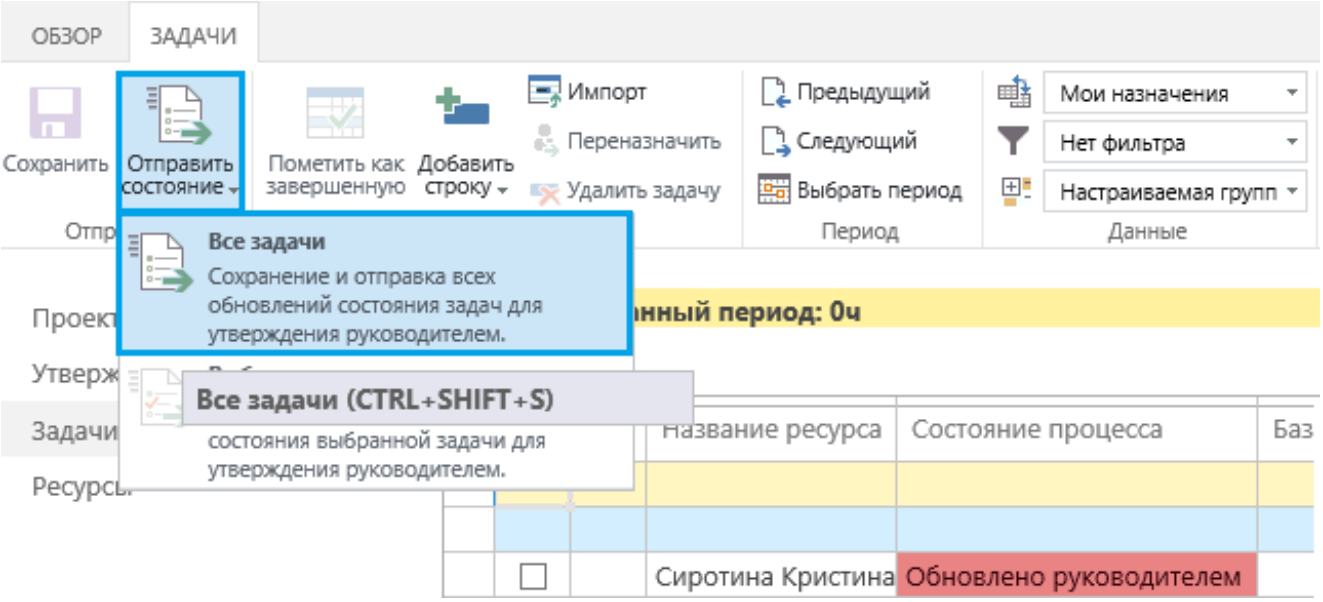

Отчет по трудозатратам

Отчет по трудозатратам, который содержит информацию о фактических трудозатратах менеджеров ИСП по проекту, размещен по следующему адресу: http://mps13/powerpivotcollection/Forms/Gallery.aspx (рисунок 140).

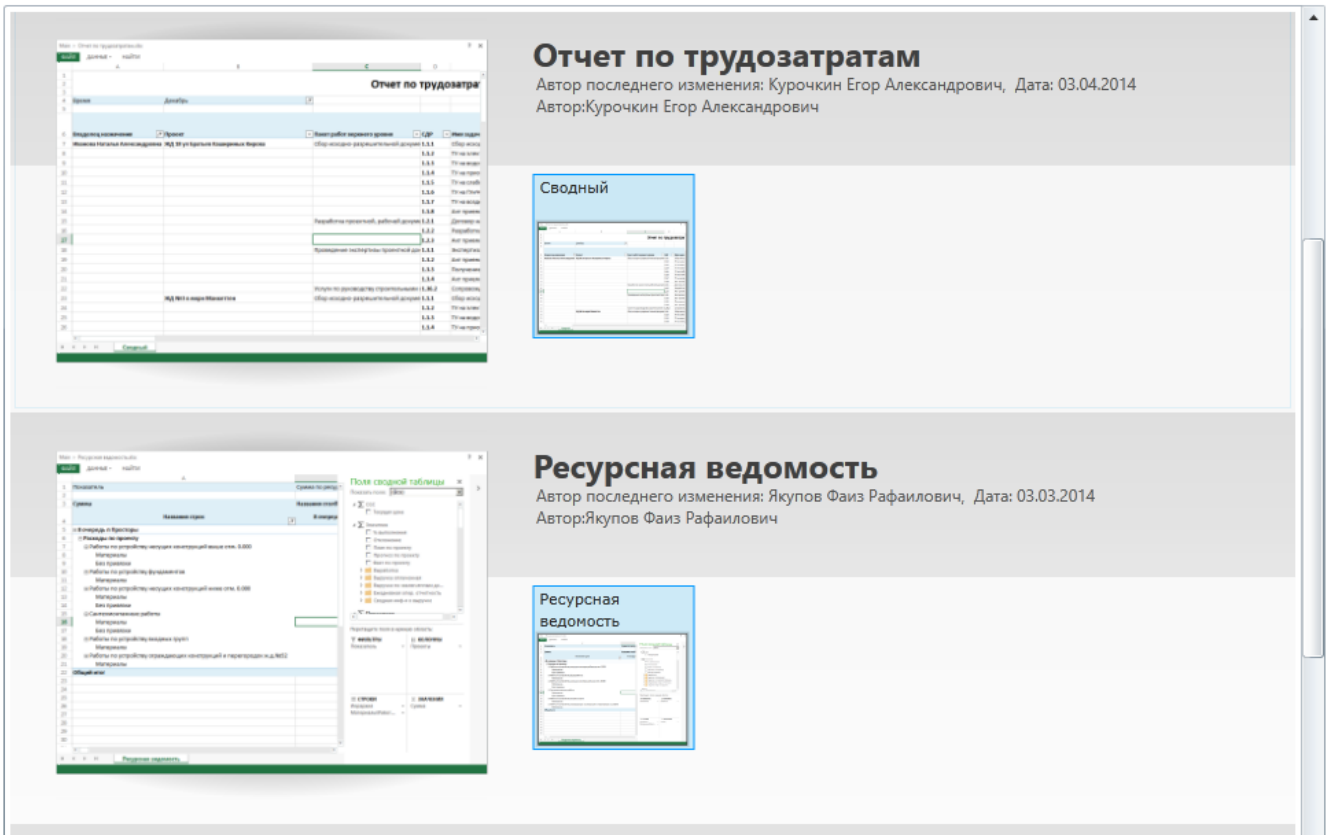

Внешний вид отчета представлен на рисунке 141.

Отчет по трудозатратам по месяцу

Время	Декабрь

Владелец назначения	Проект	Пакет работ верхнего уровня	СДР	Имя задачи	Базовое начало	Базовое окончание	Фактическое начало	Фактическое окончание	Базовые трудозатраты (Итого)	Фактические трудозатраты (Итого)
Иванова Наталь	ЖД 18 ул Братьев Кашири	Сбор исходно-разрешитель	1.1.1	Сбор исходно-разрешительн	2012-04-02	2012-05-02	2012-04-02	2012-04-02	0	0
			1.1.2	ТУ на электроснабжение	2012-05-28	2012-05-29	2012-05-28	2012-05-28	0	0
			1.1.3	ТУ на водоснабжение и водо	2012-05-28	2012-05-29	2012-05-28	2012-05-28	0	0
			1.1.4	ТУ на присоединение к тепл	2012-05-28	2012-05-29	2012-05-28	2012-05-28	0	0
			1.1.5	ТУ на слаботочные сети	2012-05-28	2012-05-29	2012-05-28	2012-05-28	0	0
			1.1.6	ТУ на ГУиЧС	2012-05-28	2012-05-29	2012-05-28	2012-05-28	0	0
			1.1.7	ТУ на воздействие объекта	2012-05-28	2012-05-29	2012-05-28	2012-05-28	0	0
			1.1.8	Акт приема-передачи градо	2012-05-02	2012-05-02	2012-05-02	2012-05-02	0	0
		Разработка проектной, раб	1.2.1	Договор на основные разде	2012-05-16	2012-05-16	2012-05-16	2012-05-16	0	0
			1.2.2	Разработка проектной, рабо	2012-05-29	2012-09-25	2012-05-29	2012-05-29	0	0
			1.2.3	Акт приема-передачи проек	2012-09-25	2012-09-25	2012-09-25	2012-09-25	0	0
		Проведение экспертизы пр	1.3.1	Экспертиза проектной доку	2012-08-15	2012-10-02	2012-08-15	2012-08-15	0	0
			1.3.2	Акт приема-передачи полож	2012-10-02	2012-10-02	2012-10-02	2012-10-02	0	0
			1.3.3	Получение разрешения на с	2012-10-02	2012-10-16	2012-10-02	2012-10-02	0	0
			1.3.4	Акт приема-передачи разре	2012-10-16	2012-10-16	2012-10-16	2012-10-16	0	0
		Услуги по руководству стро	1.36.2	Сопровождение пакетов раб	2012-05-15	2014-09-30	2014-03-01	2014-09-30	74	0
	ЖД №3 в мкрн Манхеттен	Сбор исходно-разрешитель	1.1.1	Сбор исходно-разрешительн	2013-10-07	2013-10-31	2013-10-07	2013-10-31	15	0
			1.1.2	ТУ на электроснабжение	2013-10-31	2013-10-31	2013-10-31	2013-10-31	4	0
			1.1.3	ТУ на водоснабжение и водо	2013-10-31	2013-10-31	2013-10-31	2013-10-31	4	0

Поля таблицы:

- Владелец назначения – ресурс, который назначен на данную задачу. Владелец назначения может быть назначен как на ресурс, так и на задачу (рисунок 142),



- Проект – «Имя проекта» из раздела «Задачи» (рисунок 143),

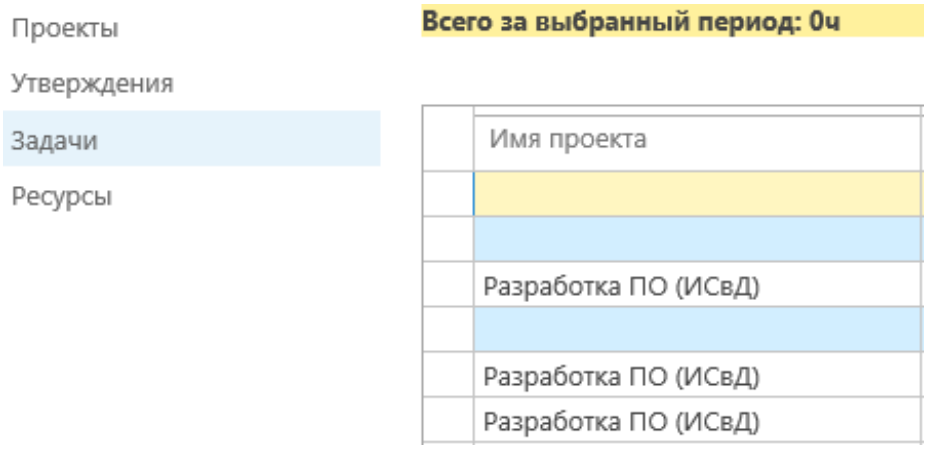

- Пакет работ верхнего уровня – вид задачи, который утвержден согласно СТО http://dokipedia.ru/document/5161996,
- СДР – порядковый номер задачи,
- Имя задачи – «Имя задачи» из раздела «Задачи» (рисунок 144),

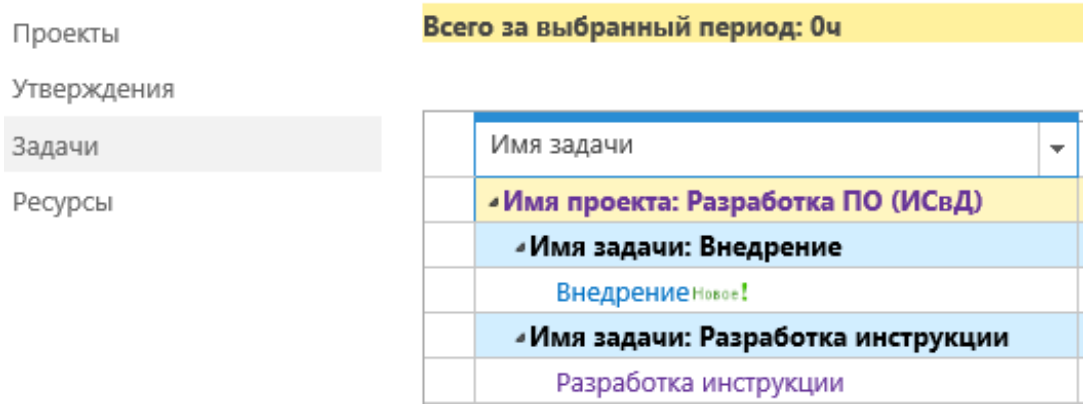

- Базовое начало (рисунок 145),
- Базовое окончание,
- Фактическое начало,
- Фактическое окончание,
- Базовые трудозатраты (Итого) – разность трудовых часов между базовой датой начала и базовой датой окончания,
- Фактические трудозатраты (Итого) – разность трудовых часов между фактической датой начала и фактической датой окончания,
- Фактические трудозатраты – количество часов, потраченных на выполнение задачи за указанный период (фильтр «Время»),
- Фактические затраты, руб – значение «Фактические трудозатраты», умноженное на ставку ресурса.

Имя задачи	Базовое начало	Базовое окончание	Фактическое начало	Фактическое окончание	Базовые трудозатраты (Итого)	Фактические трудозатраты (Итого)	Фактические трудозатраты	Фактические затраты, руб
Сопровождение пакетов работ по строит	**2012-05-15**	2014-09-30	**2014-03-01**	2014-09-30	74	0		
Сбор исходно-разрешительной докумен	**2012-04-02**	2012-05-02	**2012-04-02**	2012-04-02	0	0		
ТУ на электроснабжение	**2012-05-28**	2012-05-29	**2012-05-28**	2012-05-28	0	0		
ТУ на водоснабжение и водоотведение	**2012-05-28**	2012-05-29	**2012-05-28**	2012-05-28	0	0		
Сопровождение пакетов работ по строит	**2012-06-25**	2014-11-30	**2013-09-01**	2014-04-30	133	23	9	4 639,23
Сбор исходно-разрешительной докумен	**2012-03-02**	2012-04-03	**2012-03-02**	2012-03-02	0	0		

В таблице для каждого сотрудника формируются итоги по параметрам «Базовые трудозатраты (Итого)», «Фактические трудозатраты (Итого)», «Фактические трудозатраты», «Фактические затраты, руб» (рисунок 146).

Иванова Наталья Александровна							**3143,005562**	**23**	**9**	**4 639,23**
Нуриахметов Руслан Рамильевич	**Временные здания, соор**	Сдача объекта в экспл	**1.7.1**	Сопровождение	**2014-05-12**	2015-10-02	153	0		
	Дороги и благоустройств	Услуги по руководству	**1.9.1**	Сопровождение	**2013-03-04**	2013-09-04	70	60	2	1 758,16
			1.9.2	Сопровождение	**2013-01-21**	2015-06-10	2266	939	87	76 479,96
			1.9.3	Сопровождение	**2013-12-01**	2014-04-09	40	20	10	8 790,80
Нуриахметов Руслан Рамильевич							**2529**	**1019**	**99**	**87 028,92**

Сверху от основной таблицы находится фильтр «Время», по которому можно изменить период формирования отчета (рисунок 147).

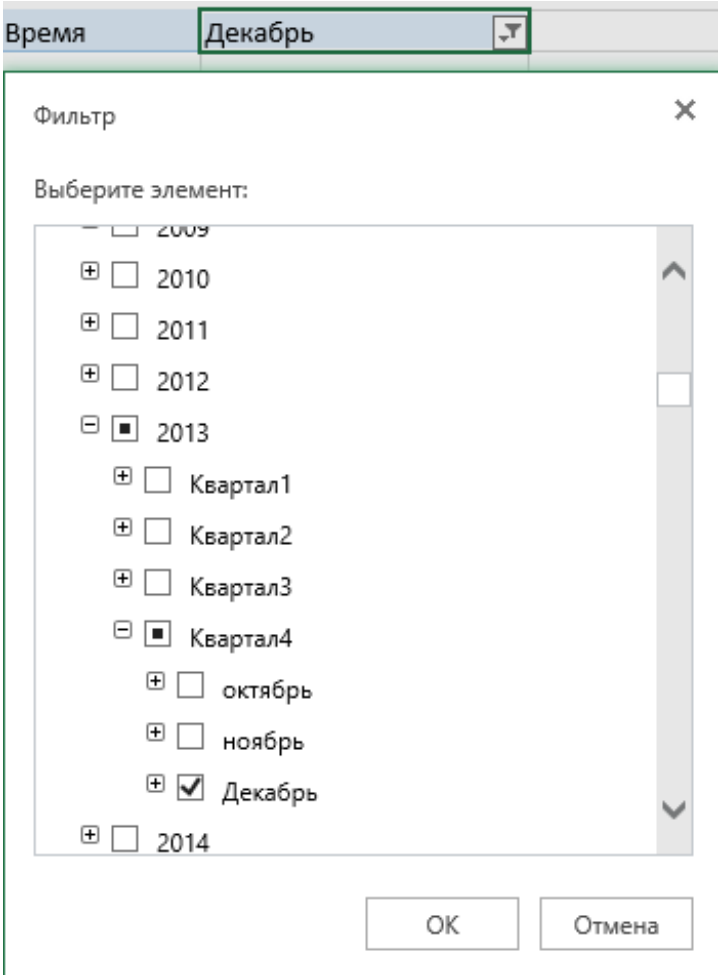
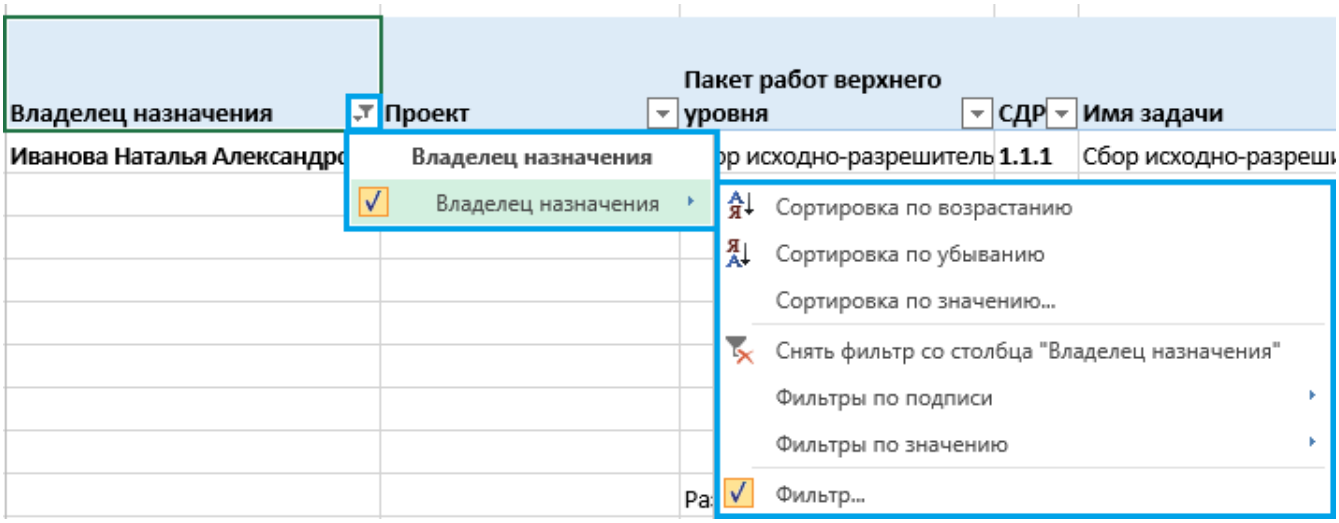
Еще один фильтр – «Владелец назначения», по которому можно выполнить отбор по владельцу/владельцам назначения (рисунок 148).
